



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL  
DE COLCAPIRHUA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA  
CONTRA LA CORRUPCIÓN

# RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL GESTIÓN 2017



## **RENDICION DE CUENTAS**

La administración pública tiene como principios básicos y elementales la legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, TRANSPARENCIA, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Dicha administración de acuerdo al Art. 241 de la Constitución Política del Estado, debe ser supervisada por el soberano que es el pueblo, a través de la sociedad civil organizada.

Para ello fueron creados eventos grandes donde participan los sectores sociales, recibiendo el informe de manera directa de sus autoridades como el Alcalde.

La audiencia pública de Rendición de Cuentas, es un acto de mucha trascendencia, dado que el Alcalde, informan a su pueblo, al soberano, sobre la forma en la que administraron los recursos económicos del municipio, en que obras y servicios invirtieron, el costo total que tienen todos y cada uno de ellos y principalmente cuantos fueron ejecutados, cuales se encuentra por ejecutar, debe realizarse dos veces al año, la primera denominada Parcial (Primer semestre) y la segundo Final (Toda la gestión).

En los hechos la Rendición Pública de Cuentas, es un examen para las autoridades, es un deber que tiene que cumplir para ser evaluados por el soberano.

Mgr. Juan Chávez Rojas  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA y  
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

## INDICE

<b>INFORME DEL EJECUTIVO MUNICIPAL</b> .....	1
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION .....	8
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA .....	10
<b>I.- SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL</b> .....	13
I.1.- DIRECCION DE ASESORIA LEGAL .....	13
I.2.- DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO .....	17
I.2.1. UNIDAD DE DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.....	17
I.2.2. UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES INTEGRALES PARA LA MUJER.....	21
I.2.3. UNIDAD DE ATENCION AL ADULTO MAYOR .....	23
I.2.4. UNIDAD DE DISCAPACIDAD.....	25
I.2.5. UNIDAD DE CULTURA Y TURISMO .....	29
I.2.6. ENCARGADA DE PROGRAMAS EN EDUCACION .....	30
I.2.7. ENCARGADO DE EDUCACION .....	33
I.3.- ENCARGADO DE CONTRATACIONES .....	37
<b>II.- SECRETARÍA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> .....	46
II.1.- DIRECCION DE FINANZAS .....	47
II.1.1 JEFE DE INGRESOS .....	76
II.1.1.1 INTENDENTE MUNICIPAL. ....	80
II.1.2 JEFE DE CONTABILIDAD .....	83
II.1.2.1 ACTIVOS FIJOS .....	83
II.1.2.2 ENCARGADO DE RUAT a.i. ....	85
II.2 JEFA MUNICIPAL DE SALUD .....	91
<b>III.- SECRETARÍA MUNICIPAL TECNICA</b> .....	100
III.1.- DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS .....	100
III.1.1 SANEAMIENTO BÁSICO .....	191
III.2.- DIRECCION DE URBANISMO Y CATASTRO .....	201
III.3.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE .....	210
III.3.1 JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE.....	216
III.3.2 JEFATURA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS G.I.R.S .....	221

# **INFORME DEL EJECUTIVO MUNICIPAL**


## **ANTECEDENTES.-**

Luego de haber transcurrido dos años en la Administración Municipal, y convencidos de que estamos forjando correctamente el futuro de Colcapirhua, todo ello nos permite planificar nuestro municipio con un enfoque en **Desarrollo Humano**, lo que significa atender las principales necesidades de la población de Colcapirhua con la finalidad de incrementar la calidad de vida de los habitantes, implementando políticas públicas municipales para Vivir Bien.

Bajo estas premisas la administración municipal de Colcapirhua presenta el correspondiente a la rendición de cuentas parcial 2017 con corte al 31 de Mayo de 2017.

## **OBJETIVOS.-**

El principal objetivo de la rendición de cuentas parcial 2017, es sin duda brindar a la población de Colcapirhua, la información técnica, financiera, legal y administrativa de todos los actos desarrollados por cada una de las Unidades, y Direcciones que conforman el Ejecutivo Municipal durante el periodo antes mencionado.



### **RENDICIÓN DE CUENTAS PARCIAL 2017.-**

El presente informe de rendición de cuentas parcial 2017, está estructurado en cuatro acápite: TÉCNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO y LEGAL.

En lo Técnico informar que el G.A.M. de Colcapirhua esta conformado por el Secretario Municipal Técnico, La Dirección de Planificación, la Dirección de Obras Públicas, La Jefatura de Saneamiento Básico, la Unidad de Residuos Sólidos, la Dirección de Desarrollo Productivo, Medio Ambiente, Parques y Jardines y la Dirección de Urbanismo juntamente con la Jefatura de Catastro.

En el tema Financiero y Administrativo informar que el GAM de Colcapirhua esta conformado por el Secretario Municipal Administrativo y Financiero, la Dirección de Finanzas, Ingresos, Fiscalización, además de la Administración de toda la Red municipal de Salud de Colcapirhua .



## INGRESOS ENERO 2017 A MAYO 2017

DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD



## **EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS**

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2017

(Expresado en Bolivianos)

FF - OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	PERCIBIDO	SALDO POR PERSIBIR	% AVANCE
20-210	Recursos Especificos / Recursos Especificos de las Municipalidades	22,000,000.00	7,661,973.35	14,338,026.65	34.83
41-111	Transferencias T.G.N. / Tesoro General de la Nación (Proyectos Upre)	22,336,955.05	5,438,289.52	16,898,665.53	24.35
41-111	Transferencias T.G.N. / Tesoro General de la Nación (Proyectos FPS)	0.00		0.00	0.00
41-113	Transferencias T.G.N. / Tesoro General de la Nación - Participación Popular	40,294,898.00	12,946,326.16	27,348,571.84	32.13
41-119	Transferencias T.G.N. / Tesoro General de la Nación - Impuesto Directo a los Hidrocarburos	8,237,425.00	1,992,921.09	6,244,503.91	24.19
41-120	Transferencias T.G.N. / T.G.N. - Impuesto a la Participación en Juegos	0.00		0.00	0.00
42-220	Transferencias de Recursos Especificos / Regalias (Gobierno Autonomo Departamental)	0.00		0.00	0.00
42-230	Transferencias de Recursos Especificos / Otros Recursos Especificos	150,000.00		150,000.00	0.00
43-314	Transferencias de Crédito Externo / Corporación Andina de Fomento	0.00		0.00	0.00
92-230	Préstamos de Recursos Especificos / Otros Recursos Especificos (FNDR)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTALES</b>		<b>93,019,278.05</b>	<b>28,039,510.12</b>	<b>64,979,767.93</b>	<b>30.14</b>
Saldo Caja Bancos para la gestion 2017		14,000,000	14,000,000		
<b>TOTALES</b>		<b>107,019,278</b>	<b>42,039,510</b>	<b>64,979,768</b>	<b>39.28</b>

## EJECUCIÓN FINANCIERA ENERO 2017 A MAYO 2017

DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD




## **EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR MES**

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2017

(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DIFERENCIA	EJECUTADO	% AVANCE FINANCIERO MESUAL
ENERO	93,354,548.00	107,019,278.05	13,664,730.05	352,914.66	0.33
FEBRERO	93,354,548.00	107,019,278.05	13,664,730.05	3,312,983.08	3.10
MARZO	93,354,548.00	107,019,278.05	13,664,730.05	5,652,486.40	5.28
ABRIL	93,354,548.00	107,019,278.05	13,664,730.05	7,102,338.67	6.64
MAYO	93,354,548.00	107,019,278.05	13,664,730.05	7,070,806.77	6.61
<b>TOTALES</b>	<b>93,354,548.00</b>	<b>107,019,278.05</b>	<b>13,664,730.05</b>	<b>23,491,529.58</b>	<b>21.95</b>
	93,354,548.00	107,019,278.05	13,664,730.05	23,491,529.58	21.95

### EJECUCION FINANCIERA POR DISTRITOS

DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD					
 <b>G</b> OBIERNO <b>A</b> UTÓNOMO <b>M</b> UNICIPAL <b>C</b> OLCAPIRHUA	<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS RESUMEN</b>				
	Del 01 de Enero al 31 Mayo 2017				
	(Expresado en Bolivianos)				
DESCRIPCION	DIST.	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO	AVANCE FINANCIERO
DISTRITO	A	2,502,000.00	255,437.15	2,246,562.85	10.21
DISTRITO	B	3,210,000.00	622,307.90	2,587,692.10	19.39
DISTRITO	C	1,843,000.00	372,367.19	1,470,632.81	20.20
DISTRITO	D	1,560,000.00	164,293.00	1,395,707.00	10.53
DISTRITO	E	2,570,500.00	256,487.91	2,314,012.09	9.98
INSTUCIONAL	II	95,333,778.05	21,820,636.43	73,513,141.62	22.89
	<b>TOTAL</b>	<b>107,019,278.05</b>	<b>23,491,529.58</b>	<b>83,527,748.47</b>	<b>21.95</b>
	OK	107,019,278.05	23,491,529.58	83,527,748.47	21.95

### EJECUCION FINANCIERA EFECTIVA

DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD			
 <b>G</b> OBIERNO <b>A</b> UTÓNOMO <b>M</b> UNICIPAL <b>C</b> OLCAPIRHUA	<b>% REAL DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS VS GASTOS</b>		
	Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2017		
	(Expresado en Bolivianos)		
DESCRIPCION	RECURSO PERCIBIDO	PAGOS REALIZADOS	% AVANCE REAL
<b>SUB T O T A L E S RECAUDACION REALIZADA</b>	28,039,510.12	23,491,529.58	55.88
Saldo Caja Bancos para la gestion 2017	14,000,000		
<b>T O T A L E S</b>	<b>42,039,510</b>	<b>23,491,530</b>	<b>55.88</b>



## **OBJETIVOS ALCANZADOS**

Entre los programas y proyectos más importantes que se ha logrado alcanzar en el periodo municipal del 1 de Enero al 31 de Abril 2017, se pueden enunciar a los siguientes:

### *PROGRAMAS SOCIALES*

1. Apertura y Funcionamiento de la Unidad Educativa 15 de Abril
2. Apertura y Funcionamiento del Servicio de Hemodialis

### *PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL*

1. Canalización Pampamayu
2. Inicio Pavimento Rígido Av. Dorbigni.
3. Const. Sist. De riego Distrito A
4. Pavimento calle Buenos Aires
5. Canalización Rummy
6. Acondicionamiento hidráulico Río Chijllawiri.

### *EQUIPOS ADQUIRIDOS*

1. Instalación y Funcionamiento Taller de Costura Municipal
2. Radio Comunicación Handies
6. Compra de Equipos de Soldadura para el Taller Municipal de Metal Mecánica

### *PROYECTOS GESTIONADOS EN COORD. CON LAS OTBs E INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES*

1. Const. Instituto Tecnológico María Cristina
2. Const. Tanques de Agua Potable proyecto Misicuni
3. Const. Mejoramiento calles laterales Av. Blanco Galindo
4. Proyectos Fondo Indígena.

## **TAREAS PENDIENTES**

5. Construcción Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas
6. Indexación de la tasa de aseo urbano.
7. Gestión para la Implementación del Campus de Universitario
8. Piscina Municipal.
9. Teatro Municipal.
10. Parque Urbano.
11. Flota de Equipamiento Pesado.
12. Conclusión Coliseo Municipal

## **CONCLUSIONES.-**

Del análisis técnico, administrativo, financiero y legal se deduce que durante el primer periodo de la gestión 2017 se ha alcanzado una ejecución financiera efectiva del 22% y una Ejecución Física de 37%, lo que refleja el cumplimiento parcial de las metas en el POA 2017.

Por todo lo descrito agradecemos a todo el personal del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua por haber coadyuvado en el cumplimiento parcial de los programas, proyectos y actividades de la gestión 2017 y así mismo agradecer la participación activa de todas las organizaciones sociales para hacer realidad los objetivos trazados en el Programa Operativo Anual 2017.

## **RECOMENDACIONES.-**

Del análisis de resultados obtenidos con corte al 31 de Mayo de 2017, se puede apreciar que se han logrado importantes avances en el tema de Educación, Salud, Deportes, Saneamiento Básico, infraestructura urbana y rural.

Se recomienda a las Secretarías, a las Direcciones, y a las Jefaturas, realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar, la conclusión de todos los proyectos aun no concluidos durante el 2017.

Así mismo garantizar la ejecución de las obras programadas para la gestión 2017 y así lograr atender todas las necesidades de las OTBs y de los Sectores Sociales con oportunidad y a entera satisfacción. Para este fin pido a las Organizaciones Sociales ayudarme en el control social para que la ejecución de las obras se realicen en los tiempos programados y con la calidad que espera toda la población en su conjunto.

# UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

**Mgr. Juan Chávez Rojas**  
**JEFE DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION**

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, diseñó lineamientos y acciones que coadyuvan y promueven la transparencia de la gestión municipal y disminuyen los riesgos de Corrupción, que pudiesen afectar el logro de los objetivos Institucionales y alcanzar la visión del municipio que queremos, bajo la estructura de los siguientes ejes:

## **1.- EJE: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA**

Taller “**JUGANDO APRENDEMOS A CONSTRUIR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**” en la que participaron integrantes de la Red de Jóvenes por la Transparencia, en este taller se Implementó los juegos virtuales sobre la transparencia y lucha contra la corrupción

## **2.- EJE: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION PÚBLICA Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION.**

- Durante el Primer semestre de la gestión 2017, la Unidad de Transparencia, atendió solicitudes de información, mismas que fueron atendidas a satisfacción del público en general.
- Se realizó la Rendición Publica de Cuentas Final Gestión 2016 con la participación de 280 asistentes tanto Presidentes y Mesas Directivas de distintas OTBs, Juntas Vecinales, Autoridades ediles, concejales Municipales y público en general, que son parte del Municipio de Colcapirhua.

## **3.- EJE: MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO Y COORDINACION INSTITUCIONAL**

- Relacionamiento con los representantes de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción y el delito.
- Coordinación institucional directa con el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
- Coordinación institucional con los representantes Departamentales dependientes del Vice-ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en el seguimiento y monitoreo de las

diferentes denuncias dentro de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua.

#### **4.- MEDIDAS PARA ELIMINAR LA CORRUPCIÓN**

- Difusión de publicidad, concientizando a la población en general en la lucha contra la corrupción y alcanzar la visión de un municipio transparente libre de corrupción.

#### **SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS DENUNCIAS**

La Unidad de Transparencia desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del 2017 cuenta con 11 denuncias, contra servidores y ex servidores municipales, mismos que fueron tramitadas conforme al procedimiento establecido el Reglamento de la Unidad de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, en muchos casos con resguardo de la identidad de los denunciantes, conforme previene el Art. 17-III de la Ley de Lucha Contra la Corrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz” N° 004, que obliga a esta Unidad, guardar en reserva la identidad de las personas particulares y servidoras o servidores públicos que denunciaron hechos de corrupción y asimismo impide también a esta Unidad divulgar la documentación presentada, recolectada y generada durante el seguimiento y monitoreo de las denuncias.

Debe hacerse hincapié que la cantidad de denuncias recibidas durante el primer semestre de la gestión 2017, fue mucho menor que en otras gestiones municipales, lo que significa que el esfuerzo realizado por Máxima Autoridad Ejecutiva, junto a la Unidad de Transparencia y lucha contra la Corrupción está dando resultados satisfactorios para la población en general pues a través de ello se obtendrá más obras, más servicios, lo que representa desarrollo del municipio.

#### **DENUNCIAS PRESENTADAS PRIMER SEMESTRE GESTION 2017**

<b>ESTADO DE DENUNCIAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017</b>	
<b>CERRADOS</b>	<b>2</b>
<b>RECHAZADOS</b>	<b>2</b>
<b>CASOS EN MOVIMIENTO</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

# UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

**Lic. Orlando Cruz**  
**DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA**

## **EJECUCION DE LAS AUDITORIAS**

El Programa Operativo Anual (POA) 2017 de la Dirección de Auditoría Interna, fue enviado al Alcalde Municipal el mismo fue aprobado por la autoridad Edil y remitido posteriormente a la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado y aprobado por esta instancia gubernamental.

El detalle de todas las auditorias ejecutadas correspondientes al primer semestre de la gestión 2017 de la DAI se encuentran expuestos en el Anexo 1 del presente informe.

## ANEXO 1

### EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

N°	ACTIVIDAD	DÍAS HOMBRE	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA CONTRALORÍA	
						NOTA	FECHA
1	Opinión del Auditor Interno e Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2016	170	Concluido	DAI-002/2017 y DAI-003/2017	24/02/2017	DAI/N° 124/2017 y 125/2017	01/03/2017
2	Auditoría Operacional sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2016	127	Concluido	DAI-004/2017	24/02/2017	DAI/N° 126/2017	01/03/2017
3	Primer Seguimiento al Informe DAI-003/2016 referido a la Auditoría de control Interno Emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2015	51	Concluido	DAI-005/2017	24/02/2017	DAI/N° 127/2017	01/03/2017
4	Primer Seguimiento al Informe DAI-004/2016 referido a la Auditoría Operacional sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2015	54	Concluido	DAI-006/2017	24/02/2017	DAI/N° 128/2017	01/03/2017
5	Auditoría Especial sobre el registro, uso y control del Sistema del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT NET), por la gestión 2016.	40	En Proceso				
6	Primer seguimiento a la Auditoría Especial del Sistema RUANET del RUAT Gestión 2015.	20	En Proceso				

## INDICADORES DE RENDIMIENTO POA DE LA GESTIÓN 2017

AUDITORIAS	LOGRO				TIEMPO				COSTO			
	POA	REAL	DIF	OBJETIVO CUMPLIDO	POA	REAL	%	CLASIF.	POA	REAL	%	CLASIF.
Opinión del Auditor e Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2016	1	1	0	Opinión e Informe Control Interno sobre EE. FF.	0,0064	0,0059	109	Cumplido	0,000027	0,000025	109	Cumplido
Auditoría Operacional sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2016	1	1	0	Informe Efic. y Eficacia cumplimiento Leyes	0,0064	0,0064	100	Cumplido	0,000027	0,000027	100	Cumplido
Primer Seguimiento al Informe DAI-003/2016 referido a la Auditoría de control Interno Emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2015	1	1	0	Informe con Recomendaciones No Cumplidas	0,02	0,196	102	Cumplido	0,000083	0,000082	102	Cumplido
Primer Seguimiento al Informe DAI-004/2016 referido a la Auditoría Operacional sobre la Utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) Gestión 2015	1	1	0	Informe con Recomendaciones No Cumplidas	0,02	0,018	108	Cumplido	0,000083	0,000088	108	Cumplido
Auditoría Especial sobre el registro, uso y control del Sistema del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT NET), por la gestión 2016.	1	0	1	En Proceso	0,0125			En Proceso	0,000055			En Proceso
Primer seguimiento a la Auditoría Especial del Sistema RUANET del RUAT Gestión 2015.	1	0	1	En Proceso	0,0125			En Proceso	0,000055			En Proceso

# I.- SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL

Lic. Darío Saavedra Núñez  
SECRETARIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL

## UNIDADES DEPENDIENTES

### I.1. DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL

1.1. Jefa de asuntos Jurisdiccionales

### I.2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO

1.2. Encargado de Cultura y Turismo

1.3. Encargado de Educación

1.4. Encargado de Deportes

1.5. Responsable de Unidad de Defensoría y Asistencia Social

### I.3 RESPONSABLE DE CONTRATACIONES

## I.1.- DIRECCION DE ASESORIA LEGAL

Abg. Leonardo Flores Mogro  
DIRECTOR DE ASESORIA LEGAL

### I. NORMAS MUNICIPALES:

El Órgano Ejecutivo Municipal, en cumplimiento a las atribuciones establecidas en la Ley N°482, ha emitido las siguientes disposiciones municipales:

### DECRETOS MUNICIPALES

No.	FECHA	SINOPSIS
D.M. 002/2017	18/03/2017	SE APRUEBA LA MODIFICACION A LA PLANILLA SALARIAL 2017 Y LA ESTRUCTURA ORGANICA (ORGANIGRAMA)
D.M 003/2017	11/04/2017	APRUEBA EL REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y CARGA EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA.
D.M 004/2017	26/05/2017	APROBAR LA NUEVA ESCALA SALARIAL – GESTIÓN 2017



## DECRETOS EDILES

No.	FECHA	SINOPSIS
D.E. 001/2017	03/01/2017	DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD SUMARIANTE
D.E. 002/2017	03/01/2017	DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL
D.E. 003/2017	10/04/2017	APROBAR EL: "REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA (RE-SCI) DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA"
D.E. 004/2017	10/04/2017	ABROBAR EL: "REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (RE-SOA) DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA"
D.E. 005/2017	22/05/2016	ABROBAR EL "REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS (RE-SP) DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA",

## RESOLUCIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS

No.	FECHA	SINOPSIS
R.M. A. 001/2017	21/03/2017	RESUELVE AUTORIZAR EL ALQUILER DE VEHICULOS (SE DETALLAN EN LA RESOLUCIÓN)
R.M. A. 002-A/2017	10/04/2017	SE APRUEBA EL INFORME DEL ENCARGADO DE RUAT (EL ANEXO FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN)
R.M. A. 002/2017	04/05/2017	RESOLVER EL CONTRATO ADMINISTRATIVO N° LP/08/2015, "CONS. PAV. CALLE WARA WARA OTB LIBERTADOR BOLIVAR DIST. C

### II.- CONVENIOS SUSCRITOS POR EL G.A.M. COLCAPIRHUA:

CANTIDAD
8

### III.- PROCESOS SUMARIOS:

GESTION	CANTIDAD
2017	1

### IV.- MINUTAS DE CESION Y EXPROPIACIONES:

MINUTAS DE:	CANTIDAD
CESION (Vias y/o Áreas Verdes)	31

### V.- INFORMES LEGALES:

GESTION	CANTIDAD
2017	55

### VI.- PROCESOS JUDICIALES:

MATERIA	CANTIDAD
PENAL	55
COACTIVOS	32
CIVILES, LABORALES y COACTIVOS SOCIALES	8

## VII.- PREDIOS MUNICIPALES:

DETALLE	CANTIDAD
TOTAL, DE AREAS REGISTRADAS	172
TOTAL, DE AREAS EN TRAMITE DE REGISTRO	6
<b>TOTAL, DE AREAS VERDE Y/O EQUIPAMIENTO</b>	<b>178</b>

## MONTOS RECUPERADOS EN LOS PRIMEROS MESES DE LA GESTION 2017

RESUMEN	FECHA	MONTO RECUPERADO
Que mediante nota de fecha 23 de diciembre de 2016 CGE/GDC-2364/G0275/2016, el Dr. Mario David Barriga Montaña Gerente Departamental de Cochabamba, recomienda al Sr. alcalde del G. A. M. de Colcapirhua proceda a la recuperación del importe de las remuneraciones percibidas indebidamente, por el Ecógrafo del hospital Andrés Cuschieri, por la suma de <b>Bs. 32.095.33.-</b> importe observado por vías alternas a la vía coactiva fiscal.	17/04/2017	<b>Bs. 32.095.33.-</b> (TREINTA DOS MIL NOVENTA Y CINCO 33/100 BOLIVIANOS)
La ejecución de boletas de garantía de seriedad de propuesta, por incumplimiento del proponente, referente a la contratación "COMPRA DE CEMENTO IP-30 PARA CONST. AV. DORBIGNI DIST. B.C.D.	7/04/2017	<b>Bs. 7.981.71.-</b> (SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO 71/100 BOLIVIANOS)
La ejecución de boletas de garantía de seriedad de propuesta, por incumplimiento del proponente, referente a la contratación "COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES CACAMO DE BOMBEO SUMPAPAYA FCOLCAPRIHUA A.M. ANPE 006/2017	27/03/2017	<b>Bs. 2.501.00.-</b> (DOS MIL QUINIENTOS UNO 00/100 BOLIVIANOS)
Proceso coactivo iniciado contra SAMUEL VILLARROEL BAYA y EMILIO JHONNY PEÑARANDA CABERO, por la suma de <b>\$us. 28.624.88.-</b> , se tuvo una retención judicial en el Banco Unión correspondiente al coactivo de <b>Emilio Peñaranda Cabero</b> . Nota de cargo Nro. 33/93	04/05/2017	<b>Bs. 3.330.-</b> (TRES MIL TRESCIENTOS TRENTA 00/100 BOLIVIANOS)
Proceso Coactivo iniciado contra Abraham Spencer López la Fuente y otros, por los ingresos y gastos de la Mancomunidad Colcapirhua y Tiquipaya (MACOTI) se emitió sentencia favorable al GAM de Colcapirhua, y se tiene una restitución de Bs. 2843.-	06/2017	<b>Bs. 2.843.-</b> (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS)
Proceso Coactivo iniciado contra Arturo Molina Morales, por falta de rendición de cuentas y descargos en caja, se tiene una restitución de Bs. 5093.-	06/2017	<b>Bs. 5.093.-</b> (CINCO MIL NOVENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS)
Procesos coactivos signados con las Notas de Cargo Nro. 18,19,20,21, procesos en los cuales los coactivados cancelaron a la Contraloría G.E. la suma de Bs. 223.294.- monto del cual se solicitó la restitución a la cuenta de recursos propios del GAM de Colcapirhua.	06/2017	<b>Bs. 223.294.-</b> (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO)
Proceso coactivo signado con la Nota de Cargo 06/2015, referida a la auditoria especial sobre la legalidad y pertinencia del pago de bono de antigüedad comprendido en las entre enero de 2002 a agosto de 2008, desahucio e indemnización de la gestión 2007, del presente proceso se tiene varias retenciones a las entidades bancarias a las cuentas de los coactiva dos equivalentes a Bs. 34.868.07	06/2017	<b>Bs.- 34.868.07</b> (TREINTA CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 07/100 BOLIVIANOS)
Pago defectuoso a consultores en la Unidad de Zoonosis	03/01/2017	<b>Bs. 18.000.-</b> (DIECIOCHO MIL 00/100 BOLIVIANOS)
Restitución de depósito, tramitado ante la Jefatura Departamental del Trabajo a favor del G.A.M. Colcapirhua, a mérito del finiquito efectuado a la Sra. Olinka Roció Muriel Ortega.	24/04/2017	<b>Bs. 39.407,19</b> (TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE 19/100 BS.

Asimismo, es importante informar que, dentro de las **CUENTAS POR COBRAR A CORTO Y LARGO PLAZO**, se procedido con las notificaciones personales a las personas que tienen cuentas pendientes con el municipio y en varios casos, mediante notas dirigidas a la MAE, han solicitados planes de pago con el fin de cancelar estas deudas, caso contrario serán registrados en el **SISTEMA CONTROLLEG** de la Contraloría General del Estado.

### **RESULTADOS**

Por otra, parte dentro de los procesos penales que sigue el G.A.M. de Colcapirhua es importante resaltar que el GAM de Colcapirhua tiene un proceso ganada signado con el caso Nro. 30; **SENTENCIA CONDENATORIA** con 3 años de presidio por los delitos de Falsedad Material, Falsedad ideología y Uso de Instrumento Falsificado.

## I.2.- DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO

Lic. Rodrigo Rosales Rocha  
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO

### I.2.1. UNIDAD DE DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Abg. Palmira A. Cabrera Ureña  
RESPONSABLE DE LA DEFENSORIA

En relación a la Defensoría inicia sus actividades de los meses de enero con proyección al 30 de junio 2017 cumpliendo con todas sus atribuciones que establece el Nuevo Código N.N.A. Ley 548 en el Art. 188 con todos sus incisos correspondientes.

- Recepción de denuncias
- Conciliaciones.
- Suscripción de actas.
- Apoyo e intervención social. Psicológico y legal.
- Asesoramiento legal
- Seguimiento de casos Juzgado Fiscalía
- Acogidas circunstanciales
- Extinción de autoridad Materna y Paterna
- Homologación de acuerdos transaccionales
- Denuncias a la fiscalía.

#### ADMISIÓN DE CASOS SEGÚN SU TIPOLOGIA DEL MES DE ENERO 2017 AL 30 de JUNIO 2017

	Enero 2017	Febrero 2017	Marzo 2017	Abril 2017	Mayo 2017	Junio 2017	TOTAL
ASISTENCIA FAMILIAR	30	26	30	19	26	28	159
VIOLENCIA FISICA Y PSICOLOGICA	0	0	0	4	3	2	9
VIOLENCIA FÍSICA	2	1	7	5	1	3	19
VIOLENCIA PSICOLOGICA	4	1	10	4	2	2	23
CONFLICTO DE GUARDA	9	6	4	5	1	2	27
ABANDONO DE NIÑO ,NIÑA ADOLECENTE	6	3	3	1	10	4	27
PROBLEMAS DE CONDUCTA	2	7	9	7	13	10	48
IRRESPONSABILIDAD PATERNA	3	5	3	0	4	4	19
IRRESPONSABILIDAD MATERNA	5	9	7	5	7	5	38

EXTRAIVIO	0	2	1	0	0	1	4
IRRESPONSABILIDAD PATERNA Y MATERNA	0	0	0	1	4	5	10
RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN ( HIJO)	0	0	1	3	0	1	5
ABANDONO DE HOGAR	1	0	1	1	2	3	8
FUGA DE ADOLESCENTES Y NIÑOS	4	0	0	1	1	1	7
ABUSO SEXUAL	2	0	0	0	0	0	2
APOYO INTEGRAL	2	9	10	2	4	7	34
LESIONES GRAVES Y LEVES	0	0	0	1	1	0	2
ROBO	0	0	0	0	1	0	1
HURTO	0	0	0	0	1	0	1
VIOLACION	0	0	1	1	2	0	4
VIOLENCIA FAMILIAR Y DOMESTICA	0	1	1	2	0	0	4
EXPLOTACION LABORAL	0	0	1	0	0	0	1
DERECHO ALA EDUCACION	0	1	0	0	0	0	1
<b>TOTAL DE CASOS ATENTIDOS EN LA DNA</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>89</b>	<b>59</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>453</b>
AUTORIZACIONES DE VIAJE Y DE TRABAJO	53	16	9	13	36	15	142
<b>TOTAL</b>	<b>131</b>	<b>88</b>	<b>98</b>	<b>72</b>	<b>117</b>	<b>95</b>	<b>695</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>695</b>

**PROCESOS PENALES DENUNCIADOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE COLCAPIRHUA DEL MES DE ENERO CON PROYECCION AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

DELITO		ESTADO DEL PROCESO	DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017
1.-	VIOLENCIA FAMILIAR Y DOMESTICA 272 (Bis) del C.P. Ley 348	SE ENCUENTRA EN INVESTIGACION	4
2.-	VIOLACION 308 (Bis) C.P.	SE ENCUENTRA EN INVESTIGACION	4
5.-	LESIONES GRAVES Y LEVES 271 C.P.	SE ENCUENTRA EN INVESTIGACION	2
6.-	ABUSO SEXUAL 312 C.P.	SE ENCUENTRA EN INVESTIGACION	2
7.-	HURTO 326 C.P.	SE ENCUENTRA EN INVESTIGACION	1
9.-	ROBO 331 C.P.	SE ENCUENTRA EN INVESTIGACION	1
<b>TOTAL</b>			<b>14</b>

**PROCESOS DE HOMOLOGACION DE ASISTENCIAS FAMILIARES PRESENTADOS ANTE EL JUZGADO DE FAMILIA DEL MES DE ENERO AL 30 JUNIO 2017 Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.**

PROCESO		ESTADO DEL PROCESO	DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017
1	PROCESOS DE HOMOLOGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR	SE ENCUENTRA EN PROCESO	10
		<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

**INFORMES PSICOLOGICOS REALIZADOS DEL MES ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017.**

INFORMES REALIZADOS PARA EL JUZGADO	INFORMES Y DECLARACIONES PARA FISCALIA	TERAPIAS PSICOLOGICAS	INFORMES PARA DNA	TOTAL
15	40	158	75	<b>288</b>

**INFORMES SOCIALES REALIZADOS DEL MES ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017.**

INFORMES REALIZADOS PARA EL JUZGADO	INFORMES PARA FISCALIA	SEGUIMIENTOS SOCIALES	INFORMES PARA DNA	TOTAL
22	12	207	55	<b>296</b>

**OPERATIVOS ORGANIZADOS POR LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MES ENERO AL 30 JUNIO DEL 2017.**

Actividad	Fecha	Observaciones y Acciones
Operativo sorpresa a locales de expendio de bebidas alcohólicas (Policía, Intendencia , Defensoría y Slim )	03 de Febrero del 2017 horas 21:00 p.m. a 00:00 a.m.	se encontró menores de edad, en el Motel Okey y se realizó la Clausura correspondiente por Intendencia
Operativo sorpresa a locales de expendio de bebidas alcohólicas (Policía, Intendencia , Defensoría y Slim )	13 de Mazo del 2017 horas 21:00 p.m. a 00:00 a.m.	No se encontró menores de edad. Se Clausuro por intendencia el Local san Lucas por no contar licencia de Funcionamiento
Operativo sorpresa a locales de expendio de bebidas alcohólicas (Policía, Intendencia , Defensoría y Slim )	18 de Mazo del 2017 horas 21:00 p.m. a 00:00 a.m.	se encontró un menor de edad el cual se remitió a las oficinas de la defensoría, se llamó a sus padres para realizar el acta de compromiso
Operativo sorpresa a locales de expendio de bebidas alcohólicas (Policía, Intendencia , Defensoría Y Slim)	11 de Mayo del 2017 horas 07:00 a.m. a 09:00 a.m.	No se encontró menores de edad.
Operativo sorpresa a locales de expendio de bebidas alcohólicas (Policía, Intendencia , Defensoría)	11 de Mayo del 2017 horas 07:00 a.m. a 09:30 a.m.	No se encontró menores de edad.
Operativo sorpresa a locales de expendio de bebidas alcohólicas (Policía, Intendencia , Defensoría Y Slim)	02 de Junio del 2017 horas 23:00 p.m. a 01:50 a.m	No se encontró menores de edad.

**TALLERES ORGANIZADOS POR LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MES  
ENERO AL 30 JUNIO DEL 2017**

MESES	ACTIVIDAD	TEMA	LUGAR
Marzo 21 Del 2017	Taller	Taller de Socialización de la Ley 099 Ley Municipal y la Ley 263	Dirección Distrital de Educación
Marzo 31 Del 2017	Feria	Feria interinstitucional socializando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Mujeres, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad	Distrito A Barrio Kami
Abril 04 del 2017	Taller	Ley 263 Trata y Tráfico de personas	Unidad Educativa Sausalito
Abril 04 del 2017	Taller	Ley 263 Trata y Tráfico de personas	Unidad educativa San José Kami
Abril 10 Del 2017	Día del Niño	Concejo Infantil Agasajo por el día del niño y feria de salud	Cancha de Loronkocha
Abril 28 Del 2017	Feria	Feria interinstitucional socializando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Mujeres, adultos Mayores y Personas con Discapacidad	Distrito B Barrio Florida Norte
Mayo 16 Del 2017	Taller	Taller Elección del Comité Contra toda forma de Violencia sexual de niñas, niños y Adolescentes en cumplimiento de la Ley 099 Ley Municipal	Dirección Distrital de Educación
Mayo 29 Del 2017		Taller Proxenetismo y Ley 263 Trata y Tráfico de personas	Unidad Educativa Padre Rafael Arnaiz
Mayo 30 Del 2017	Feria	Feria interinstitucional socializando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Mujeres, adultos Mayores y Personas con Discapacidad	Distrito B Capacachi
Junio 01 del 2017	Feria	Movilización y Feria 1° de Junio día Municipal contra toda forma de Violencia Sexual a Niños Niñas y Adolescentes de nuestro Municipio	Plaza 15 de Abril
Junio 02 del 2017		Ley 263 Trata y Tráfico de personas	Unidad Educativa Benedicto Duran
Junio 02 del 2017		Ley 263 Trata y Tráfico de personas	Unidad Educativa Don Bosco

**OPERATIVOS PLAN MOCHILA SEGURA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MES ENERO AL 30 JUNIO DEL 2017**

<b>FECHA</b>	<b>UNIDAD EDUCATIVA</b>	<b>INSTITUCIONES</b>
02 de Junio del 2017	U.E. San José Kami	FELCV, FELCN, FELCC, GACIP y DNA.

**I.2.2. UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES INTEGRALES PARA LA MUJER**

**Abg. Mauricio Barbery Canedo**  
**ENCARGADO a.i. S.L.I.M**

TIPOLOGIAS DE VIOLENCIA	N° DE CASOS POR MES Y SEXO																TOTAL POR TIPOLOGIA		
	ENERO	SEXO		FEBRERO	SEXO		MARZO	SEXO		ABRIL	SEXO		MAYO	SEXO		JUNIO		SEXO	
		F	M		F	M		F	M		F	M		F	M			F	M
VIOLENCIA FISICA	1	1		1	1		5	5		1	1		1	1		5	5		<u>14</u>
VIOLENCIA PSICOLOGICA	28	24	4	15	14	1	32	30	2	18	16	2	22	18	4	25	18	7	<u>140</u>
VIOLENCIA ECONOMICA	3	3					2	2		1	1					2	2		<u>8</u>
ABANDONO DE FAMILIA	6	2	4				6	1	5	3	1		11	5	6	8	4	4	<u>34</u>
VIOLENCIA FISICA Y ABANDONO DE FAMILIA							1		1										<u>1</u>
VIOLENCIA FISICA Y PSICOLOGICA	8	8		5	5		4	4		10	10		4	4		3	3		<u>34</u>
VIOLENCIA PSICOLOGICA Y ABANDONO DE FAMILIA							2	2											<u>2</u>
VIOLENCIA PSICOLOGICA Y VIOLENCIA ECONOMICA	1						1	1		3	3								<u>5</u>
INCUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA FAMILIAR										1	1								<u>1</u>
<b>TOTALES POR MES</b>	<u>47</u>			<u>21</u>			<u>53</u>			<u>37</u>			<u>38</u>			<u>43</u>			<u>239</u>



**CASOS ATENDIDOS POR TIPOLOGIAS  
ENERO – JUNIO GESTION 2017  
ACCIONES DE INTERVENCION ANTE LAS DENUNCIAS DE VIOLENCIA EN LAS OFICINAS  
DEL S.L.I.M.**

**ENERO - JUNIO GESTION 2017**

ACCIONES	MESES						TOTALES
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
DOCUMENTOS BUENA CONDUCTA	12	7	18	9	12	8	66
DOCUMENTOS DESVINCULATORIO DE SEPARACION	20	11	25	18	13	10	97

**CASOS REMITIDOS A LA FISCALIA Y JUZGADO**

	MESES						TOTALES
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
FISCALIA	1	2	4	1	2	1	11
JUZGADO	1		2	1		1	5

**TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA PSICOLOGICA  
ENERO – JUNIO GESTION 2017**

ACTIVIDADES	MESES						TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
TERAPIA INDIVIDUAL	5	3	5	7	5	5	25
TERAPIA DE PAREJA	4	5	4	3	4	5	30
CONSEJERIA	9	5	6	8	11	12	51
VALORACIONES PSICOLOGIA A REQUERIMIENTO DE LA F.E.L.C.V.	2	3	5	4	3	4	21
VALORACIONES PSICOLOGICAS A REQUERIMIENTO DE LA FISCALIA	5	10	10	7	8	10	50
<b>TOTALES EN GENERAL</b>							<b>177</b>

**TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA SOCIAL  
ENERO – JUNIO GESTION 2017**

ACTIVIDADES	MESES						TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
INFORMES SOCIALES	1	4	6	4	5	3	23
ABORDAJES SOCIALES	6	7	4	2	5	9	33
SEGUIMIENTOS SOCIALES	8	10	12	11	15	8	64
INFORME SOCIAL ASISTENCIA FAMILIAR		3		1	1	1	6
RECOJO DE PERTENENCIAS CON PERSONAL DE LA F.E.L.C.V.	2	1	2		2	3	10
<b>TOTALES EN GENERAL</b>							<b>136</b>

**OPERATIVOS ORGANIZADOS EN COORDINACION CON LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ, S.L.I.M., POLICIA E INTENDENCIA.  
ENERO – JUNIO GESTION 2017**

ACTIVIDAD	FECHA	OBSERVACIONES Y ACCIONES
Operativo sorpresa a locales de expendio de bebidas alcohólicas (Policía , Intendencia , Defensoría y Slim )	<b>03 de Febrero</b> horas 21:00 p.m. a 00:00 a.m.	No se encontró mujeres en estado de gestación, se encontró menores de edad, en el Motel Okey y se realizó la Clausura.
Operativo sorpresa a locales de expendio de bebidas alcohólicas (Policía , Intendencia , Defensoría y Slim )	<b>13 de Marzo</b> horas 21:00 p.m. a 00:00 a.m.	No se encontró mujeres, ni menores de edad. Se Clausuro el Local San Lucas por no contar licencia funcionamiento.
Operativo sorpresa a locales de expendio de bebidas alcohólicas (Policía , Intendencia , Defensoría y Slim )	<b>18 de Marzo</b> horas 21:00 p.m. a 00:00 a.m.	No se encontró mujeres, pero si, se encontró un menor de edad, remitido a las oficinas de la defensoría.
Operativo sorpresa a locales de expendio de bebidas alcohólicas (Policía , Intendencia , Defensoría y Slim )	<b>11 de Mayo</b> horas 07:00 a.m. a 09:00 a.m.	No se encontró mujeres en estado de gestación, ni menores de edad.
Operativo sorpresa a locales de expendio de bebidas alcohólicas (Policía , Intendencia , Defensoría y Slim )	<b>02 de Junio</b> horas 23:00 p.m. a 01:50 a.m.	No se encontró mujeres en estado de gestación, ni menores de edad.

**ACTIVIDADES REALIZADAS  
GESTION 2017 ENERO – JUNIO**

- FERIAS INTERINSTITUCIONALES “SOCIALIZANDO LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, MUJERES, ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, LLEVADOS A CABO EN DIFERENTES DSITRITOS DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA.
  - Distrito A (Plaza Minero Barrio - Kami)
  - Distrito B (Cancha Florida Norte y Plaza de Capacachi)
- Organización para el festejo del día de la Mujer Internacional obsequio de (Rosas) a todas las mujeres del municipio
- ORGANIZACIÓN DE AGAZAJO PARA EL FESTEJO DE TODAS MADRES DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA
- SEMINARIOS DE CAPACITACION CON LAS TEMATICAS “Ley N° 045 Lucha contra el racismo y toda forma de discriminación”.
- TALLER DE PREVENCIÓN Y SOCIALIZACION DE LA LEY 348 “PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”

**I.2.3. UNIDAD DE ATENCION AL ADULTO MAYOR**

Dalma Ureña

**ENCARGADA DE ADULTO MAYOR**

La unidad de atención al adulto mayor hasta el mes de Mayo de la gestión 2017, realizo varias actividades a favor de las personas adultas mayores, asimismo se realizó la recepción de diferentes tipos de denuncia. Se encargó de atender diferentes tipos de casos como ser maltratos físicos, verbal, psicológico, problemas de conducta y abandono, asimismo se encarga de proteger los derechos y deberes de todas las personas adultas mayores.

**DENUNCIAS ATENDIDAS**

**“ACTUALMENTE SEGÚN REGISTRO DEL COMPLEMENTO NUTRICIONAL CARMELO EXISTEN 1.910 ADULTOS MAYORES AFILIADOS Y REGISTRADOS HASTA EL 30 DE MAYO DEL 2017, DENTRO EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA”.**

**DENUNCIAS ATENDIDAS 2017**

<b>DENUNCIAS ATENDIDAS DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MAYO</b>				
Casos	fecha	Tipología	Forma de solución	observaciones
32	10/01/2017 al 30/05/17	Maltrato psicológico, físico, problemas de conducta familiar, verbal y abandono.	Parciales y definitivas	Mayoría de casos por problemas de bienes muebles e inmuebles, abandono y por herencia.

**CASOS SOLUCIONADOS**

<b>CASOS ATENDIDOS DEL 07 DE ENERO AL 30 DE MAYO</b>				
Casos	Fecha	Tipología	Forma de solución	Observaciones
26	10/01/17 al 30/12/17	Maltrato psicológico, físico, verbal, y abandono	*Responsabilidades asumidas por los hijos. *Actas de Buena Conducta. *Remisión de Adulto Mayor a hogar “San José”	

**ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA  
EL 30 DE MAYO DEL 2017**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>ACTIVIDADES</u></b>	<b><u>LUGAR</u></b>
19/03/17	Feria interinstitucional de socialización de los derechos de los niño(as), adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores"	Cancha de la OTB San José Kami"
29/03/17	"Feria de Exposición y socialización de la Ley 369 y juegos de antaño con adultos mayores"	DISTRITO A- san José Kami
20/04/17	Taller de Socialización de la Ley 1886 y encuentro de generaciones del adulto mayor	Parroquia de "San Lorenzo".
27/04/17	Feria interinstitucional de socialización de los derechos de los niño(as), adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores"	OTB Florida Norte I
20/05/17	Feria de Exposición y socialización de la Ley 369 y juegos de antaño con adultos mayores"	DISTRITO B-florida Norte I
30/05/17	Feria interinstitucional de socialización de los derechos de los niño(as), adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores"	Plazuela de Capacachi Norte
26/08/16	"Promoviendo los derechos, deberes y protección social para el adulto mayor- ley 369 y 475"	Coliseo de la Unidad Educativa "27 de Mayo",

**ACTIVIDADES REALIZADA 2017**

**Difusión sobre los derechos, deberes y la salud de los Adultos Mayores mediante afiches, Calendario, folders y cuadernillos Ley 369 –Marzo 2017**

<b>N°</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Descripción del bien o servicio</b>	<b>Precio unitario (bs)</b>	<b>Total</b>
1.-	1000	Unidades	Folders tamaño Oficio Full Color, Cartón Triplex plastificado y Sectorizado	7,00	7.000,00
2.-	1000	Unidades	Trípticos tamaño oficio full color papel couche 150grs	0,85	850,00
3.-	1000	Unidades	Adhesivos 20 x11 full color	0,90	900,00
<b>TOTAL:</b>				<b>8.750,00</b>	

**ACTIVIDADES MARZO 2017**

<b>N°</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>TEMA</b>	<b>MES</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
1.	Feria	"Feria Interinstitucional de sociabilización de los derechos de los niños(as) adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores"	Marzo	1.400,00
2.	Feria	Feria de "Exposición y sociabilización de la Ley 369 y juegos de antaño con adultos mayores"	Marzo	2.000,00

**ACTIVIDADES- ABRIL 2017**

<b>N°</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>TEMA</b>	<b>MES</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
3.	Taller	"Sociabilización de la Ley 1886 y encuentro de generaciones del adulto mayor"	Abril	2.000,00
4.	Feria	Feria Interinstitucional de Socialización de los derechos de los niños (as), adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores"	Abril	1.400,00

## ACTIVIDADES MAYO 2017

Nº	ACTIVIDADES	TEMA	MES	PRESUPUESTO
5.	Feria	Feria de "Exposición y sociabilización de la Ley 369 y juegos de antaño con adultos mayores"	Mayo	2.000,00
6.	Feria	"Feria Interinstitucional de sociabilización de los derechos de los niños(as) adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores"	Mayo	1.400.00

### **PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR GESTION 2017**

El presupuesto designado a la Unidad de Adulto Mayor para la gestión 2017 fue de 70.000,00 bolivianos; con una ejecución presupuestaria de 31.072,05 Bs. hasta el 30 de Mayo de 2017.

### **I.2.4. UNIDAD DE DISCAPACIDAD**

Lic. Gladis Saavedra

#### **ENCARGADA DE DISCAPACIDAD**

La Unidad de Discapacidad es un servicio Municipal cuyo objetivo primordial es precautelar la vigencia de los Derechos de las Personas con Discapacidad para garantizar el cumplimiento de los Derechos, garantías beneficios que establecen en la **C.P.E. y la Ley N° 223** y otras Normativas.

#### **LOGROS**

- ✚ La suscripción de convenio entre el Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua con la Asociación Civil "TUKUY PACHA" para dotar de ayudas técnicas previo informe social de la Umadis para su movilización y otros beneficios para la población con discapacidad para fortalecer a la Familia con actividades Planificadas en coordinación con la "A.P.D.M.C" . y la UMADIS cumpliendo con el mandato de dicha instancia técnica de buscar y generar Políticas y Proyectos a favor de las Personas con Discapacidad de Colcapirhua y mejorar su calidad de vida.
- ✚ La UMADIS gestiona la Carnetización de Persona con Discapacidad evaluadas en la gestión 2016 en coordinación con el Equipo de CODEPEDIS previa evaluación por el Equipo Médico Calificador con el PROGRAMA de Registro y Calificación de Personas con Discapacidad de los 5 Distritos de Colcapirhua se solicitó el BUS Municipal para trasladar al SEDEGES
- ✚ Una vez identificado la cantidad de Personas con Discapacidad en el Municipio, los tipos, causas de Discapacidad y conocer sus principales necesidades y de acuerdo al grado de Discapacidad podrán acceder a los beneficios que establece la Ley 223 y la Ley 475 de Seguro integral ; cabe aclarar que sin el Carnet de Discapacidad este sector no accede a los beneficios pre-establecidos y la generación y búsqueda de apoyo institucional para el beneficio directo de las Personas con Discapacidad (ayudas técnicas, medicamentos, atención médica por especialidades, documentación y Certificaciones de OTBS
- ✚ Se participó en Ferias interinstitucionales que son espacios de sensibilización de la temática de difusión de Derechos de la población con Discapacidad en las OTBS ,

- ✚ Se coordinó con la **Asociación Civil “TUKUY PACHA “ para capacitar en los** Centros de Salud con el **PROGRAMA “SAFCI “ y “MI SALUD”** para una atención preferente a las Personas con Discapacidad y nos puedan coadyuvar con la identificación de casos nuevos mediante las carpetas familiares .
- ✚ Coordinación con Instituciones que trabajan en apoyo a las Personas con Discapacidad como ser: Asociación Civil Tukuy Pacha, Asociación RIC, Audio cruz, Defensor del Pueblo, Cedecass , Centros de Salud , Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios , Centro de Rehabilitación ROJAS MEJIA , así mismo con especialistas para la emisión del Informe Médico a un precio accesible a nuestra población de Neurología , Traumatología , Psiquiatría y otros
- ✚ Coordinación con Presidentes de OTBS para certificaciones de Personas con Discapacidad, para iniciar el Trámite de certificado de nacimiento y posterior tramite de cédulas de identidad en SEGIP.
- ✚ Se Informó sobre el Registro y Calificación de Personas con Discapacidad en la Oficina de Atención a Discapacidad así mismo en los 5 Distritos de Colcapirhua
- ✚ Se identifico a las Personas con Discapacidad en el Municipio, los tipos, causas de Discapacidad y sus principales necesidades para coadyuvar con los requisitos de documentación de acuerdo al grado de Discapacidad podrán acceder a los beneficios que establece la Ley 223 y la Ley 475 de Seguro integral ; cabe aclarar que sin el Carnet de Discapacidad este sector no accede a los beneficios pre-establecidos.
- ✚ Participación en reuniones con la Organización de Personas con Discapacidad de nuestro Municipio para la información de la RENTA SOLIDARIA , habilitaciones , actividades de Talleres , convocatorias para tomar en cuenta a los acuerdos determinados por el pleno de las Bases en Asambleas que deben ser de cumplimiento por el Directorio y la UMADIS .
- ✚ Difusión, Sensibilización e Información de Leyes y Normativas que protegen a la población con Discapacidad de Derechos en diferentes actividades culturales, artesanales, educativas, dirigidas a la población en su conjunto.

## **RESULTADOS**

A la fecha la Umadis tiene registrado 310 afiliados Personas con Discapacidad en los 5 Distritos de Colcapirhua para los que se busca ayuda y se busca convenios con instituciones gubernamentales que trabajan en la temática de discapacidad.

Las actividades de la Umadis son coordinadas con la Organización de Personas con Discapacidad que ejerce un control social del trabajo que se realiza

Se atendieron casos de maltrato, abandono, discriminación, exclusión educativa ; explotación laboral; Solicitudes de puestos de venta; terapias psicológicas; entrega de medicamentos ; gestión de documentación en el arzobispado, Identificación, Sereci trámite para Cedulación Tramites para su ingreso a Centros de Rehabilitación se gestionó Convenios con Hospitales de 2do y 3er nivel para Informes médicos para PCD.

Se entregó medicamentos, insumos y vituallas a Personas con Discapacidad en situación de extrema pobreza en las visitas sociales, gestionadas por mi persona a farmacias solidarias, instituciones y personas naturales que se solidarizan con nuestro sector.

Se solicitaron la elaboración de informes sociales para las Personas con Discapacidad a trabajo social del Slim y Dnna para cumplir con el requisito para la RENTA SOLIDARIA, así mismo para cambio de tutores por fallecimiento en los casos de Personas con Discapacidad (INTELECTUAL SEVERA o menores de edad)

### **ABORDAJE REALIZADO, LEGAL, PSICOLOGICO Y SOCIAL**

La Unidad de Discapacidad NO cuenta con 1 equipo multidisciplinario aun así se atiende los casos de violencia, maltrato, abandono y otros remitiendo ante las instancias correspondientes para su respectiva intervención con el área legal, social y psicológica, DNNA, SLIM, CEDECAAS (la Unidad realizando un seguimiento estricto de cada caso coordinando con las instancias de acuerdo a sus competencias según a la necesidad y demanda.

### **ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2.017**

3 Talleres con varias temáticas sobre Discapacidad

2 Ferias de Concientización y Responsabilidades de Personas con Discapacidad

La Apertura Programática **26-000-005** Programa de "Promoción de Derechos y Centro de Discapacidad" tuvo un Monto Presupuestado **Bs. 70.000** POA **2017**

-La programación de actividades gestión **2.017** con **Resolución Administrativa Municipal N°16/2017** y el Porcentaje **Ejecutado 5,67 %** de Enero a Junio de 2017.

### **CASOS ATENDIDOS POR TIPOLOGIA, GÉNERO, GRUPO ETAREO**

N° DE CASO	TIPOLOGIA	EDAD	H= hombre	M Mujer	C= Com	I= Inc.	D= der	S= Seg.	C= concluido
2	Extravió de persona con Discapacidad Intelectual	15 Años 21 Años	H	M					C
1	Abandono, indigencia de PCD	58 Años	M					S	
2	Abandono por problemas de salud en PCD	43 Años 11 Años	H	M			D	S	
2	Violencia física y psicológica a PCD	26 Años 45 Años	H	M			D		C
4	Tramitación de Cedula de Identidad	12Años 17Años 32 Años 45 Años	H  H	M M M					C
35	Otorgar Orientación e Información acerca de la Carnetización y Ayudas Técnicas.	25-35 Años	H	M					C
11	Carnetización en la Unidad de Discapacidad para nuevos registrados con Discapacidad actividad que se coordinó con CODEPEDIS	1 a 15 años	6 H	5 M					C
24		16 a 35 Años	15 H 11H	9 M 14 M					
Sin numero	Información y Orientación a toda Persona que acude a las oficinas de la Unidad de Discapacidad también se difundió y oriento acerca de los beneficios que le otorgan el Carnet de Discapacidad		H	M					C
Sin numero	Se otorgó información sobre los Requisitos para el Registro y Calificación; así mismo requisitos para su revaluación		H	M					C
Sin numero	Información para la otorgación de informes médicos desde la atención primaria en el Centro de Salud luego pedir la hoja de referencia para recibir atención por especialidad en hospitales de <b>2do y 3er nivel</b> en cumplimiento a la <b>LEY N° 475</b>	2-57 Años	H	M					C
7	Se derivó varios casos solicitando las respectivas intervenciones de acuerdo a las situaciones presentadas en cada caso con el <b>DNNA , SLIM , CEDECASS</b> Defensoría del Pueblo para atender las demandas de las <b>PCD.</b>	12 16 35 38 43 45	H  H H H	M				S	
34	Se realizó visitas domiciliarias a nuevas Personas con Discapacidad, asimismo, se fue otorgando información y orientación sobre las ayudas técnicas para realizar los Informes sociales solicitando las respectivas intervenciones de acuerdo a las situaciones presentadas en cada caso.		H	M				S	
2	Se realizó capacitación a las Personas con Discapacidad, mediante <b>Ferías y Talleres de Socialización para la Difusión de Derechos y Sensibilización</b> para contribuir a su empoderamiento con la finalidad de instruir a dicho grupo social sobre sus <b>Derechos y Obligaciones</b> , evitando la vulneración de los mismos en su entorno social	16-59 Años	H	M					C

17	Se realizó visitas domiciliarias a las PCD para su Rehabilitación dando cumplimiento al Convenio de Tukuy Pacha conjuntamente con la <b>Fisioterapeuta- Kinesióloga</b> programando las visitas y su Rehabilitación.	3 5 7 8 11 12 16 24 35 38 46	H  H H H  H  H H M M	M         M M					C
6	Se solicitó la valoración psicológica a Personas con Discapacidad para su Revaluación		H	M					
30	Se realizó el censo de PCD que nos sirvió para elevar una base de datos como instrumento de trabajo favorables que permitió facilitar la información sobre las necesidades de nuestra población con Discapacidad en los Distritos de Colcapirhua que faltaban en varias fechas realizadas por mi persona	2 - 54 Años	H	M					C
12	Solicitud de Puestos de Venta para Personas con Discapacidad	25 - 45 Años		M				S	
4	Asistencia Social Entrega de Medicamentos Personas con Discapacidad	1 - 12 Años 25 - 45 Años	H	M M					C
6	Gestión para colaboración de insumos y vituallas para PCD de extrema pobreza	0-54 Años	H	M					C
7	Solicitudes a <b>AUDIOCRUZ</b> para PCD Auditiva	2-45 Años	H	M					C
206	Total Casos								

## I.2.5. UNIDAD DE CULTURA Y TURISMO

Lic. Luis Choque

ENCARGADO DE CULTURA Y TURISMO

### CUADRO DE ACTIVIDADES

MES	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Febrero	<b>XXII Feria de la Jak'a Lawa, la Huminta el Choclo y sus derivados</b>	La actividad se desarrolló el día 12 de febrero del año en curso en la Av. Reducto, la feria contó con más de 100 expositoras logrando superar la cantidad de la gestión pasada, así mismo la asistencia de la gente fue mayor a la de versiones pasadas; un factor importante para la cantidad de visitantes fue la ubicación, ya que representó comodidad y mayor fluidez de la gente al momento de adquirir el producto y disfrutar del espectáculo preparado por la Unidad de Cultura; en escenario se presentaron 6 grupos musicales contratados por la UCYT.
Marzo	<b>Carnaval Tradicional de Colcapirhua</b>	La actividad cultural se realizó el día domingo 5 de marzo, a la misma asistieron unidades educativas, OTBs y los funcionarios del G.A.M.C. la presencia de las Unidades Militares no fue posible debido a que tuvieron que retirarse del punto de concentración por Instrucciones superiores que respondieron a un incidente en la Institución Militar. El carnaval tradicional de Colcapirhua se vio por demás colorida por la creatividad en la elaboración de los disfraces que mostraron esfuerzo y compromiso con el Municipio.
Marzo	<b>Señor de San José</b>	La actividad se llevó a cabo en fecha 18 de marzo, a la actividad cultural asistieron gran cantidad de visitantes, el G.A.M.C. apoyó a través de la unidad de cultura y turismo con la contratación de un grupo musical, además de las gestiones con empresas auspiciadoras.
Marzo	<b>Día del Mar</b>	La actividad se realizó el día jueves 23 de marzo, se coordinó con las unidades educativas en los niveles iniciales, se organizó el desfile en honor al día de la reivindicación marítima en el mismo participaron autoridades del Ejecutivo Municipal y el Legislativo Municipal; la Unidad de Cultura realizó la contratación de refrigerio y material de imprenta para la mejor ejecución de la actividad.
Abril	<b>Feria de la Ambrosia y al Comida Típica</b>	La actividad se llevó a cabo el día 23 de abril en la OTB Villa Rosedal, de la misma participaron las autoridades llamadas por ley; así también la población en su conjunto superó la cantidad en referencia a la gestión anterior. La unidad de cultura realizó la contratación de equipo de sonido y grupos



		<i>musicales; de la misma manera se coordinó con los dirigentes para la buena ejecución y gestión con las empresas para el apoyo necesario.</i>
<i>Abril</i>	<b>Creación del Municipio de Colcapirhua</b>	<i>La actividad se llevó a cabo el día 11 y 12 de abril, se debe aclarar que las fechas variaron debido a fechas religiosas de Semana Santa, el G.A.M.C. a través de la Unidad de Cultura realizó la contratación de equipo de sonido, refrigerio, material de imprenta y transporte, todo aquello con la intención de mostrar buena organización y recepción a las autoridades invitadas como anfitriones del evento</i>
<i>Abril</i>	<b>Actividad Cultural California</b>	<i>La actividad cultural se realizó en coordinación con la directiva de la OTB para una mejor ejecución del presupuesto, de la misma manera se realizó la contratación un grupo musical.</i>
<i>Mayo</i>	<b>San José Obrero OTB Kami</b>	<i>La Unidad de Cultura realizó la coordinación con la directiva de la OTB, de la misma participaron las autoridades llamadas por ley, en coordinación con la directiva se realizó la contratación de equipo de sonido y grupos musicales para darle mayor realce a la actividad cultural</i>
<i>Mayo</i>	<b>Feria Internacional FEICOBOL</b>	<i>La Unidad de Cultural y Turismo por convocatoria de la Dirección Departamental Cultura y Turismo, participó en la FEICOBOL en representación del Municipio de Colcapirhua, logrando promocionar el atractivo turístico y la muestra gastronómica, para tal cometido se coordinó con expertas en el arte culinario para dar una muestra de comida tradicional del municipio que lo ha caracterizado desde tiempos ajenos; logrando de esa manera llegar a la población de Cochabamba, Bolivia y el mundo, que degustó y conoció una de las características del municipio.</i>
<i>Mayo</i>	<b>San Isidro</b>	<i>La actividad cultural se llevó a cabo en los terrenos de Calatayud, combinando la actividad religiosa con la tradición gastronómica de antaño, pues también se realizó la feria de la comida antigua.</i>

## I.2.6. ENCARGADA DE PROGRAMAS EN EDUCACION

**Irma Rocha Meneses**

### ENCARGADA DE PROGRAMAS EN EDUCACION

#### INFORME DE PROGRAMAS EN EDUCACIÓN

El programa en educación nace del convenio Intergubernativo entre el gobierno autónomo departamental y el gobierno autónomo municipal de Colcapirhua para la atención del desarrollo infantil integral a niñas y niños hasta los cinco años de edad. (Convenio firmado el 14 de febrero de 2015 con plazo establecido de 5 años hasta 2019).

#### PROGRAMAS EN EDUCACIÓN CONSTA DE CINCO CENTROS INFANTILES

- **DEFENSORES INFANTILES**

El centro infantil está a cargo de 4 educadoras y 1 manipuladora que se encargan del cuidado y alimentación nutricional de cada uno de los 58 niños y niñas.

- **WAWAS WASI**

El centro está a cargo de 4 educadoras y 1 manipuladora que se encargan del cuidado y alimentación nutricional de cada uno de los 55 niños y niñas.

- **18 DE MAYO**

El centro está a cargo de 2 educadoras y una manipuladora que se encargan del cuidado y alimentación nutricional de cada uno de los 17 niños y niñas.

- **LIMITAS**

El centro está a cargo de 2 educadoras y 1 manipuladora que encargan del cuidado y alimentación nutricional de cada uno de los 29 niños y niñas.

- **ABEJITAS**


El centro está a cargo de 3 educadoras y 1 manipuladora que se encargan del cuidado y alimentación nutricional de cada uno de los 49 niños y niñas.

**CABE ACLARAR QUE EL CUPO PARA LOS CINCO CENTROS INFANTILES ES DE 200 NIÑOS Y NIÑAS.**

- En fecha 06 de marzo se inauguró el inicio de las actividades de los centros infantiles con la presencia del Alcalde Municipal y el pleno del Concejo Municipal donde se hizo la entrega del Mobiliario, Equipamiento, Material Didáctico y Material de Limpieza.
- Entrega de mobiliario a los cinco centros infantiles en fecha 06 de marzo de 2017 que consta de 40 sillas y 15 mesas hexagonales, con un costo de 17.000 bs.
- La distribución de dicho material y mobiliario fue de acuerdo a la cobertura de cada centro infantil.
- Entrega de equipamiento a los cinco centros infantiles de 5 Refrigeradores con un costo de 40.000 bs.
- Material Didáctico consta de pinturas, hojas bon, hojas de colores, Rastis crayones ula ulas, pelotas, gomas evas, etc.
- La distribución de dicho material fue de acuerdo a la cobertura de cada centro infantil.
- Entrega de material de limpieza, que consta de detergentes como ser Ace, ambientador, anti sarro, limpia vidrios, escobas, gomas de trapear trapos de piso bolsa de basura, etc.

### **ACTIVIDADES**

- 23 Marzo.- Actividad cívica, donde los 5 centros infantiles participaron del desfile cívico escolar mostrando su creatividad.
- 12 Abril = Actividad día del niño en los centro infantil donde se realizó el agasajo a los pequeños contando con la presencia de padres de familia.
- 15 Abril = Actividad aniversario del Municipio de Colcapirhua donde los 5 centros infantiles participaron del desfile cívico escolar mostrando su creatividad.
- 27 de Mayo día de la madre = Actividad donde los 5 centros infantil realizaron el agasajo del día de la madre en la fecha 25 y 26 de mayo, donde los niños participaron demostrando su habilidad y talento.
- 6 de Junio día del Maestro = Actividad donde las 20 educadoras y 5 manipuladoras de los cinco centros infantiles participaron en el día del Maestro en el centro infantil Limitas.

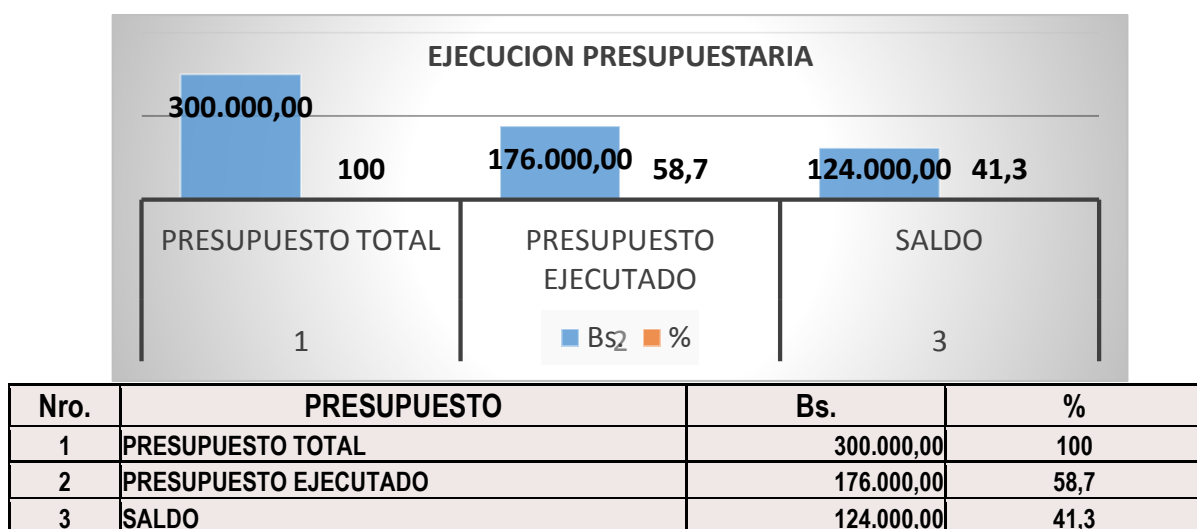

**Maritza Plaza de Góngora**  
**TECNICA DE POST-ALFABETIZACION “YO SI PUEDO SEGUIR”**

EL Programa de Post-alfabetización “Yo, sí puedo seguir” abalado por los decretos supremo 004 y 1318, fue implementándose desde la 2009 en el Municipio de Colcapirhua ofreciendo una educación equivalente al nivel primario en diferentes Unidades Educativas, Otb, Casas comunales y domicilios particulares.

**OBJETIVO**

- Proporcionar una educación primaria a los recién alfabetizados y a todas las personas mayores de 15 años que han abandonado o no han tenido acceso a la educación, otorgándoles un curriculum de 1º a 6º de primaria. Complementando la educación primaria con cursos cortos en Tejido, macramé, bordado y pintado, reciclado en papel y plástico en los diferentes grupos de Post Alfabetización.
- Desarrollar procesos de alfabetización dirigido a personas mayores de 15 años que son parte de la población residual.

**INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA DE POST ALFABETIZACION DE ENERO A MAYO DE LA GESTION 2017.**

**POST-ALFABETIZACIÓN**

META	CUMPLIMIENTO	META DE GRADUADOS A 3RO	CUMPLIMIENTO	META DE GRADUADOS A 6TO	CUMPLIMIENTO
149	149	149		82	0

## **ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- De Enero - Mayo: Socialización de programa de Post-alfabetización en las Otb Esquilan Grande Holanda, Sausalito, Florida Norte y Kami
- Marzo - abril: Asistencia a las ferias de Kami y Florida Norte para informar sobre los beneficios de Alfabetización y Post alfabetización a la población en general.
- Enero - abril: Emisión de convocatoria para la conformación de nuevos grupos en coordinación con la Distrital de Educación.
- Febrero a abril: Revisión de participantes en el SIE.
- Marzo: Reunión con facilitadores de Post Alfabetización para la elaboración del Calendario Educativo.
- Abril: Taller de capacitación en reciclado, Macramé, Tejido, Bordado y pintado en tela.

### **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017**

PROGRAMA	PARTIDA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO	PRESUPUESTO	TOTAL
POST ALFABETIZACION "YO, SI PUEDO SEGUIR"	21-0000-005	39.883,00	40.117.00	80.000,00

## I.2.7. ENCARGADO DE EDUCACION

German Ríos

### 1. DATOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA


INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	N°	UNIDAD EDUCATIVA	TURNO	Nro. de Alumnos	NIVEL
I	1	PABLO CANO	Mañana	574	SECUNDARIA
	2	JESUS LARA	Tarde	796	PRIMARIA
	3	CEA LA FLORIDA (CEA)	Noche	250	ALTERNATIVA
II	4	FERROVIARIO	Mañana	503	PRIMARIA
	5	MAX FERNANDEZ	Tarde	269	SECUNDARIA
III	6	SAN JOSE KAMI	Mañana	926	INICIAL- PRIMARIA - SECUNDARIA
	7	MARISCAL SUCRE	Tarde	551	INICIAL- PRIMARIA - SECUNDARIA
IV	8	SAN LORENZO	Mañana	747	SECUNDARIA
	9	RAFAEL ARNAIZ	Tarde	448	PRIMARIA
V	10	DANIEL SALAMANCA	Mañana	1160	INICIAL- PRIMARIA - SECUNDARIA
	11	27 DE MAYO	Tarde	884	INICIAL- PRIMARIA - SECUNDARIA
VI	12	SAGRADA FAMILIA	Mañana	609	PRIMARIA
	13	ANDRES CUSCHIERI	Tarde	352	SECUNDARIA
VII	14	BENEDICTO DURAN	Mañana	607	INICIAL- PRIMARIA - SECUNDARIA
	15	GENOVEVA RIOS	Tarde	52	ESPECIAL
VIII	16	NUUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	Mañana	521	INICIAL- PRIMARIA - SECUNDARIA
	17	MARIA AUXILIADORA (CEA)	Noche	223	ALTERNATIVA
IX	18	DON BOSCO	Mañana	508	INICIAL- PRIMARIA - SECUNDARIA
X	19	SAUSALITO	Mañana	399	INICIAL- PRIMARIA - SECUNDARIA
XI	20	SIMON BOLIVAR	Mañana	730	INICIAL- PRIMARIA - SECUNDARIA
XII	21	15 DE ABRIL	Mañana	101	PRIMARIA
<b>TOTAL</b>				<b>11210</b>	

### 1.1. FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Nro.	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO
1	PAGO DE SERVICIOS BASICOS	154.464,00

2	4 SERVICIOS MANUALES	65.808,60
3	5 CONSULTORES DE LINEA	73.578,90
4	20 CONSULTORES DE LINEA(ADMINISTRATIVOS)	122.400,00
5	IMPLEMENTACION DE TROMPETAS (MATERIA DE MUSICA)	32.160,00
6	MATERIAL DE ESCRITORIO (PARA TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS)	49.758,75
7	MATERIAL DE LIMPIEZA (PARA TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS)	49.650,00
8	MATERIAL DE LABORATORIO (MATERIAS DE FISICA Y QUIMICA)	9.557,00
9	MATERIAL DE INSUMOS DE COMPUTACION (TINTAS Y REPUESTOS DE COMPUTACION)	14,546,00
10	BANDERAS PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS	4.800,00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>572.726,25</b>


Nro.	PRESUPUESTO	Bs.	%
1	PRESUPUESTO TOTAL	1.000.000,00	100
2	PRESUPUESTO EJECUTADO	572.723,25	57,3
3	SALDO	427.276,75	42,7

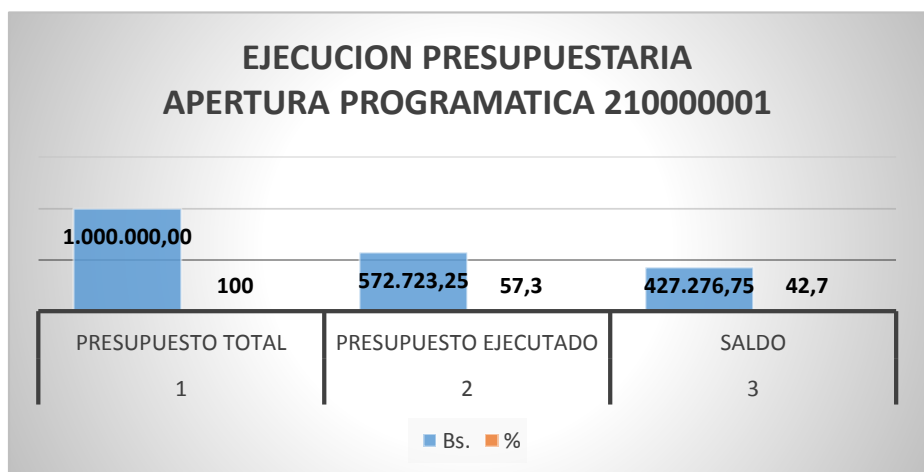

## 1.2. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Nro.	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
1	MANTENIMIENTO DE 12 INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS	310.474,22
2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	36.133,00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>346.607,22</b>


Nro.	PRESUPUESTO	Bs.	%
1	PRESUPUESTO TOTAL	350.000,00	100
2	PRESUPUESTO EJECUTADO	346.133,22	98,9
3	SALDO	3.866,78	1,1

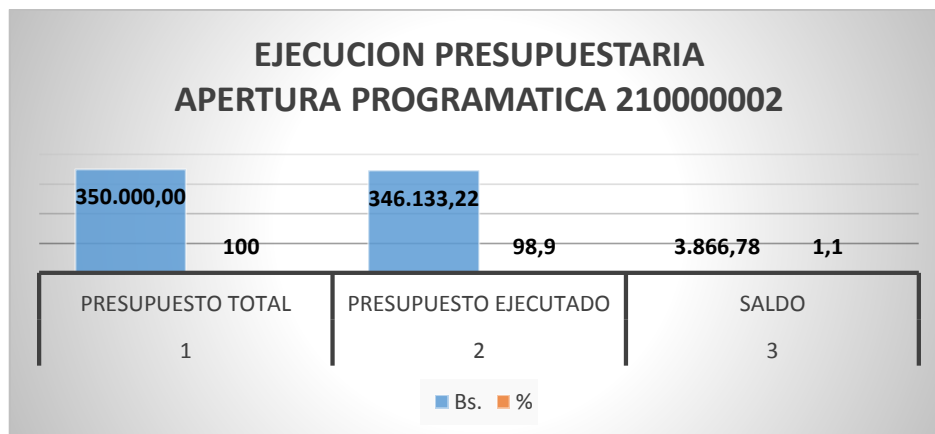

### 1.3. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR

Nro.	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO
1	ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS	341.325,00
2	ENTREGA DE MOBILIARIO ESTANTES Y ESCRITORIOS	13.600,00
3	ENTREGA DE PIZARRAS ACRILICAS	19.220,00
4	ENTREGA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	11.243,80
5	COMPUTADORAS BILIOTECA VIRTUAL Y UNIDADES EDUCATIVAS	69.610,00
6	IMPLEMENTACION DE MATERIAL TECNICO MAQUINAS DE COSTURA (BACHILLERATO TECNICO HUMANISTICO)	13.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>477.048,80</b>


Nro.	PRESUPUESTO	Bs.	%
1	PRESUPUESTO TOTAL	480.000,00	100
2	PRESUPUESTO EJECUTADO	477.048,80	99,4
3	SALDO	2.951,20	0,6

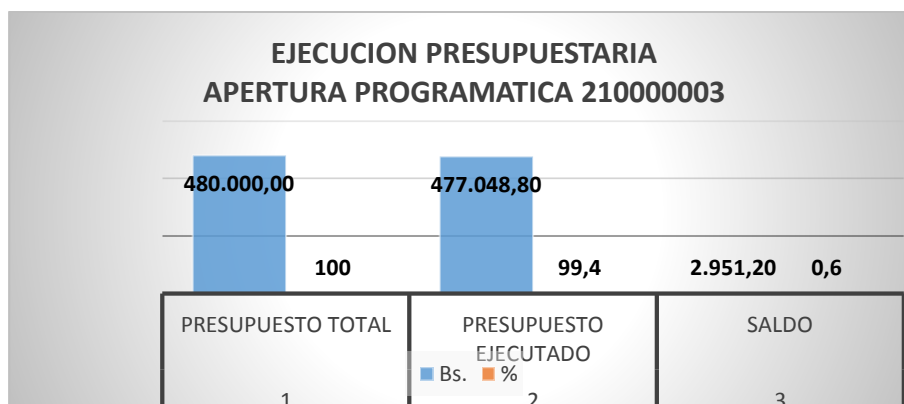

#### 1.4. DESAYUNO ESCOLAR

Nro.	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
1	ENTREGA DESAYUNO ESCOLAR	2.387.552,65
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>2.387.552,65</b>


Nro.	PRESUPUESTO	Bs.	%
1	PRESUPUESTO TOTAL	5.300.000,00	100
2	PRESUPUESTO EJECUTADO	2.387.552,65	45,0
3	SALDO	2.912.447,35	55,0

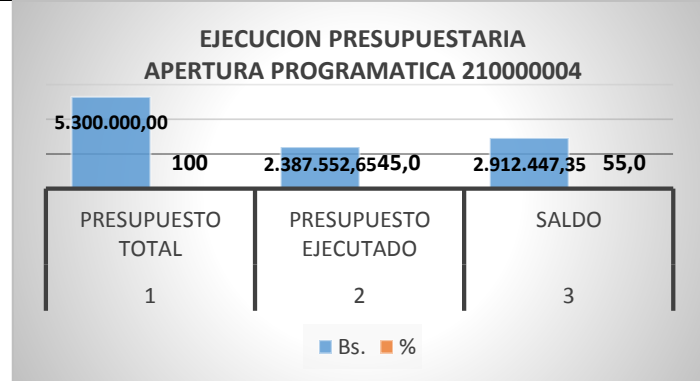

#### 1.5. MEJORAMIENTO DE BATERIAS DE BAÑOS UNIDADES EDUCATIVAS

Nro.	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
1	MANTENIMIENTO DE BATERIAS DE BAÑOS DE UNIDADES EDUCATIVAS	241.989,29
2	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	33.633,00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>		<b>275.622,29</b>


Nro.	PRESUPUESTO	Bs.	%
1	PRESUPUESTO TOTAL	360.000,00	100
2	PRESUPUESTO EJECUTADO	275.622,29	76,6
3	SALDO	84.377,71	23,4

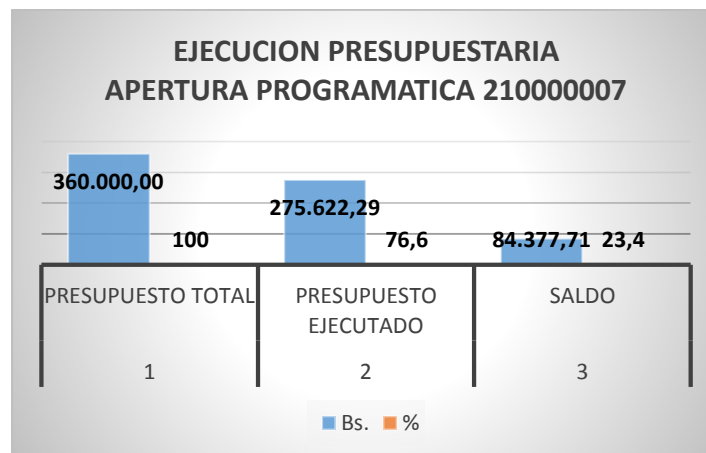

## 2. RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Nro.	PRESUPUESTO	Bs.	%
1	PRESUPUESTO TOTAL	7.166.000,00	100
2	PRESUPUESTO EJECUTADO	4.059.038,09	56,6
3	SALDO	3.106.961,91	43,4

.	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
1	FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES	1.000.000,00	572.723,25	57,3
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS	350.000,00	346.133,22	98,9
3	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR	480.000,00	477.048,80	99,4
4	DESAYUNO ESCOLAR	5.300.000,00	2.387.510,53	45,0
5	MEJORAMIENTO DE BATERIAS BAÑOS	36.000,00	275.622,29	765,6
TOTAL GENERAL		7.166.000,00	4.059.038,09	56,6

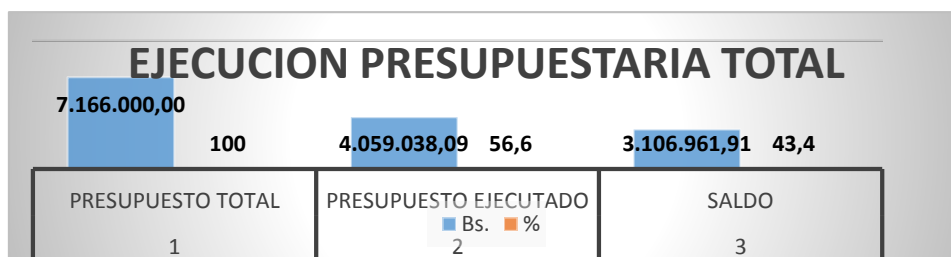

## I.3.- ENCARGADO DE CONTRATACIONES

Juan Gabriel Bustamante Guzmán  
**ENCARGADO DE CONTRATACIONES**

### PROCESOS DE CONTRATACIÓN SEGÚN MODALIDAD

Los procesos de contratación referidos a las Licitaciones Públicas (LP) fueron 1 adjudicados y 1 contratado; los procesos relacionados al Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) fueron 59 adjudicados, 30 desiertas y/o anuladas y 7 vigentes y/o en curso; los procesos relacionados a Contrataciones Directas (CD) hasta Bs 100.000,00 en obras fueron 6, las Contrataciones Directas (UPRE) fueron 5, las contrataciones menores (De Bs.20.000,00 a Bs. 50.000,00) fueron 61 y las Contrataciones




Menores (De Bs. 1 a Bs. 20.000,00) fueron de 339 hasta el 30 de junio de 2017. (Ver Tabla N° 1 Procesos de Contratación)

**TABLA N° 1**  
**PROCESOS DE CONTRATACION**  
*(De enero a Junio de 2017)*

PROCESOS DE CONTRATACIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
LICITACIONES PUBLICAS (LP) ADJUDICADAS	1	0,20%
LICITACIONES PUBLICAS (LP) CONTRATADAS	1	0,20%
APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) ADJUDICADAS Y CONTRATADAS	59	11,59%
APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) DESIERTAS Y ANULADAS	30	5,89%
APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE) VIGENTES Y/O EN CURSO	7	1,38%
CONTRATACIONES DIRECTAS (HASTA Bs. 100.000,00 EN OBRAS)	6	1,18%
CONTRATACIONES DIRECTAS (UPRE)	5	0,98%
CONTRATACIONES MENORES (De Bs. 20.000,00 a Bs. 50.000,00)	61	11,98%
CONTRATACIONES MENORES (De Bs. 1,00 a Bs. 20.000,00)	339	66,60%
<b>TOTAL</b>	<b>509</b>	<b>100%</b>

Asimismo, los procesos relacionados a Contrataciones Menores (de Bs. 1,00 a Bs. 20.000,00) fueron el 66.60% respecto al total de procesos, los procesos de contrataciones menores (de Bs. 20.000,00 a Bs. 50.000,00) representan 11.98%, los procesos relacionados con las contrataciones directas (UPRE) representan el 0.98%, los procesos relacionados con las contrataciones directas (hasta Bs. 100,000.00 en obras) representan 1.18%, los procesos de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo representan el 18.86% del total y finalmente los procesos relacionados a Licitaciones Públicas representan el 0.40% del total de procesos. (Ver Gráfico N° 1 Procesos de Contratación Según Modalidad)

**GRAFICO N° 1  
PROCESOS DE CONTRATACIÓN SEGÚN MODALIDAD**

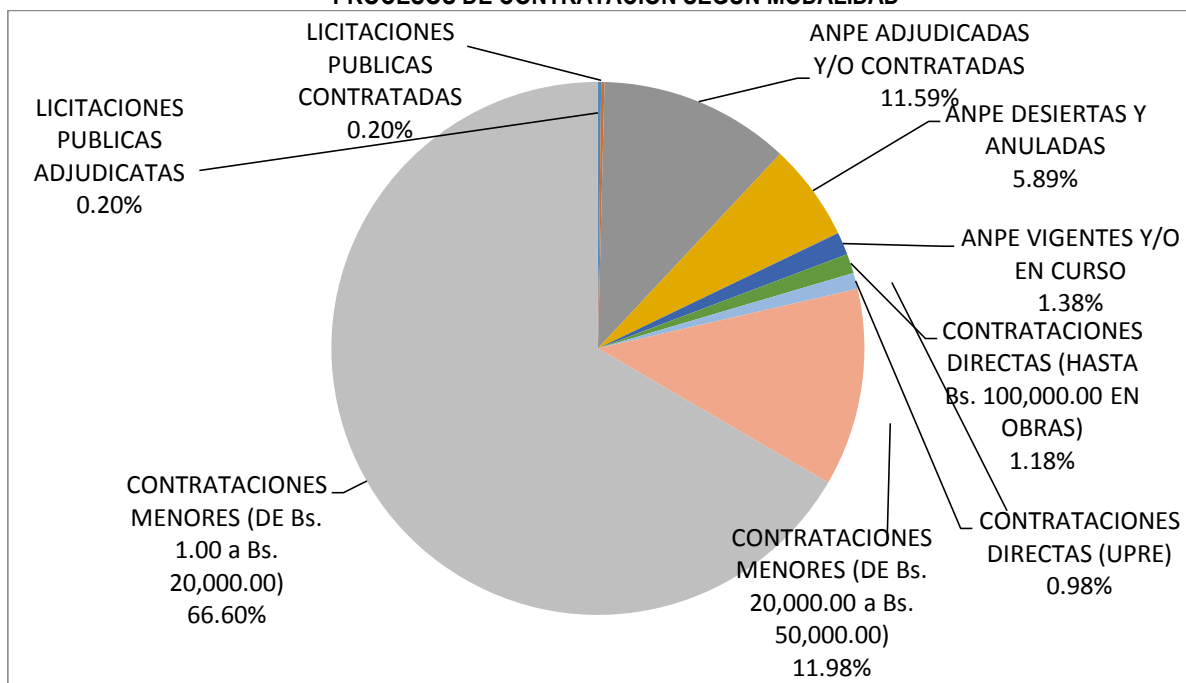

**CONSULTORÍAS DE LÍNEA.-**

DETALLE	CANTIDAD
Consultores de línea G.A.M. Colcapirhua	113
Consultores de línea H.M.A. Cuschieri	35
Consultores de línea C.S.I. Colcapirhua	20
Servicios C.S.I. Colcapirhua	16
Consultores de línea Educación	20
Servicios limpieza de canales y barrenderas	40
Servicios manuales pavimento rígido - ayudantes hormigoneros	59
Servicios G.A.M. Colcapirhua	48
Servicios programas en Educación (centros infantiles)	24
Servicios H.M.A. Cuschieri	17
Consultorías por producto	3
Servicios con contrato (provisión alimentos, gomería, internet, fotocopias, alquiler ambientes)	15
<b>TOTAL</b>	<b>410</b>

**SISIN WEB.-** Es el Sistema de Información Sobre la Inversiones vía Web, dentro las actividades que se realizaron en este sistema en la presente gestión son: el catálogo de proyectos que se ejecutaran del POA -2017, la actualización de los proyectos de continuidad, dictámenes en base a la etapa que se encuentran los proyectos, la programación anual del Gasto la mi sma que se realizó a principios de año,

la programación financiera de la gestión 2017, la programación física de la gestión 2017, se reportó la ejecución financiera mensual de enero a Junio hasta los 10 días de cada mes, el cierre de los proyectos que se encuentran terminados física y financieramente.

### **LICITACIONES PÚBLICAS (ADJUDICADAS)**

<b><u>Nº</u></b>	<b><u>OBJETO DE LA CONTRATACIÓN</u></b>
1	ADQUISICIÓN ANUAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICAMENTOS, INSUMOS ODONTOLÓGICOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LA LEY 475 (SIS) GESTION 2017, DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD (HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI, CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL COLCAPIRHUA Y SUS TRES CENTROS DE SALUD)

### **LICITACIONES PÚBLICAS (CONTRATADAS)**

<b><u>Nº</u></b>	<b><u>OBJETO DE LA CONTRATACIÓN</u></b>
1	SEGUROS GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

### **APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ADJUDICADOS Y CONTRATADOS)**

<b><u>Nº</u></b>	<b><u>OBJETO DE LA CONTRATACIÓN</u></b>
1	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EN LÍNEA GUARDIAS MUNICIPALES PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DANIEL SALAMANCA, SAN LORENZO, SIMÓN BOLÍVAR, FERROVIARIO, PABLO CANO, BENEDICTO DURAN, DON BOSCO, SAGRADA FAMILIA, SAUSALITO, SAN JOSÉ KAMI, NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, 15 DE ABRIL
2	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA MÉDICO GINECO OBSTETRA (I,II,III,IV) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI?
3	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA LICENCIADAS EN ENFERMERIA AREA EMERGENCIAS (I,II,III,IV); LICENCIADAS EN ENFERMERIA INSTRUMENTISTAS (I,II,III,IV); LICENCIADAS EN ENFERMERIA AREA INTERNACION (I,II,III,IV) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI?
4	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA BIOQUIMICO FARMACIA (I,II,III,IV,V) PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLCAPIRHUA Y CENTROS DE SALUD AMBULATORIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA
5	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA MEDICO GENERAL (I,II,III,IV,V,VI,VII) PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLCAPIRHUA Y CENTROS DE SALUD AMBULATORIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA
6	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA MÉDICO PEDIATRA (I,II,III,IV) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI
7	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA AUXILIAR EN ENFERMERIA AREA QUIROFANO (I,II,III,IV); AUXILIAR EN ENFERMERIA PROGRAMAS DE SALUD (I,II,III,IV); AUXILIAR EN ENFERMERIA AREA CONSULTA EXTERNA (I,II,III,IV,V) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI?
8	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA LICENCIADAS EN ENFERMERÍA (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII) PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLCAPIRHUA Y CENTROS DE SALUD AMBULATORIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA?
9	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA ODONTOLOGO (I,II,III,IV,V,VI) PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLCAPIRHUA Y CENTROS DE SALUD AMBULATORIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA Y BUS ODONTOLÓGICO?
10	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA AUXILIARES EN ENFERMERÍA (I,II,III,IV,V,VI), LICENCIADA EN FISIOTERAPIA, RADIOLOGO PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLCAPIRHUA Y CENTROS DE SALUD AMBULATORIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA?
11	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA BIOQUIMICO LABORATORIO (I,II,III) PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLCAPIRHUA Y CENTROS DE SALUD AMBULATORIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA?
12	(SMFIDS-050-17) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EDUCADORAS (15) Y MANIPULADORAS DE ALIMENTOS (5) PARA LOS CINCO CENTROS INFANTILES
13	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA MÉDICOS ESPECIALISTAS (MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO GINECOLOGO, MÉDICO ANESTESIOLOGO, MÉDICO ECOGRÁFO) PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLCAPIRHUA Y CENTROS DE SALUD AMBULATORIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA?

14	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ESTABILIZADORES Y SERVIDOR DHPE PARA EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL
15	COMPRA DE CEMENTO IP-30, PARA CONST. AV. DORBIGNI DIST. B,C,D,
16	COMPRA DE ARENA FINA LAVADA, GRAVA LAVADA Y GRAVILLA LAVADA PARA CONST. AV. DORBIGNI DIST. B,C,D,
17	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA TECNICO ESTADIGRAFO Y AUXILIARES EN ENFERMERÍA (16) PARA EL PROGRAMA MI SALUD?
18	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA BIOQUIMICO DE FARMACIA (I,II,III,IV) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI?
19	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA BIOQUIMICO DE LABORATORIO (I,II,III,IV) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI?
20	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA MÉDICO GENERAL I, MÉDICO GENERAL SERVICIO TRANSFUSIONAL; ODONTOLOGO I; LICENCIADA EN FISIOTERAPIA I; TECNICO SUPERIOR RADIOLOGO (I,II) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI?
21	(SMFIDS-382-17) ?COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. PAV. CALLE CALA CRUZ OTB FERROVIARIO NORTE DIST. C?
22	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LUMINARIAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL DISTRITO D
23	(SMFIDS-408-17) COMPRA DE CEMENTO IP-30 PARA CONST. PAV. CALLE LOS CEIBOS OTB LA PRADERA DIST. B
24	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LUMINARIAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL DISTRITO E
25	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LUMINARIAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL DISTRITO B
26	(SMFIDS-486-17) CONTRATACION DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA GUARDIAS MUNICIPALES PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS FERROVIARIO, SAGRADA FAMILIA, SAUSALITO, NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Y 15 DE ABRIL
27	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LUMINARIAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL DISTRITO C
28	ALQUILER DE COMPACTADOR PARA EL RECOJO Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO A AL RELLENO SANITARIO
29	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL DISTRITO A
30	CONST.CANALIZACION DESAGUE PLUVIAL OTB PARAISO DIST.D
31	CONST. PEFORACION POZO DE AGUA OTB KANAUT DIST. A
32	CONST. MURO DE CONTENCIÓN TORRENTERA RUMY MAYU LADO OESTE OTB SAN ALFONSO DIST. B
33	CONST. PAV. AV. ANGULO OTB SUMUMPAYA CHICO DIST.E
34	ADQUISICION DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO (NUTRIBEBE) CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DESNUTRICION CERO PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD DE COLCAPIRHUA?
35	COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR GESTION 2017 PARA TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA?
36	ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA EL ADULTO MAYOR (CARMELO) CORRESPONDIENTE A LA LEY 475 (SIS) PARA LA RED MUNICIPAL DE SALUD DE COLCAPIRHUA?
37	CONST. NIVEL INICIAL U.E. SAN JOSE DE KAMI - MARISCAL SUCRE
38	CONSTRUCCION AV.DANIEL SALAMANCA DIST.A, D
39	CONST. REVESTIMIENTO RIO PAMPA MAYU DIST. E FASE IV
40	CONST. PAV. DE VIAS OTB SAN LORENZO DIST.D
41	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE UE SAGRADA FAMILIA-ANDRES CUSCHIERI
42	CONST. EMPEDRADO DE VIAS OTB KENAMARI KULLCU DIST.E
43	CONST. PAV. CALLE PULACAYO OTB FERROVIARIO SUD DIST. C.
44	CONST. PAV.DE VIAS OTB 23 DE MARZO DIST. A
45	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE UE PABLO CANO
46	(SMFIDS-483-17) CONTRATACION DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA: LICENCIADA EN ENFERMERÍA (I,II,III) PARA EL SERVICIO DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI
47	(SMFIDS-681-17) COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR GESTION 2017 PARA TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA
48	(SMFIDS-600-17) COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI A FIN DE GARANTIZAR A LA POBLACION BENEFICIARIA DE LA LEY 475
49	(SMFIDS-601-17) COMPRA DE DESINFECTANTES Y DESINCRUSTANTES PARA EL SERVICIO DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI A FIN DE GARANTIZAR A LA POBLACION BENEFICIARIA DE LA LEY 475
50	(SMFIDS-599-17) COMPRA DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI A FIN DE GARANTIZAR A LA POBLACION BENEFICIARIA DE LA LEY 475
51	CONST. EMPEDRADO DE VIAS OTB COLLAPAMPAMPA DIST. A

52	CONST. PAV. DE VIAS OTB SAN SILVESTRE DIST.D
53	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. PAV. CALLE LOS PARAISOS - PULACAYO OTB CALIFORNIA DIST. B
54	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. PAV. F. DIEZ MEDINA OTB HOLANDA DIST. B?
55	(SMFIDS-242-17) COMPRA DE CEMENTO IP-30 PARA CONST. PAV. CALLE GARZAS OTB PIÑAMI SUD DIST. D
56	CONST. CENTRO DE CAP. SOCIAL PROD. OTB 21 DE SEPTIEMBRE DIST. D
57	CONST. SALON MULTIPLE U.E. DANIEL SALAMANCA - 27 DE MAYO
58	CONST. PARQUE INFANTIL LORONCOCHA OTB COLCAPIRHUA CENTRAL DIST. D
59	CONST. TINGLADO PATIO CENTRAL U.E. NUESTRA SRA. DE LA PAZ

### **APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (DESIERTAS Y ANULADAS)**

<b><u>Nº</u></b>	<b><u>OBJETO DE LA CONTRATACIÓN</u></b>
1	COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES CARCAMO DE BOMBEO SUMUNPAYA - COLCAPIRHUA
2	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA MÉDICO ANESTESIOLOGO (I,II,III) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI? (2 VECES DECLARADO DESIERTO)
3	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA MÉDICO CIRUJANO (I,II); MÉDICO ECOGRAFO I PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI? (UNA VEZ ANULADO Y OTRO DECLARADO DESIERTO)
4	Const. Centro de Cap. Social Prod. OTB 21 de Septiembre Dist. D
5	(SMFIDS-272-17) CONTRATACION SERVICIO DE COLOCADO DE HORMIGON PARA CONST. AV. DORBIGNI DIST. B,C,D,
6	(SMFIDS-423-17) COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO (2 VECES ANULADO)
7	Const. Salon Multiple U.E. Daniel Salamanca - 27 de Mayo
8	Const. Tinglado patio central U.E. Nuestra Sra. De La Paz
9	(SMFIDS-516-17) COMPRA DE BOTAS Y ACCESORIOS PARA RESGUARDO Y PROTECCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
10	(SMFIDS-526-17) COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
11	(SMFIDS-702-17) CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA AUXILIARES EN ENFERMERÍA (12,13,14,15,16) PARA EL "PROGRAMA MI SALUD"
12	Contratación de Consultores en Línea Guardias Municipales para las Unidades Educativas Daniel Salamanca, San Lorenzo, Simón Bolívar, Ferroviario, Pablo Cano, Benedicto Duran, Don Bosco, Sagrada Familia, Sausalito, San José Kami, Nuestra Señora de La Paz, 15 de Abril
13	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA MÉDICO GINECO OBSTETRA (I,II,III,IV) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI?
14	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA LICENCIADAS EN ENFERMERIA AREA EMERGENCIAS (I,II,III,IV); LICENCIADAS EN ENFERMERIA INSTRUMENTISTAS (I,II,III,IV); LICENCIADAS EN ENFERMERIA AREA INTERNACION (I,II,III,IV) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI?
15	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA BIOQUIMICO FARMACIA (I,II,III,IV,V) PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLCAPIRHUA Y CENTROS DE SALUD AMBULATORIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA?
16	CONTRATACION DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA MEDICO GENERAL (I,II,III,IV,V,VI,VII) PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLCAPIRHUA Y CENTROS DE SALUD AMBULATORIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA ( DOS VECES ANULADO)
17	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA MÉDICO PEDIATRA (I,II,III,IV) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI?
18	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA AUXILIAR EN ENFERMERIA AREA QUIROFANO (I,II,III,IV); AUXILIAR EN ENFERMERIA PROGRAMAS DE SALUD (I,II,III,IV); AUXILIAR EN ENFERMERIA AREA CONSULTA EXTERNA (I,II,III,IV,V) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI?
19	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA LICENCIADAS EN ENFERMERÍA (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII) PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLCAPIRHUA Y CENTROS DE SALUD AMBULATORIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA?
20	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA ODONTOLOGO (I,II,III,IV,V,VI) PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLCAPIRHUA Y CENTROS DE SALUD AMBULATORIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA Y BUS ODONTOLÓGICO?

21	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA AUXILIARES EN ENFERMERÍA (I,II,III,IV,V,VI), LICENCIADA EN FISIOTERAPIA, RADIOLOGO PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLCAPIRHUA Y CENTROS DE SALUD AMBULATORIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA?
22	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA BIOQUIMICO LABORATORIO (I,II,III) PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLCAPIRHUA Y CENTROS DE SALUD AMBULATORIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA? (DOS VECES ANULADO)
23	(SMFIDS-050-17) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EDUCADORAS (15) Y MANIPULADORAS DE ALIMENTOS (5) PARA LOS CINCO CENTROS INFANTILES (DOS VECES ANULADO)
24	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA MÉDICOS ESPECIALISTAS (MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO GINECOLOGO, MÉDICO ANESTESIOLOGO, MÉDICO ECOGRÁFO) PARA EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLCAPIRHUA Y CENTROS DE SALUD AMBULATORIOS DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA (DOS VECES ANULADO)
25	COMPRA DE CEMENTO IP-30, PARA CONST. AV. DORBIGNI DIST. B,C,D,
26	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA BIOQUIMICO DE FARMACIA (I,II,III,IV) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI? ( DOS VECES ANULADO)
27	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA BIOQUIMICO DE LABORATORIO (I,II,III,IV) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI?
28	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA MÉDICO GENERAL I, MÉDICO GENERAL SERVICIO TRANSFUSIONAL; ODONTOLOGO I; LICENCIADA EN FISIOTERAPIA I; TECNICO SUPERIOR RADIOLOGO (I,II) PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI? (DOS VECES ANULADO)
29	(SMFIDS-382-17) ?COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. PAV. CALLE CALA CRUZ OTB FERROVIARIO NORTE DIST. C?
30	Const. Muro de Contención Torrentera Rummy Mayu Lado Oeste OTB San Alfonso Dist. B (DOS VECES ANULADO)

### **APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (VIGENTES O EN CURSO)**

<b><u>Nº</u></b>	<b><u>DESCRIPCION DEL PROCESO DE CONTRATACION</u></b>
1	CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA MÉDICO CIRUJANO (I,II); MÉDICO ECOGRAFO I PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI?
2	(SMFIDS-423-17) COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO
3	(SMFIDS-516-17) COMPRA DE BOTAS Y ACCESORIOS PARA RESGUARDO Y PROTECCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
4	(SMFIDS-690-17) ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS, INSUMOS ODONTOLOGICOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LA LEY 475 (SIS) GESTIÓN 2017 DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA (HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI, CENTRO DE SALUD DE COLCAPIRHUA Y SUS TRES CENTROS DE SALUD)
5	(SMFIDS-716-17) COMPRA DE CEMENTO IP-30 PARA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO AVENIDA DE VÍAS OTB FABRIL CAPACACHI DISTRITO B
6	(SMFIDS-702-17) CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA AUXILIARES EN ENFERMERÍA (12,13,14,15,16) PARA EL "PROGRAMA MI SALUD"
7	(SMFIDS-760-17) ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE QUIROFANO Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI

### **DIRECTAS (HASTA Bs. 100,000.00)**

<b><u>Nº</u></b>	<b><u>OBJETO DE LA CONTRATACIÓN</u></b>
1	CONST. GARAJE E INGRESO SECUNDARIO U.E. PABLO CANO JESUS LARA
2	CONST. DRENAJE PLUVIAL OTB BLOQUES FLORIDA NORTE DIST.B
3	CONSTRUCCION BLOQUE INICIAL U.E. SAUSALITO
4	CONST. PAV. CALLE J. BAUTISTA OTBS SANTA ISABEL -MOROCOCALEA DIST. B
5	CONST. PAV. PASAJE INNOMINADO OTB SANTA ISABEL DIST. B
6	CONSTRUCCION PAV. CALLE 27 DE JULIO OTB MOROCOCALEA DIST. B

**MENORES (De Bs. 20,000.00 a Bs. 50,000.00)**

<b>Nº</b>	<b>OBJETO DE LA CONTRATACIÓN</b>
11	(SMFIDS-084-17) PROVISIÓN DE RIPIO (GRANULOMETRIA FINA) PARA LA OTB WILLCATACO Y OTB SAN JOSÉ DE KAMI
22	(SMFIDS-065-17) COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA EP-08
33	(SMFIDS-067-17) COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA V-06 PLACA 2328 HHY
44	(SMFIDS-097-17) INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA ENTRE EL EDIFICIO CENTRAL Y EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA (OBRA VENDIDA)
55	(SMFIDS-127-17) COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA
66	(SMFIDS-243-17) PROVISION DE RIPIO (GRANULOMETRIA FINA) PARA LA OTB CIELO MOCKO, OTB VILLA ROSEDAL, OTB WILLCATACO Y OTB COLLAPAMPA
77	(SMFIDS-180-17) MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA U.E. FERROVIARIA - MAX FERNANDEZ
88	(SMFIDS-183-17) MEJORAMIENTO DE BATERIA DE BAÑOS U.E. DANIEL SALAMANCA - 27 DE MAYO
99	(SMFIDS-234-17) COMPRA DE CEMENTO IP-30 PARA EL BACHEO CON PAVIMENTO RIGIDO EN LA INTERSECCION AV. CAP. V. USTARIZ Y AV. ELIAS MENCES OTB PIÑAMI SUD DIST. D
110	(SMFIDS-132-17) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA
111	(SMFIDS-248-17) COMPRA DE BOMBA DE ALTA PRESION PARA EL LAVADO DE VEHICULOS EN GENERAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
112	(SMFIDS-112-17) COMPRA DE EQUIPOS PARA REALIZAR CURSOS Y FERIA DE TRANSFORMACION DE LECHE Y SUS DERIVADOS
113	(SMFIDS-238-17) CONTRATACION DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT 2017 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
114	(SMFIDS-122-17) COMPRA DE ARENA, GRAVA Y GRAVILLA PARA CONST. PAV. F. DIEZ MEDINA OTB HOLANDA DIST. B
115	(SMFIDS-146-17) COMPRA DE TELA E INSUMOS PARA LA CONFECCION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA (BUZO, CHAMARRA, CORTO Y POLERA)
116	(SMFIDS-213-17) PROVISION DE RIPIO PARA LA OTB SUMUMPAYA CALAMINAS Y RIPIO (GRANULOMETRIA FINA) PARA LA OTB SUMUMPAYA CENTRAL GRANDE, OTB ESQUILAN GRANDE Y OTB ESQUILAN CHIJLLAWIRI
117	(SMFIDS-251-17) COMPRA DE LUBRICANTES PARA CAMBIOS DE ACEITE Y ENGRASADO A LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR
118	(SMFIDS-226-17) MANTENIMIENTO Y REPARACION U.E. PABLO CANO, JESUS LARA Y CEA LA FLORIDA
119	(SMFIDS-143-17) COMPRA DE ARENA, GRAVA Y GRAVILLA PARA CONST. PAV. CALLE LOS PARAISOS - PULACAYO OTB CALIFORNIA DIST. B
220	(SMFIDS-121-17) PROVISION DE RIPIO GRANULOMETRIA FINA PRA LA OTB MUNICIPAL, OTB CAPACACHI CENTRAL Y OTB SAUSALITO
221	(SMFIDS-464-17) COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER DE METAL MECANICA
222	(SMFIDS-383-17) COMPRA DE AGREGADOS (ARENA, GRAVA, GRAVILLA) PARA CONST. PAV. CALLE CALA CRUZ OTB FERROVIARIO NORTE DIST. C
223	(SMFIDS-324-17) COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA
224	(SMFIDS-322-17) PROVISION DE RIPIO Y RIPIO (GRANULOMETRIA FINA) PARA LAS OTBS: LIBERTADOR BOLIVAR, FERROVIARIO NORTE, ANDRES CUSCHIERI Y MOYAPAMPA DEL DISTRITO C
225	(SMFIDS-443-17) COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN GENERAL EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA
226	(SMFIDS-414-17) COMPRA DE ARENA, GRAVA, GRAVILLA PARA CONST. PAV. CALLE GARZAS OTB PIÑAMI SUD DIST. D
227	(SMFIDS-410-17) ADQUISICION DE REACTIVOS DE ANTICUAGULANTES PARA LABORATORIO Y EVITAR EL DESABASTECIMIENTO DE ESTOS EN LOS PACIENTES DE LA LEY 475 (SIS) EN LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA (HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI Y CENTROS DE SALUD COLCAPIRHUA)
228	(SMFIDS-283-17) COMPRA DE REFRIGERADORES PARA LOS CINCO CENTROS INFANTILES DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA
229	(SMFIDS-427-17) MANTENIMIENTO DE LA PISTA ATLETICA SAMANCHA URABI CON LADRILLO MOLIDO
330	(SMFIDS-244-17) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA U.E. SAN LORENZO - RAFAEL ARNAIZ

331	(SMFIDS-261-17) MANTENIMIENTO DE LA U.E. SAN JOSÉ DE KAMI
332	(SMFIDS-472-17) EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE CONTRATACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA GESTION 2015
333	(SMFIDS-413-17) COMPRA DE AGREGADOS (ARENA, GRAVA Y GRAVILLA) PARA CONST. PAV. CALLE LOS CEIBOS OTB LA PRADERA DIST. B
334	(SMFIDS-374-17) ADQUISICION DE SOLUCIONES PARA INTERNACIONES DE PACIENTES DE LA LEY 475 (SIS) EN LA RED MUNICIPAL DE SALUD COLCAPIRHUA (HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI Y CENTROS DE SALUD COLCAPIRHUA)
335	(SMFIDS-306-17) ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MENOR PARA EL SERVICIO DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI
336	(SMFIDS-307-17) MANTENIMIENTO DE BATERIAS DE BAÑOS UNIDAD EDUCATIVA DANIEL SALAMANCA - 27 DE MAYO
337	(SMFIDS-407-17) ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA - LEY 475 PARA LAS DIFERENTES AREAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI
338	(SMFIDS-366-17) PROVISION DE RIPIO (GRANULOMETRIA FINA) PARA LAS OTBS: COLLAPAMPAMPA DON BOSCO, LOS LIRIOS, WILLCATACO Y PROVISION DE RIPIO PARA LAS OTBS: LOS LIRIOS, SAN JOSE REDUCTO
339	(SMFIDS-312-17) COMPRA DE TONERS BROTHER Y TONER HP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO
440	(SMFIDS-411/17) MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI
441	(SMFIDS-397-17) COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES "PRESIDENTE EVO"
442	(SMFIDS-593-17) COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE 11 INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA
443	(SMFIDS-541-17) ADQUISICION DE HANDYS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA
444	(SMFIDS-512-17) COMPRA DE TELAS (KAKY Y FORRO BONGE) PARA CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
445	(SMFIDS-587-17) COMPRA DE EQUIPOS PARA LA PLANTA DE HORMIGON MUNICIPAL
446	(SMFIDS-509-17) PROVISION DE RIPIO PARA LAS OTBS: SUMUMPAYA CENTRAL GRANDE Y KENAMARI KULLCU: PROVISION DE RIPIO (GRANULOMETRIA FINA) PARA LAS OTBS: SUMUMPAYA CENTRAL GRANDE, SUMUNPAYA CALAMINAS, KENAMARI KULLCU, ESQUILAN GRANDE Y ESQUILAN CHIJLLAWIRI
447	(SMFIDS-594-17) COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE BATERIAS DE BAÑOS DE 11 INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA
448	CONSULTORIA POR PRODUCTO: ELABORACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO REDUCTO MOYAPAMPA DISTRITO A(ACTUALIZACION)
449	(SMFIDS-485-17) COMPRA DE CEMENTO IP-30 PARA CONST. PAV. CALLE BUENOS AIRES OTB SAN JOSE DE KAMI DIST. A
550	(SMFIDS-494-17) PROVISION DE RIPIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL DIST. D OTB CENTRAL COLCAPIRHUA
551	(SMFIDS-484-17) COMPRA DE AGREGADOS (ARENA, GRAVA, GRAVILLA) PARA CONST. PAV. CALLE BUENOS AIRES OTB SAN JOSE DE KAMI DIST. A
552	(SMFIDS-517-17) PROVISION DE GRANULOMETRIA FINA PARA LAS OTBS NUEVA JERUSALEN, OASYS Y HOLANDA DEL DISTRITO B Y PROVISION DE RIPIO (CASCOTE) PARA LA OTB SAN ALFONSO DISTRITO B
553	(SMFIDS-548-17) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
554	(SMFIDS-544-17) MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN PARTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA (PARTE DE LA CUBIERTA, BARANDA INTERIOR, BARANDA EXTERIOR, PINTURA INTERIOR VARIOS SECTORES, COLOCADO DE VENTANA DE ALUMINIO SECTOR GRADAS LADO ESTE, CORRECCIÓN DE VENTANAS POR FILTRACION DE AGUA Y REACONDICIONAMIENTO DE LOS SECTORES CORREGIDOS) OBRA VENDIDA.
555	(SMFIDS-688-17) PROVISION DE RIPIO (GRANULOMETRIA FINA) PARA LAS OTBS: SUMUNPAYA KULLCU, ESQUILAN GRANDE, SIND. AGRARIO ESQUILAN GRANDE, SUMUNPAYA SUD Y PROVISION DE RIPIO PARA LAS OTBS: ESQUILAN GRANDE, SIND. AGRARIO ESQUILAN GRANDE, ESQUILAN CHIJLLAWIRI
556	(SMFIDS-612-17) COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LA CAMPAÑA DE COBRO DE IMPUESTOS A LOS BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA GESTIÓN 2016
557	(SMFIDS-623-17) COMPRA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES DEL GAM COLCAPIRHUA
558	(SMFIDS-442-17) COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y LUMINARIAS PARA REALIZAR LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA OTB JUNTA VECINAL CALAMINA DEL DISTRITO D



559	(SMFIDS-611-17) COMPRA DE FILTROS PARA EL EQUIPO PESADO Y LIVIANO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
660	(SMFIDS-255-17) COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL DESARROLLO DE CLASES PROGRAMA DE POST ALFABETIZACION "YO SI PUEDO SEGUIR"
661	(SMFIDS-573-17) PROVISION DE MATERIAL GRANULAR CAPA SUB BASE Y CAPA BASE PARA LA CONFORMACION DE LA PLATAFORMA EN LA CALLE CAJIA DE LA VEGA EN LA OTB URBANIZACION LA PAZ DEL DISTRITO B

## **II.- SECRETARÍA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Lic. Fredy Vega Galarza  
SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

### **UNIDADES DEPENDIENTES**

#### **II.1. DIRECCIÓN DE FINANZAS**

##### II.1.1 Jefe de Ingresos

II.1.1.1 Responsable de Intendencia Municipal

II.1.1.2 Responsable de Matadero

##### II.1.2 Jefe de contabilidad

II.1.2.1 Activos fijos

II.1.2.2 RUAT

#### **II.2 JEFA MUNICIPAL DE SALUD**

## II.1.- DIRECCION DE FINANZAS

Lic. José Cardozo Guzmán  
DIRECTOR DE FINANZAS

DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD



G  
A  
M  
C  
GOBIERNO  
AUTÓNOMO  
MUNICIPAL  
OLCAPIRHUA


### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2017

(Expresado en Bolivianos)

FF - OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	PERCIBIDO	SALDO POR PERSIBIR	% AVANCE
20-210	Recursos Específicos / Recursos Específicos de las Municipalidades	22.000.000,00	7.661.973,35	14.338.026,65	34,83
41-111	Transferencias T.G.N. / Tesoro General de la Nación (Proyectos Upre)	22.336.955,05	5.438.289,52	16.898.665,53	24,35
41-111	Transferencias T.G.N. / Tesoro General de la Nación (Proyectos FPS)	0,00		0,00	0,00
41-113	Transferencias T.G.N. / Tesoro General de la Nación - Participación Popular	40.294.898,00	12.946.326,16	27.348.571,84	32,13
41-119	Transferencias T.G.N. / Tesoro General de la Nación - Impuesto Directo a los Hidrocarburos	8.237.425,00	1.992.921,09	6.244.503,91	24,19
41-120	Transferencias T.G.N. / T.G.N. - Impuesto a la Participación en Juegos	0,00		0,00	0,00
42-220	Transferencias de Recursos Específicos / Regalías (Gobierno Autonomo Departamental)	0,00		0,00	0,00
42-230	Transferencias de Recursos Específicos / Otros Recursos Específicos	150.000,00		150.000,00	0,00
43-314	Transferencias de Crédito Externo / Corporación Andina de Fomento	0,00		0,00	0,00
92-230	Préstamos de Recursos Específicos / Otros Recursos Específicos (FNDR)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB T O T A L E S</b>	<b>93.019.278,05</b>	<b>28.039.510,12</b>	<b>64.979.767,93</b>	<b>30,14</b>
	Saldo Caja Bancos para la gestion 2017	14.000.000	14.000.000		
	<b>T O T A L E S</b>	<b>107.019.278</b>	<b>42.039.510</b>	<b>64.979.768</b>	<b>39,28</b>

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

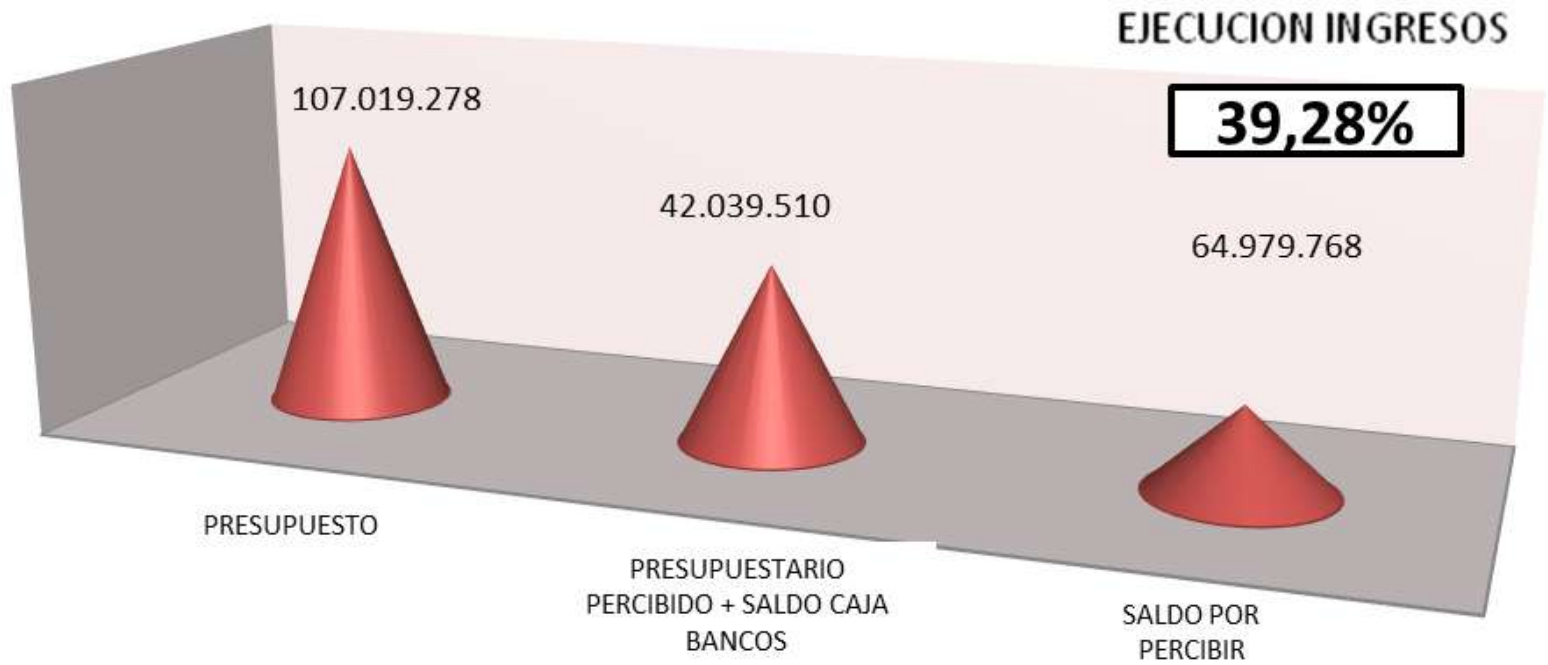

DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD							
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS							
Del 01 de Enero al 31 Mayo 2017							
(Expresado en Bolivianos)							
PROYECTO /ACTIVIDAD	DISTRITO	APERTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
Actividad	I	00 0000 001	FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	12.686.781,00	4.161.366,97	8.525.414,03	32,80
Actividad	I	01 0000 001	FUCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL	2.575.469,00	724.832,66	1.850.636,34	28,14
Actividad	I	10 0000 001	FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	147.423,00	76.483,48	70.939,52	51,88
1306005160000	A	10 0001 000	CONST. PERFORACION POZO PARA RIEGO OTB TARAMOCKO DIST. A	140.000,00	0	140.000,00	0,00
Actividad	I	11 0000 001	FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO BASICO DE COLCAPIRHUA	400.000,00	83.154,34	316.845,66	20,79
Actividad	I	11 0000 002	MANTENIMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO COLCAPIRHUA	400.000,00	18.507,00	381.493,00	4,63
Actividad	I	11 0000 003	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OTB SANTA ROSA CATAVI DIST.B	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306001190000	II	11 0001 000	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLCAPIRHUA	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0,00
1306002570000	D	11 0002 000	CONST. CANALIZACION DESAGUE PLUVIAL OTB PARAISO DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306004090000	C	11 0003 000	CONST. CANAL DESAGUE PLUVIAL SECTOR ADUANA DIST.C	203.000,00	59.769,67	143.230,33	29,44
1306005120000	B	11 0004 000	CONST. PERFORACION POZO DE AGUA OTB SANTA ROSA CENTRAL DIST. B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005130000	C	11 0005 000	AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE OTB SUMUNPAYA NORTE DIST. C	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005140000	E	11 0006 000	AMPL. ALCANTARILLADO OTB SUMUMPAYA SUD DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306005150000	E	11 0007 000	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE OTB SUMUMPAYA CENTRAL GRANDE DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306005110000	B	11 0008 000	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE OTB MARTIN CARDENAS DIST. B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005100000	A	11 0009 000	CONST. PERFORACION POZO DE AGUA OTB KANAUT DIST. A	140.000,00	0	140.000,00	0,00
C061940000000	II	11 0010 000	CONST. ESTACION ELEVADORA DESAGUE PLUVIAL COLCAPIRHUA	300.000,00	270.795,88	29.204,12	90,27



1306004870000	C	11 0011 000	CONST. CANALIZACION CALLE VILA VILA OTB SUMUMPAYA CENTRAL DIST. C	120.000,00	53.097,08	66.902,92	44,25
Actividad	I	12 0000 001	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO COLCAPIRHUA	80.000,00	0	80.000,00	0,00
Actividad	I	13 0000 001	MANTENIMIENTO ORNAMENTO EQUIP. DE PARQUES Y AREAS VERDES	380.000,00	171.635,62	208.364,38	45,17
Actividad	I	13 0000 002	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	170.000,00	22.739,76	147.260,24	13,38
Actividad	I	13 0000 003	FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL COLCAPIRHUA	120.000,00	0	120.000,00	0,00
Actividad	I	13 0000 004	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES Y AREAS VERDES	150.000,00	56.700,65	93.299,35	37,80
Actividad	I	13 0000 005	FUNCIONAMIENTO TALLER DE CERRAGERIA MUNICIPAL	100.000,00	61.568,74	38.431,26	61,57
1306001820000	II	13 0002 000	CONST. REVESTIMIENTO RIO PAMPA MAYU DIST. E FASE IV	500.000,00	0	500.000,00	0,00
Actividad	I	14 0000 001	LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA COLCAPIRHUA	550.000,00	132.833,88	417.166,12	24,15
Actividad	I	14 0000 002	MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO COLCAPIRHUA	450.000,00	143.460,00	306.540,00	31,88
Actividad	I	16 0000 001	FUNCIONAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUN. COLCAPIRHUA	300.000,00	108.174,47	191.825,53	36,06
Actividad	I	16 0000 002	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.A	100.000,00	96.383,00	3.617,00	96,38
Actividad	I	16 0000 003	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.B	80.000,00	0	80.000,00	0,00
Actividad	I	16 0000 004	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.C	80.000,00	0	80.000,00	0,00
Actividad	I	16 0000 005	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.D	80.000,00	0	80.000,00	0,00
Actividad	I	16 0000 006	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.E	100.000,00	94.493,00	5.507,00	94,49
Actividad	I	16 0000 007	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO OTB CAPACACHI NORTE DIST.A	50.000,00	0	50.000,00	0,00
Actividad	I	16 0000 008	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO OTB SUMUMPAYA NORTE DIST.C	30.000,00	0	30.000,00	0,00
Actividad	I	16 0000 009	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO OTB JUNTA VECINAL CALAMINA DIST.D	50.000,00	49.914,00	86,00	99,83
1306003370000	E	16 0001 000	AMPL. ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE FUTBOL ESQUILAN GRANDE COLCAPIRHUA DIST.E	120.000,00	0	120.000,00	0,00
Actividad	I	17 0000 001	EXPROPIACION DE TERRENO EDIFICIO MUNICIPAL	150.000,00	0	150.000,00	0,00
Actividad	I	17 0000 002	EXPROPIACION TERRENO AMPLIACION CEMENTERIO GENERAL COLCAPIRHUA	150.000,00	0	150.000,00	0,00
Actividad	I	17 0000 003	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL OTB SENAC DIST.C	30.000,00	0	30.000,00	0,00
Actividad	I	17 0000 004	EXPROPIACION TERRENO CAMPO DEPORTIVO SAN JOSE KAMI DIST.A	43.500,00	0	43.500,00	0,00

Actividad	I	17 0000 005	EXPROIACION TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUMUMPAYA DIST.E	156.000,00	0	156.000,00	0,00
1306005170000	II	17 0001 000	CONST. CASA DE CULTURA MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005180000	II	17 0002 000	CONST. PISCINA MUNICIPAL COLCAPIRHUA	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306004140000	II	17 0003 000	CONST. AV.DANIEL SALAMANCA DIST.A, D	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00
1306005740000	A	17 0004 000	CONST. PAV.AV. BOLIVIA DIST.A	700.000,00	0	700.000,00	0,00
1306005190000	A	17 0005 000	CONST. PAV. DON BOSCO OTB CALLAJCHULLPA DIST. A	200.000,00	0	200.000,00	0,00
1306004150000	II	17 0006 000	CONST. AV. DORBIGNI DIST. B,C,D	2.945.000,00	1.086.416,30	1.858.583,70	36,89
1306004190000	II	17 0007 000	CONST. PAV. FLEXIBLE AV. TOMAS OCONOR DIST.B,C	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00
1306005750000	B	17 0008 000	CONST. PAV. AV. FRANZ TAMAYO DIST. B	700.000,00	0	700.000,00	0,00
1306005210000	B	17 0009 000	CONST. PAV. AV. COMERCIO DIST. B	440.000,00	0	440.000,00	0,00
1306004210000	D	17 0010 000	CONST. PAVIMENTO AV. ANDINA OTB COLCAPIRHUA CENTRAL DIST.D	400.000,00	0	400.000,00	0,00
1306005220000	II	17 0011 000	CONST. PRADO CENTRAL AV. B. GALINDO REDUCTO MERCADO CENTRAL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	400.000,00	0	400.000,00	0,00
1306004240000	E	17 0012 000	CONST. PAV. RIGIDO AV.CALLE JAZMIN OTB ESQUILAN GRANDE DIST.E	824.000,00	122.984,48	701.015,52	14,93
1306005230000	A	17 0013 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB 23 DE MARZO DIST. A	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005240000	A	17 0014 000	CONST. EMPEDRADO CALLE EZEQUIEL OSORIO OTB CAPACACHI NORTE DIST. A	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005250000	A	17 0015 000	CONST. PAV. CALLE INTIRRAYMI DIST. A	260.000,00	0	260.000,00	0,00
1306005260000	A	17 0016 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB COLLAPAMPA DON BOSCO DIST. A	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005270000	A	17 0017 000	CONST. EMPEDRADO DE VIAS CALLE QURIKANCHA OTB VILLA ROSEDAL DIOS ES AMOR DIST. A	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005280000	A	17 0018 000	CONST. EMPEDRADO DE VIAS OTB COLLAPAMPA DIST. A	120.000,00	0	120.000,00	0,00
1306005290000	B	17 0019 000	CONST. PAV. F. DIEZ MEDINA OTB HOLANDA DIST. B	140.000,00	139.907,00	93,00	99,93
1306005300000	B	17 0020 000	CONST. PAV. DE VIAS LATERALES AV. B. GALINDO OTB HUANUNI DIST. B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005310000	B	17 0021 000	CONST. PAV. CALLE 27 DE JULIO OTB MOROCOCALA DIST. B	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005320000	B	17 0022 000	CONST. PAV. CALLE J. BAUTISTA OTBS SANTA ISABEL - MOROCOCALA DIST. B	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005330000	B	17 0023 000	CONST. PAV. CALLE LOS PARAISOS - PULACAYO OTB CALIFORNIA DIST. B	140.000,00	139.931,00	69,00	99,95

1306005350000	B	17 0024 000	CONST. PAV. AV.DE VIAS OTB FABRIL CAPACACHI DIST.B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005340000	B	17 0025 000	CONST. PAV. AV. 27 DE ABRIL OTB ELIZABETH SETON DIST.B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306002840000	B	17 0026 000	CONST. PAV. RIGIDO CALLE CARITAS OTB OASYS DIST. B	120.000,00	0	120.000,00	0,00
1306005000000	B	17 0027 000	CONST. PLAZA DEL EDEN OTB NUEVA JERUSALEN DIST. B	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005390000	B	17 0028 000	CONST. PAV. CALLE LOS CEIBOS OTB LA PRADERA DIST. B	140.000,00	139.150,00	850,00	99,39
1306005400000	B	17 0029 000	CONST. PAV. PASAJE INNOMINADO OTB SANTA ISABEL DIST. B	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005410000	C	17 0030 000	CONST.PAV. CALLE VILOMA OTB LIBERTADOR BOLIVAR DIS.C	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306004200000	C	17 0031 000	CONST. PAVIMENTO AV. ANDINA OTB MOYAPAMPA DIST.C	240.000,00	14.195,00	225.805,00	5,91
1306005420000	C	17 0032 000	CONST. PAV. CALLE TUPIZA OTB RONNY ROJAS DIST. C	120.000,00	0	120.000,00	0,00
1306005430000	C	17 0033 000	CONST. PAV. CALLE RICARDO MUJICA OTB SAN FRANCISCO DIST. C	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005440000	C	17 0034 000	CONST. PARQUE INFANTIL OTB SAN FRANCISCO DIST. C	40.000,00	0	40.000,00	0,00
1306005450000	C	17 0035 000	CONST. PAV. VIAS LATERALES AV. BLANCO GALINDO OTB SUMUMPAYA CENTRAL DIST. C	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005460000	C	17 0036 000	CONST. PAV. CALLE CALA CRUZ OTB FERROVIARIO NORTE DIST. C	140.000,00	134.346,00	5.654,00	95,96
1306003030000	C	17 0037 000	CONST. PAV. RIGIDO CALLE PULACAYO OTB FERROVIARIO SUD DIST. C	140.000,00	0	140.000,00	0,00
C060012300000	D	17 0038 000	CONST. C. DE CAP. SOCIAL PROD. OTB 21 DE SEPTIEMBRE DIST. D FASE II	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005470000	D	17 0039 000	CONST. PARQUE INFANTIL LORONCOCHA OTB COLCAPIRHUA CENTRAL DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005480000	D	17 0040 000	CONST. PAV. LATERAL COMPLEJO DEPORTIVO SAMANCHA URABI OTB COLCAPIRHUA SUD DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005490000	D	17 0041 000	CONST. PAV. CALLE GARZAS OTB PIÑAMI SUD DIST. D	130.000,00	44.540,00	85.460,00	34,26
1306005500000	D	17 0042 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB SAN LORENZO DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005510000	D	17 0043 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB SAN SILVESTRE DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005520000	E	17 0044 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB ESQUILAN CHIJLLAWIRI DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306004390000	E	17 0045 000	CONST. PAV. RIGIDO AV. ANGULO OTB SUMUMPAYA CHICO DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306004740000	E	17 0047 000	CONST. PAV. RIGIDOE CALLE VIOLETAS OTB SUMUMPAYA CALAMINAS DIST.E	100.000,00	0	100.000,00	0,00

1306005530000	E	17 0048 000	CONST. EMPEDRADO DE VIAS OTB KENAMARI KULLCU DIST E.	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306003670000	II	17 0049 000	CONST. PLANTA DE ORMIGON MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	100.000,00	99.998,45	1,55	100,00
1306004840000	II	17 0050 000	AMPL. EDIFICIO MUNICIPAL COLCAPIRHUA	146.000,00	0	146.000,00	0,00
1306004950000	II	17 0051 000	CONST. CENTRO DE ACOGIDA DE LA MUJER MUNICIPIO COLCAPIRHUA	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306195340000	A	17 0052 000	CONST. PAV. CALLE BUENOS AIRES OTB SAN JOSE DE KAMI DIST. A	92.000,00	86.829,00	5.171,00	94,38
1306004700000	E	17 0053 000	CONST. PAV. RIGIDO CALLE SUCRE OTB SIND. AGRARIO ESQUILAN GRANDE DIST. E	26.500,00	0	26.500,00	0,00
C061946000000	II	17 0100 000	CONST. MERCADO CAMPESINO COLCAPIRHUA	557.647,21	0	557.647,21	0,00
Actividad	A	18 0000 001	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.A	200.000,00	168.608,15	31.391,85	84,30
Actividad	B	18 0000 002	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.B	120.000,00	103.319,90	16.680,10	86,10
Actividad	C	18 0000 003	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.C	120.000,00	110.959,44	9.040,56	92,47
Actividad	D	18 0000 004	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.D	120.000,00	119.753,00	247,00	99,79
Actividad	E	18 0000 005	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.E	200.000,00	133.503,43	66.496,57	66,75
Actividad	I	18 0000 006	CONFORMACION DE PLATAFORMA MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	200.000,00	49.788,30	150.211,70	24,89
Actividad	I	18 0000 007	MTTO. Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	200.000,00	35.100,00	164.900,00	17,55
1306004400000	E	18 0090 000	CONST. PUENTE VEHICULAR OTB SUMUMPAYA KULLCU DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
Actividad	I	20 0000 001	FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO EN ACTIVIDADES DE SALUD	2.300.000,00	550.561,98	1.749.438,02	23,94
Actividad	I	20 0000 002	PROGRAMA ITS VIH-SIDA	50.000,00	0	50.000,00	0,00
Actividad	I	20 0000 003	CAPACITACION Y MANEJO DEL PROGRAMA CHAGAS-SEDES	40.000,00	5.238,80	34.761,20	13,10
Actividad	I	20 0000 004	SERVICIOS PROFESIONALES UNIVERSIDADES Y OTROS	150.000,00	7.849,48	142.150,52	5,23
Actividad	I	20 0000 005	EQUIPAMIENTO Y CAP. CENTRO DE SALUD Y POSTAS COLCAPIRHUA	200.000,00	4.000,00	196.000,00	2,00
Actividad	I	20 0000 006	PROGRAMA DESNUTRICION CERO	250.000,00	0	250.000,00	0,00
Actividad	I	20 0000 007	BOQUITA SANA JURISDICCION COLCAPIRHUA	200.000,00	0	200.000,00	0,00
Actividad	I	20 0000 008	MANTENIMIENTO Y REFACCION INFRAESTRUCTURA DE SALUD	100.000,00	42.293,71	57.706,29	42,29
Actividad	I	20 0000 009	ACTIVIDAD DE ZOONOSIS	200.000,00	97.289,07	102.710,93	48,64
Actividad	I	20 0000 010	APOYO PROGRAMA MI SALUD	400.000,00	0	400.000,00	0,00
Actividad	I	20 0000 011	FUNCIONAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI	3.856.498,00	1.012.586,60	2.843.911,40	26,26




Actividad	I	20 0000 012	EQUIPAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI	500.000,00	12.753,80	487.246,20	2,55
Actividad	I	20 0000 013	MANTENIMIENTO Y REFACCION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI	200.000,00	39.309,04	160.690,96	19,65
Actividad	I	20 0000 099	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL (LEY 475)	6.245.709,00	204.250,60	6.041.458,40	3,27
C061900500000	II	20 0001 000	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL CAPACACHI FASE II	800.000,00	0	800.000,00	0,00
1306004860000	II	20 0002 000	AMPL. CENTRO DE SALUD KAMI	810.000,00	571.397,30	238.602,70	70,54
Actividad	I	21 0000 001	FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	1.000.000,00	352.854,77	647.145,23	35,29
Actividad	I	21 0000 002	MTTO. Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUN. COLCAPIRHUA	350.000,00	177.687,88	172.312,12	50,77
Actividad	I	21 0000 003	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	480.000,00	83.210,00	396.790,00	17,34
Actividad	I	21 0000 004	DESAYUNO ESCOLAR GESTION 2017 MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	5.300.000,00	1.251.042,88	4.048.957,12	23,60
Actividad	I	21 0000 005	PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO"	80.000,00	39.882,60	40.117,40	49,85
Actividad	I	21 0000 006	IMPLEMENTACION BACHILLERATO TECNICO HUMANISTICO DIST. EDUCATIVO COLCAPIRHUA	20.000,00	0	20.000,00	0,00
Actividad	I	21 0000 007	MEJORAMIENTO BATERIA DE BAÑOS UNIDADES EDUCATIVAS COLCAPIRHUA	360.000,00	33.633,00	326.367,00	9,34
1306004430000	E	21 0001 000	CONST. TECNOLOGICO SAN ISIDRO OTB ESQUILAN DIST.E	250.000,00	0	250.000,00	0,00
1306004470000	II	21 0002 000	CONST. BLOQUE INICIAL U.E. SAUSALITO	170.000,00	99.843,38	70.156,62	58,73
1306005570000	II	21 0003 000	CONST. CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL GENOVEVA RIOS DIST. C	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005360000	II	21 0004 000	CONST. CUBIERTA GRADERIAS TARIMA U.E. SAGRADA FAMILIA ANDRES CUSHIERI	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005370000	II	21 0005 000	CONST. BLOQUE DE LABORATORIO Y TALLERES U.E. SIMON BOLIVAR	200.000,00	0	200.000,00	0,00
1306003290000	II	21 0006 000	CONST. SALON MULTIPLE U.E. DANIEL SALAMANCA - 27 DE MAYO	200.000,00	0	200.000,00	0,00
1306004480000	II	21 0007 000	CONST. BLOQUE NUEVO 6 AULAS U.E. SAN SAN LORENZO - RAFAEL ARNAIZ	200.000,00	0	200.000,00	0,00
C061941900000	II	21 0008 000	CONST. DE AULAS BLOQUE DE AULAS BLOQUE NUEVO U.E. MAX FERNANDEZ-FERROVIARIO	150.000,00	131.997,63	18.002,37	88,00
1306005380000	II	21 0009 000	CONST. BLOQUE DE TALLERES Y AULAS U.E. MAX FERNANDEZ FERROVIARIO	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005580000	II	21 0010 000	CONST. GARAJE E INGRESO SECUNDARIO U.E. PABLO CANO JESUS LARA	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
1306005590000	II	21 0011 000	CONST. TINGLADO PATIO CENTRAL U.E. NUESTRA SRA. DE LA PAZ	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306005600000	II	21 0012 000	CONST. U.E. BENEDICTO DURAN	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005610000	II	21 0013 000	CONST. TINGLADO PATIO CENTRAL Y NIVEL INICIAL U.E. BENEDICTO DURAN	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306004450000	II	21 0014 000	CONST. NIVEL INICIAL U.E. SAN JOSE DE KAMI - MARISCAL SUCRE	250.000,00	145.139,46	104.860,54	58,06

1306005620000	II	21 0015 000	CONST. PROSCENIO CANCHA MULTIPLE U.E. DON BOSCO	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005630000	II	21 0016 000	CONST. POZO DE AGUA POTABLERI UE SAGRADA FAMILIA-ANDRES CUSCHIE	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005640000	II	21 0017 000	CONST. POZO DE AGUA POTABLE UE PABLO CANO	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005650000	II	21 0018 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA SAN CRISPIN DIST.E	400.000,00	0	400.000,00	0,00
1306004890000	II	21 0097 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA MODELO COLCAPIRHUA	5.677.844,10	0	5.677.844,10	0,00
1306004900000	II	21 0098 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA MODELO CARLOS VILLEGAS	5.792.840,87	1.865.022,82	3.927.818,05	32,20
1306004910000	II	21 0099 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA MODELO SAN MIGUEL	5.811.580,06	753.636,94	5.057.943,12	12,97
1306004820000	II	21 0100 000	CONST. BLOQUE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO U.E. 15 DE ABRIL	1.600.000,00	1.599.999,69	0,31	100,00
Actividad	I	22 0000 001	PROMOCION FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE JURISDICCION CALCAPIRHUA	382.284,00	106.710,33	275.573,67	27,91
Actividad	I	22 0000 002	ESCUELA DE DEPORTE MUNICIPAL COLCAPIRHUA	200.000,00	9.860,00	190.140,00	4,93
Actividad	I	22 0000 003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	200.000,00	131.036,12	68.963,88	65,52
Actividad	I	22 0000 004	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (ATLETISMO, GIMNASIA,HALTEROFILIA) COLCAPIRHUA	100.000,00	6.240,00	93.760,00	6,24
Actividad	I	22 0000 005	EQUIPAMIENTO DICIPLINAS DEPORTIVAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	150.000,00	0	150.000,00	0,00
Actividad	I	22 0000 006	APOYO JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES	150.000,00	117.488,65	32.511,35	78,33
C061939900000	II	22 0001 000	CONST. COLISEO MUNICIPAL SAMANCHA URABI MUNICIPIO COLCAPIRHUA FASE III	500.000,00	0	500.000,00	0,00
1306005660000	A	22 0002 000	CONST. CANCHA MULTIPLE OTB CUATRO ESQUINAS DIST.A	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005670000	A	22 0003 000	CONST. CANCHA MULTIPLE LOS LIRIOS OTB WILLCATACO DIST.A	80.000,00	0	80.000,00	0,00
1306005680000	B	22 0004 000	CONST. CANCHA MULTIPLE OTB FLORIDA SUD DIST.B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005690000	C	22 0005 000	CONST. TEPEADO CANCHA FUTBOL OTB CANADA DIST.C	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005700000	D	22 0006 000	CONST. TINGLADO CANCHA MULTIPLE OTB GENERAL PANDO DIST.D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005710000	E	22 0007 000	CONST. TINGLADO CANCHA MULTIPLE OTB SINDICATO AGRARIO DIST.E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
C061946200000	II	22 0100 000	CONST. CUBIERTA CANCHA MULTIPLE KAMI	17.663,70	0	17.663,70	0,00
1306004830000	II	22 0101 000	CONST. CAMPO DEPORTIVO GRADERIAS SAN JOSE KAMI	2.879.379,11	1.248.069,63	1.631.309,48	43,35
Actividad	I	23 0000 001	FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES	180.000,00	101.052,04	78.947,96	56,14
Actividad	I	23 0000 002	FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS	30.000,00	0	30.000,00	0,00
Actividad	I	23 0000 003	FOMENTO A LA ACTIVIDAD CULTURAL SAN LORENZO	100.000,00	0	100.000,00	0,00
Actividad	I	24 0000 001	FORTALECIMIENTO A LA VOCACION TURISTICA	50.000,00	8.857,40	41.142,60	17,71
Actividad	I	25 0000 001	FUNCIONAMIENTO SLIMS	150.000,00	36.916,00	113.084,00	24,61
Actividad	I	25 0000 002	APOYO A LA PROMOCION DE GENERO	100.000,00	0	100.000,00	0,00

Actividad	I	25 0000 003	SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) - IDH D.S.2145	43.587,00	0	43.587,00	0,00
Actividad	I	26 0000 001	ACTIVIDAD Y DEFENSORIA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	150.000,00	52.841,64	97.158,36	35,23
Actividad	I	26 0000 002	PROYECTO ATENCION NIÑA, NIÑO (U.A.I.N.A)	300.000,00	113.006,70	186.993,30	37,67
Actividad	I	26 0000 003	BRIGADA DE PROTECCION A LA FAMILIA (FELCV)	30.000,00	1.509,90	28.490,10	5,03
Actividad	I	26 0000 004	ACTIVIDAD Y CENTRO DEL ADULTO MAYOR	70.000,00	17.706,60	52.293,40	25,30
Actividad	I	26 0000 005	PRAGRAMA DE PROMOCION DE DERECHOS Y CENTRO DEL DISCAPASITADO	70.000,00	3.968,03	66.031,97	5,67
Actividad	I	27 0000 001	FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1.700.000,00	756.197,64	943.802,36	44,48
Actividad	I	27 0000 002	ACTIVIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	100.000,00	6.115,00	93.885,00	6,12
Actividad	I	27 0000 003	FUNCIONAMIENTO PLANTA MOVIL Y FIJA DE HORMIGON MUNICIPIO COLCAPIRHUA	300.000,00	141.965,94	158.034,06	47,32
Actividad	I	28 0000 001	FUNCIONAMIENTO CONTROL MERCADO CENTRAL DE FERIAS COLCAPIRHUA	200.000,00	69.425,23	130.574,77	34,71
Actividad	I	28 0000 002	MANTENIMIENTO MERCADOS COLCAPIRHUA	150.000,00	0	150.000,00	0,00
Actividad	I	29 0000 001	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO MATADERO MUNICIPAL	350.000,00	83.712,57	266.287,43	23,92
Actividad	I	30 0000 001	SERVICIO Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL	100.000,00	2.105,60	97.894,40	2,11
Actividad	I	31 0000 001	DESASTRES NATURALES	100.000,00	21.200,00	78.800,00	21,20
Actividad	I	31 0000 002	DRAGADO DE TORRENTERAS MUNICIPIO COLCAPIRHUA	200.000,00	18.907,00	181.093,00	9,45
Actividad	I	31 0000 003	LIMPIEZA DE CANALES Y DESBROCE DE TORRENTERAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	200.000,00	35.100,00	164.900,00	17,55
1306005720000	B	31 0001 000	CONST. DRENAJE PLUVIAL OTB BLOQUES FLORIDA NORTE DIST. B	80.000,00	0	80.000,00	0,00
1306004550000	B	31 0002 000	CONST. MURO DE CONTENCION TORRENTERA RUMY MAYU LADO OESTE OTB SAN ALFONSO DIST. B	140.000,00	100.000,00	40.000,00	71,43
1306005730000	C	31 0003 000	CONST. CANALIZACION DESAGUE PLUVIAL CALLE BENI OTB JAZMIN DIST.C	100.000,00	0	100.000,00	0,00
Actividad	I	33 0000 001	APOYO SEGURIDAD CUIDADANA COLCAPIRHUA	500.000,00	113.552,84	386.447,16	22,71
Actividad	I	33 0000 002	MANTENIMIENTO DE MODULOS POLICIALES	100.000,00	16.746,95	83.253,05	16,75
Actividad	I	33 0000 003	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	100.000,00	0	100.000,00	0,00
Actividad	I	33 0000 004	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CUIDADANA	350.000,00	0	350.000,00	0,00
Actividad	I	33 0000 005	SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION VIAL	150.000,00	0	150.000,00	0,00
Actividad	I	34 0000 001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.775.077,00	774.206,99	1.000.870,01	43,62
Actividad	I	34 0000 002	EQUIPAMIENTO ALCALDIA DE COLCAPIRHUA	350.000,00	134.805,00	215.195,00	38,52
Actividad	I	34 0000 003	MANTENIMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES	100.000,00	73.026,86	26.973,14	73,03
Actividad	I	34 0000 004	SANEAMIENTO LEGAL DE ACTIVOS FIJOS Y PROCESOS JUDICIALES	90.000,00	18.173,67	71.826,33	20,19
Actividad	I	34 0000 005	ACTIVIDAD Y DEFENSA DE LOS LIMITES DE COLCAPIRHUA	100.000,00	8.346,60	91.653,40	8,35
Actividad	I	34 0000 006	ACTIVIDAD UNIDAD DE TRANSPARENCIA	50.000,00	24.647,00	25.353,00	49,29
Actividad	I	34 0000 007	REFERENDUM APROBACION DE CARTAS ORGANICAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	200.000,00	0	200.000,00	0,00

Actividad	I	34 0000 008	DEFENSA DE LIMITES MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	100.000,00	0	100.000,00	0,00
Actividad	I	34 0000 009	RECATASTRACION DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	100.000,00	0	100.000,00	0,00
Actividad	I	34 0000 010	COMUNICACION Y DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES	100.000,00	3.500,00	96.500,00	3,50
Actividad	I	34 0000 011	EVALUACION TECNICA AL COLISEO SAMANCHA URABI	30.000,00	0	30.000,00	0,00
Actividad	I	34 0000 099	FONDO CONTROL SOCIAL	50.000,00	0	50.000,00	0,00
Actividad	I	97 0000 001	PARTIDAS NO SIGNABLES A PROGRAMAS	2.078.375,00	0	2.078.375,00	0,00
Actividad	I	97 0000 002	PROMOCION Y APOYO DE POLITICAS DE GESTION MUNICIPAL	31.000,00	0	31.000,00	0,00
Actividad	I	97 0000 003	PREVISIONES PARA OTROS BENEFICIOS SOCIALES	100.000,00	0	100.000,00	0,00
Actividad	I	97 0000 006	CONST. DE INFRAESTRUCTURA MULTIMODAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE CON PROBLEMAS DE DROGODEPENDENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	693.000,00	0	693.000,00	0,00
Actividad	I	97 0000 008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO REDUCTO-MOYAPAMPA (COLCAPIRHUA) FPS	292.577,00	0	292.577,00	0,00
Actividad	I	98 0000 001	RENTA DIGNIDAD	1.868.005,00	452.173,24	1.415.831,76	24,21
Actividad	I	98 0000 002	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICA PATRIOTICO	12.453,00	3.014,49	9.438,51	24,21
Actividad	I	98 0000 090	FINANCIAMIENTO SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL	161.179,00	40.333,82	120.845,18	25,02
Actividad	I	99 0000 001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - FUNCIONAMIENTO	540.000,00	0	540.000,00	0,00
Actividad	I	99 0000 002	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - INVERSION	1.626.906,00	392.289,02	1.234.616,98	24,11
		Total Entidad		107.019.278,05	23.491.529,58	83.527.748,47	21,95

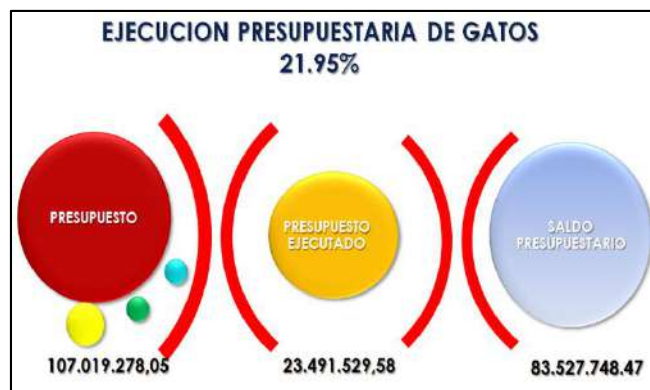


DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD						
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS						
Del 01 de Enero al 31 Mayo 2017						
(Expresado en Bolivianos)						
PROYECTO /ACTIVIDAD	APERTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO	AVANCE FINANCIERO
ACTIVIDAD	00 0000 001	FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	12.686.781,00	4.161.366,97	8.525.414,03	32,80
ACTIVIDAD	01 0000 001	FUCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL	2.575.469,00	724.832,66	1.850.636,34	28,14
ACTIVIDAD	10 0000 001	FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	147.423,00	76.483,48	70.939,52	51,88
ACTIVIDAD	11 0000 001	FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO BASICO DE COLCAPIRHUA	400.000,00	83.154,34	316.845,66	20,79
ACTIVIDAD	11 0000 002	MANTENIMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO COLCAPIRHUA	400.000,00	18.507,00	381.493,00	4,63
ACTIVIDAD	11 0000 003	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OTB SANTA ROSA CATAVI DIST.B	100.000,00	0	100.000,00	0,00
ACTIVIDAD	12 0000 001	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO COLCAPIRHUA	80.000,00	0	80.000,00	0,00
ACTIVIDAD	13 0000 001	MANTENIMIENTO ORNAMENTO EQUIP. DE PARQUES Y AREAS VERDES	380.000,00	171.635,62	208.364,38	45,17
ACTIVIDAD	13 0000 002	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	170.000,00	22.739,76	147.260,24	13,38
ACTIVIDAD	13 0000 003	FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL COLCAPIRHUA	120.000,00	0	120.000,00	0,00
ACTIVIDAD	13 0000 004	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES Y AREAS VERDES	150.000,00	56.700,65	93.299,35	37,80
ACTIVIDAD	13 0000 005	FUNCIONAMIENTO TALLER DE CERRAGERIA MUNICIPAL	100.000,00	61.568,74	38.431,26	61,57
ACTIVIDAD	14 0000 001	LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA COLCAPIRHUA	550.000,00	132.833,88	417.166,12	24,15
ACTIVIDAD	14 0000 002	MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO COLCAPIRHUA	450.000,00	143.460,00	306.540,00	31,88
ACTIVIDAD	16 0000 001	FUNCIONAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUN. COLCAPIRHUA	300.000,00	108.174,47	191.825,53	36,06
ACTIVIDAD	16 0000 002	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.A	100.000,00	96.383,00	3.617,00	96,38
ACTIVIDAD	16 0000 003	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.B	80.000,00	0	80.000,00	0,00
ACTIVIDAD	16 0000 004	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.C	80.000,00	0	80.000,00	0,00
ACTIVIDAD	16 0000 005	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.D	80.000,00	0	80.000,00	0,00
ACTIVIDAD	16 0000 006	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.E	100.000,00	94.493,00	5.507,00	94,49
ACTIVIDAD	16 0000 007	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO OTB CAPACACHI NORTE DIST.A	50.000,00	0	50.000,00	0,00
ACTIVIDAD	16 0000 008	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO OTB SUMUMPAYA NORTE DIST.C	30.000,00	0	30.000,00	0,00
ACTIVIDAD	16 0000 009	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO OTB JUNTA VECINAL CALAMINA DIST.D	50.000,00	49.914,00	86,00	99,83
ACTIVIDAD	17 0000 001	EXPROIACION DE TERRENO EDIFICIO MUNICIPAL	150.000,00	0	150.000,00	0,00
ACTIVIDAD	17 0000 002	EXPROIACION TERRENO AMPLIACION CEMENTERIO GENERAL COLCAPIRHUA	150.000,00	0	150.000,00	0,00
ACTIVIDAD	17 0000 003	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL OTB SENAC DIST.C	30.000,00	0	30.000,00	0,00
ACTIVIDAD	17 0000 004	EXPROIACION TERRENO CAMPO DEPORTIVO SAN JOSE KAMI DIST.A	43.500,00	0	43.500,00	0,00



ACTIVIDAD	17 0000 005	EXPROPIACION TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUMUMPAYA DIST.E	156.000,00	0	156.000,00	0,00
ACTIVIDAD	18 0000 001	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.A	200.000,00	168.608,15	31.391,85	84,30
ACTIVIDAD	18 0000 002	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.B	120.000,00	103.319,90	16.680,10	86,10
ACTIVIDAD	18 0000 003	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.C	120.000,00	110.959,44	9.040,56	92,47
ACTIVIDAD	18 0000 004	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.D	120.000,00	119.753,00	247,00	99,79
ACTIVIDAD	18 0000 005	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.E	200.000,00	133.503,43	66.496,57	66,75
ACTIVIDAD	18 0000 006	CONFORMACION DE PLATAFORMA MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	200.000,00	49.788,30	150.211,70	24,89
ACTIVIDAD	18 0000 007	MTTO. Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	200.000,00	35.100,00	164.900,00	17,55
ACTIVIDAD	20 0000 001	FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO EN ACTIVIDADES DE SALUD	2.300.000,00	550.561,98	1.749.438,02	23,94
ACTIVIDAD	20 0000 002	PROGRAMA ITS VIH-SIDA	50.000,00	0	50.000,00	0,00
ACTIVIDAD	20 0000 003	CAPACITACION Y MANEJO DEL PROGRAMA CHAGAS-SEDES	40.000,00	5.238,80	34.761,20	13,10
ACTIVIDAD	20 0000 004	SERVICIOS PROFESIONALES UNIVERSIDADES Y OTROS	150.000,00	7.849,48	142.150,52	5,23
ACTIVIDAD	20 0000 005	EQUIPAMIENTO Y CAP. CENTRO DE SALUD Y POSTAS COLCAPIRHUA	200.000,00	4.000,00	196.000,00	2,00
ACTIVIDAD	20 0000 006	PROGRAMA DESNUTRICION CERO	250.000,00	0	250.000,00	0,00
ACTIVIDAD	20 0000 007	BOQUITA SANA JURISDICCION COLCAPIRHUA	200.000,00	0	200.000,00	0,00
ACTIVIDAD	20 0000 008	MANTENIMIENTO Y REFACCION INFRAESTRUCTURA DE SALUD	100.000,00	42.293,71	57.706,29	42,29
ACTIVIDAD	20 0000 009	ACTIVIDAD DE ZONOSIS	200.000,00	97.289,07	102.710,93	48,64
ACTIVIDAD	20 0000 010	APOYO PROGRAMA MI SALUD	400.000,00	0	400.000,00	0,00
ACTIVIDAD	20 0000 011	FUNCIONAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI	3.856.498,00	1.012.586,60	2.843.911,40	26,26
ACTIVIDAD	20 0000 012	EQUIPAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI	500.000,00	12.753,80	487.246,20	2,55
ACTIVIDAD	20 0000 013	MANTENIMIENTO Y REFACCION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI	200.000,00	39.309,04	160.690,96	19,65
ACTIVIDAD	20 0000 099	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL (LEY 475)	6.245.709,00	204.250,60	6.041.458,40	3,27
ACTIVIDAD	21 0000 001	FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	1.000.000,00	352.854,77	647.145,23	35,29
ACTIVIDAD	21 0000 002	MTTO. Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUN. COLCAPIRHUA	350.000,00	177.687,88	172.312,12	50,77
ACTIVIDAD	21 0000 003	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	480.000,00	83.210,00	396.790,00	17,34
ACTIVIDAD	21 0000 004	DESAYUNO ESCOLAR GESTION 2017 MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	5.300.000,00	1.251.042,88	4.048.957,12	23,60
ACTIVIDAD	21 0000 005	PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO"	80.000,00	39.882,60	40.117,40	49,85
ACTIVIDAD	21 0000 006	IMPLEMENTACION BACHILLERATO TECNICO HUMANISTICO DIST. EDUCATIVO COLCAPIRHUA	20.000,00	0	20.000,00	0,00
ACTIVIDAD	21 0000 007	MEJORAMIENTO BATERIA DE BAÑOS UNIDADES EDUCATIVAS COLCAPIRHUA	360.000,00	33.633,00	326.367,00	9,34
ACTIVIDAD	22 0000 001	PROMOCION FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE JURISDICCION CALCAPIRHUA	382.284,00	106.710,33	275.573,67	27,91
ACTIVIDAD	22 0000 002	ESCUELA DE DEPORTE MUNICIPAL COLCAPIRHUA	200.000,00	9.860,00	190.140,00	4,93
ACTIVIDAD	22 0000 003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	200.000,00	131.036,12	68.963,88	65,52
ACTIVIDAD	22 0000 004	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (ATLETISMO, GIMNASIA,HALTEROFILIA) COLCAPIRHUA	100.000,00	6.240,00	93.760,00	6,24
ACTIVIDAD	22 0000 005	EQUIPAMIENTO DICIPLINAS DEPORTIVAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	150.000,00	0	150.000,00	0,00
ACTIVIDAD	22 0000 006	APOYO JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES	150.000,00	117.488,65	32.511,35	78,33
ACTIVIDAD	23 0000 001	FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES	180.000,00	101.052,04	78.947,96	56,14
ACTIVIDAD	23 0000 002	FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS	30.000,00	0	30.000,00	0,00
ACTIVIDAD	23 0000 003	FOMENTO A LA ACTIVIDAD CULTURAL SAN LORENZO	100.000,00	0	100.000,00	0,00

ACTIVIDAD	24 0000 001	FORTALECIMIENTO A LA VOCACION TURISTICA	50.000,00	8.857,40	41.142,60	17,71
ACTIVIDAD	25 0000 001	FUNCIONAMIENTO SLIMS	150.000,00	36.916,00	113.084,00	24,61
ACTIVIDAD	25 0000 002	APOYO A LA PROMOCION DE GENERO	100.000,00	0	100.000,00	0,00
ACTIVIDAD	25 0000 003	SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) - IDH D.S.2145	43.587,00	0	43.587,00	0,00
ACTIVIDAD	26 0000 001	ACTIVIDAD Y DEFENSORIA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	150.000,00	52.841,64	97.158,36	35,23
ACTIVIDAD	26 0000 002	PROYECTO ATENCION NIÑA, NIÑO (U.A.I.N.A)	300.000,00	113.006,70	186.993,30	37,67
ACTIVIDAD	26 0000 003	BRIGADA DE PROTECCION A LA FAMILIA (FELCV)	30.000,00	1.509,90	28.490,10	5,03
ACTIVIDAD	26 0000 004	ACTIVIDAD Y CENTRO DEL ADULTO MAYOR	70.000,00	17.706,60	52.293,40	25,30
ACTIVIDAD	26 0000 005	PRAGRAMA DE PROMOCION DE DERECHOS Y CENTRO DEL DISCAPASITADO	70.000,00	3.968,03	66.031,97	5,67
ACTIVIDAD	27 0000 001	FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1.700.000,00	756.197,64	943.802,36	44,48
ACTIVIDAD	27 0000 002	ACTIVIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	100.000,00	6.115,00	93.885,00	6,12
ACTIVIDAD	27 0000 003	FUNCIONAMIENTO PLANTA MOVIL Y FIJA DE HORMIGON MUNICIPIO COLCAPIRHUA	300.000,00	141.965,94	158.034,06	47,32
ACTIVIDAD	28 0000 001	FUNCIONAMIENTO CONTROL MERCADO CENTRAL DE FERIAS COLCAPIRHUA	200.000,00	69.425,23	130.574,77	34,71
ACTIVIDAD	28 0000 002	MANTENIMIENTO MERCADOS COLCAPIRHUA	150.000,00	0	150.000,00	0,00
ACTIVIDAD	29 0000 001	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO MATADERO MUNICIPAL	350.000,00	83.712,57	266.287,43	23,92
ACTIVIDAD	30 0000 001	SERVICIO Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL	100.000,00	2.105,60	97.894,40	2,11
ACTIVIDAD	31 0000 001	DESASTRES NATURALES	100.000,00	21.200,00	78.800,00	21,20
ACTIVIDAD	31 0000 002	DRAGADO DE TORRENTERAS MUNICIPIO COLCAPIRHUA	200.000,00	18.907,00	181.093,00	9,45
ACTIVIDAD	31 0000 003	LIMPIEZA DE CANALES Y DESBROCE DE TORRENTERAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	200.000,00	35.100,00	164.900,00	17,55
ACTIVIDAD	33 0000 001	APOYO SEGURIDAD CUIDADANA COLCAPIRHUA	500.000,00	113.552,84	386.447,16	22,71
ACTIVIDAD	33 0000 002	MANTENIMIENTO DE MODULOS POLICIALES	100.000,00	16.746,95	83.253,05	16,75
ACTIVIDAD	33 0000 003	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	100.000,00	0	100.000,00	0,00
ACTIVIDAD	33 0000 004	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CUIDADANA	350.000,00	0	350.000,00	0,00
ACTIVIDAD	33 0000 005	SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION VIAL	150.000,00	0	150.000,00	0,00
ACTIVIDAD	34 0000 001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.775.077,00	774.206,99	1.000.870,01	43,62
ACTIVIDAD	34 0000 002	EQUIPAMIENTO ALCALDIA DE COLCAPIRHUA	350.000,00	134.805,00	215.195,00	38,52
ACTIVIDAD	34 0000 003	MANTENIMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES	100.000,00	73.026,86	26.973,14	73,03
ACTIVIDAD	34 0000 004	SANEAMIENTO LEGAL DE ACTIVOS FIJOS Y PROCESOS JUDICIALES	90.000,00	18.173,67	71.826,33	20,19
ACTIVIDAD	34 0000 005	ACTIVIDAD Y DEFENSA DE LOS LIMITES DE COLCAPIRHUA	100.000,00	8.346,60	91.653,40	8,35
ACTIVIDAD	34 0000 006	ACTIVIDAD UNIDAD DE TRANSPARENCIA	50.000,00	24.647,00	25.353,00	49,29
ACTIVIDAD	34 0000 007	REFERENDUM APROBACION DE CARTAS ORGANICAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	200.000,00	0	200.000,00	0,00
ACTIVIDAD	34 0000 008	DEFENSA DE LIMITES MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	100.000,00	0	100.000,00	0,00
ACTIVIDAD	34 0000 009	RECATASTRACION DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	100.000,00	0	100.000,00	0,00
ACTIVIDAD	34 0000 010	COMUNICACION Y DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES	100.000,00	3.500,00	96.500,00	3,50
ACTIVIDAD	34 0000 011	EVALUACION TECNICA AL COLISEO SAMANCHA URABI	30.000,00	0	30.000,00	0,00
ACTIVIDAD	34 0000 099	FONDO CONTROL SOCIAL	50.000,00	0	50.000,00	0,00
ACTIVIDAD	97 0000 001	PARTIDAS NO SIGNABLES A PROGRAMAS	2.078.375,00	0	2.078.375,00	0,00
ACTIVIDAD	97 0000 002	PROMOCION Y APOYO DE POLITICAS DE GESTION MUNICIPAL	31.000,00	0	31.000,00	0,00
ACTIVIDAD	97 0000 003	PREVISIONES PARA OTROS BENEFICIOS SOCIALES	100.000,00	0	100.000,00	0,00
ACTIVIDAD	98 0000 001	RENTA DIGNIDAD	1.868.005,00	452.173,24	1.415.831,76	24,21
ACTIVIDAD	98 0000 002	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICA PATRIOTICO	12.453,00	3.014,49	9.438,51	24,21


ACTIVIDAD	97 0000 006	CONST. DE INFRAESTRUCTURA MULTIMODAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES EN SITUACION DE CALLE CON PROBLEMAS DE DROGODEPENDENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	693.000,00	0	693.000,00	0,00
ACTIVIDAD	97 0000 008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO REDUCTO-MOYAPAMPA (COLCAPIRHUA) FPS	292.577,00	0	292.577,00	0,00
ACTIVIDAD	98 0000 090	FINANCIAMIENTO SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL	161.179,00	40.333,82	120.845,18	25,02
ACTIVIDAD	99 0000 001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - FUNCIONAMIENTO	540.000,00	0	540.000,00	0,00
ACTIVIDAD	99 0000 002	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - INVERSION	1.626.906,00	392.289,02	1.234.616,98	24,11
	Total Entidad		60.655.823,00	14.534.463,00	46.121.360,00	


<b>DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD</b>						
<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS PROYECTOS</b>						
Del 01 de Enero al 31 Mayo 2017						
(Expresado en Bolivianos)						
PROYECTO /ACTIVIDAD	APERTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
1306005160000	10 0001 000	CONST. PERFORACION POZO PARA RIEGO OTB TARAMOCKO DIST. A	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306001190000	11 0001 000	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLCAPIRHUA	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0,00
1306002570000	11 0002 000	CONST. CANALIZACION DESAGUE PLUVIAL OTB PARAISO DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306004090000	11 0003 000	CONST. CANAL DESAGUE PLUVIAL SECTOR ADUANA DIST.C	203.000,00	59.769,67	143.230,33	29,44
1306005120000	11 0004 000	CONST. PERFORACION POZO DE AGUA OTB SANTA ROSA CENTRAL DIST. B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005130000	11 0005 000	AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE OTB SUMUNPAYA CENTRAL DIST. C	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005140000	11 0006 000	AMPL. ALCANTARILLADO OTB SUMUMPAYA SUD DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306005150000	11 0007 000	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE OTB SUMUMPAYA CENTRAL GRANDE DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306005110000	11 0008 000		140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005100000	11 0009 000	CONST. PERFORACION POZO DE AGUA OTB KANAUT DIST. A	140.000,00	0	140.000,00	0,00
C061940000000	11 0010 000	CONST. ESTACION ELEVADORA DESAGUE PLUVIAL COLCAPIRHUA	300.000,00	270.795,88	29.204,12	90,27
1306004870000	11 0011 000	CONST. CANALIZACION CALLE VILA VILA OTB SUMUMPAYA CENTRAL DIST. C	120.000,00	53.097,08	66.902,92	44,25
1306001820000	13 0002 000	CONST. REVESTIMIENTO RIO PAMPA MAYU DIST. E FASE IV	500.000,00	0	500.000,00	0,00
1306003370000	16 0001 000	AMPL. ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE FUTBOL ESQUILAN GRANDE COLCAPIRHUA	120.000,00	0	120.000,00	0,00
1306005170000	17 0001 000	CONST. CASA DE CULTURA MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005180000	17 0002 000	CONST. PISCINA MUNICIPAL COLCAPIRHUA	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306004140000	17 0003 000	CONST. AV.DANIEL SALAMANCA DIST.A, D	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00
1306005740000	17 0004 000	CONST. PAV.AV. BOLIVIA DIST.A	700.000,00	0	700.000,00	0,00
1306005190000	17 0005 000	CONST. PAV. DON BOSCO OTB CALLAJCHULLPA DIST. A	200.000,00	0	200.000,00	0,00
1306004150000	17 0006 000	CONST. AV. DORBIGNI DIST. B,C,D	2.945.000,00	1.086.416,30	1.858.583,70	36,89




1306004190000	17 0007 000	CONST. PAV. FLEXIBLE AV. TOMAS OCONOR DIST.B,C	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00
1306005750000	17 0008 000	CONST. PAV. AV. FRANZ TAMAYO DIST. B	700.000,00	0	700.000,00	0,00
1306005210000	17 0009 000	CONST. PAV. AV. COMERCIO DIST. B	440.000,00	0	440.000,00	0,00
1306004210000	17 0010 000	CONST. PAVIMENTO AV. ANDINA OTB COLCAPIRHUA CENTRAL DIST.D	400.000,00	0	400.000,00	0,00
1306005220000	17 0011 000	CONST. PRADO CENTRAL AV. B. GALINDO REDUCTO MERCADO CENTRAL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	400.000,00	0	400.000,00	0,00
1306004240000	17 0012 000	CONST. PAV. RIGIDO AV.CALLE JAZMIN OTB ESQUILAN GRANDE DIST.E	824.000,00	122.984,48	701.015,52	14,93
1306005230000	17 0013 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB 23 DE MARZO DIST. A	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005240000	17 0014 000	CONST. EMPEDRADO CALLE EZEQUIEL OSORIO OTB CAPACACHI NORTE DIST. A	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005250000	17 0015 000	CONST. PAV. CALLE INTIRRAYMI DIST. A	260.000,00	0	260.000,00	0,00
1306005260000	17 0016 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB COLLAPAMPAMPA DON BOSCO DIST. A	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005270000	17 0017 000	CONST. EMPEDRADO DE VIAS CALLE QUIRIKANCHA OTB VILLA ROSEDAL DIOS ES AMOR DIST. A	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005280000	17 0018 000	CONST. EMPEDRADO DE VIAS OTB COLLAPAMPAMPA DIST. A	120.000,00	0	120.000,00	0,00
1306005290000	17 0019 000	CONST. PAV. F. DIEZ MEDINA OTB HOLANDA DIST. B	140.000,00	139.907,00	93,00	99,93
1306005300000	17 0020 000	CONST. PAV. DE VIAS LATERALES AV. B. GALINDO OTB HUANUNI DIST. B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005310000	17 0021 000	CONST. PAV. CALLE 27 DE JULIO OTB MOROCOCALA DIST. B	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005320000	17 0022 000	CONST. PAV. CALLE J. BAUTISTA OTBS SANTA ISABEL - MOROCOCALA DIST. B	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005330000	17 0023 000	CONST. PAV. CALLE LOS PARAISOS - PULACAYO OTB CALIFORNIA DIST. B	140.000,00	139.931,00	69,00	99,95
1306005350000	17 0024 000	CONST. PAV. AV.DE VIAS OTB FABRIL CAPACACHI DIST.B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005340000	17 0025 000	CONST. PAV. AV. 27 DE ABRIL OTB ELIZABETH SETON DIST.B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306002840000	17 0026 000	CONST. PAV. RIGIDO CALLE CARITAS OTB OASYS DIST. B	120.000,00	0	120.000,00	0,00
1306005000000	17 0027 000	CONST. PLAZA DEL EDEN OTB NUEVA JERUSALEN DIST. B	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005390000	17 0028 000	CONST. PAV. CALLE LOS CEIBOS OTB LA PRADERA DIST. B	140.000,00	139.150,00	850,00	99,39
1306005400000	17 0029 000	CONST. PAV. PASAJE INNOMINADO OTB SANTA ISABEL DIST. B	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005410000	17 0030 000	CONST. PAV. CALLE VILOMA	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306004200000	17 0031 000	CONST. PAVIMENTO AV. ANDINA OTB MOYAPAMPA DIST.C	240.000,00	14.195,00	225.805,00	5,91
1306005420000	17 0032 000	CONST. PAV. CALLE TUPIZA OTB RONNY ROJAS DIST. C	120.000,00	0	120.000,00	0,00
1306005430000	17 0033 000	CONST. PAV. CALLE RICARDO MUJICA OTB SAN FRANCISCO DIST. C	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005440000	17 0034 000	CONST. PARQUE INFANTIL OTB SAN FRANCISCO DIST. C	40.000,00	0	40.000,00	0,00
1306005450000	17 0035 000	CONST. PAV. VIAS LATERALES AV. BLANCO GALINDO OTB SUMUMPAYA CENTRAL DIST. C	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005460000	17 0036 000	CONST. PAV. CALLE CALA CRUZ OTB FERROVIARIO NORTE DIST. C	140.000,00	134.346,00	5.654,00	95,96
1306003030000	17 0037 000	CONST. PAV. RIGIDO CALLE PULACAYO OTB FERROVIARIO SUD DIST. C	140.000,00	0	140.000,00	0,00
C060012300000	17 0038 000	CONST. C. DE CAP. SOCIAL PROD. OTB 21 DE SEPTIEMBRE DIST. D FASE II	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005470000	17 0039 000	CONST. PARQUE INFANTIL LORONCOCHA OTB COLCAPIRHUA CENTRAL DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005480000	17 0040 000	CONST. PAV. LATERAL COMPLEJO DEPORTIVO SAMANCHA URABI OTB COLCAPIRHUA SUD DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005490000	17 0041 000	CONST. PAV. CALLE GARZAS OTB PIÑAMI SUD DIST. D	130.000,00	44.540,00	85.460,00	34,26
1306005500000	17 0042 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB SAN LORENZO DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005510000	17 0043 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB SAN SILVESTRE DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005520000	17 0044 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB ESQUILAN CHIJLLAWIRI DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306004390000	17 0045 000	CONST. PAV. RIGIDO AV. ANGULO OTB SUMUMPAYA CHICO DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306004740000	17 0047 000	CONST. PAV. RIGIDOE CALLE VIOLETAS OTB SUMUMPAYA CALAMINAS DIST.	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005530000	17 0048 000	CONST. EMPEDRADO DE VIAS OTB KENAMARI KULLCU DIST.E.	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306003670000	17 0049 000	CONST. PLANTA DE ORMIGON MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	100.000,00	99.998,45	1,55	100,00

1306004840000	17 0050 000	AMPL. EDIFICIO MUNICIPAL COLCAPIRHUA	146.000,00	0	146.000,00	0,00
1306004950000	17 0051 000	CONST. CENTRO DE ACOGIDA DE LA MUJER MUNICIPIO COLCAPIRHUA	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306195340000	17 0052 000	CONST. PAV. CALLE BUENOS AIRES OTB SAN JOSE DE KAMI DIST. A	92.000,00	86.829,00	5.171,00	94,38
1306004700000	17 0053 000	CONST. PAV. RIGIDO CALLE SUCRE OTB SIND. AGRARIO ESQUILAN GRANDE DIST. E	26.500,00	0	26.500,00	0,00
C061946000000	17 0100 000	CONST. MERCADO CAMPESINO COLCAPIRHUA	557.647,21	0	557.647,21	0,00
1306004400000	18 0090 000	CONST. PUENTE VEHICULAR OTB SUMUMPAYA KULLCU DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
C061900500000	20 0001 000	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL CAPACACHI FASE II	800.000,00	0	800.000,00	0,00
1306004860000	20 0002 000	AMPL. CENTRO DE SALUD KAMI	810.000,00	571.397,30	238.602,70	70,54
1306004430000	21 0001 000	CONST. TECNOLOGICO SAN ISIDRO OTB ESQUILAN DIST.E	250.000,00	0	250.000,00	0,00
1306004470000	21 0002 000	CONST. BLOQUE INICIAL U.E. SAUSALITO	170.000,00	99.843,38	70.156,62	58,73
1306005570000	21 0003 000	CONST. CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL GENOVEVA RIOS DIST. C	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005360000	21 0004 000	CONST. CUBIERTA GRADERIAS TARIMA U.E. SAGRADA FAMILIA ANDRES CUSHIERI	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005370000	21 0005 000	CONST. BLOQUE DE LABORATORIO Y TALLERES U.E. SIMON BOLIVAR	200.000,00	0	200.000,00	0,00
1306003290000	21 0006 000	CONST. SALON MULTIPLE U.E. DANIEL SALAMANCA - 27 DE MAYO	200.000,00	0	200.000,00	0,00
1306004480000	21 0007 000	CONST. BLOQUE NUEVO 6 AULAS U.E. SAN SAN LORENZO - RAFAEL ARNAIZ	200.000,00	0	200.000,00	0,00
C061941900000	21 0008 000	CONST. DE AULAS BLOQUE DE AULAS BLOQUE NUEVO U.E. MAX FERNANDEZ-FERROVIARIO	150.000,00	131.997,63	18.002,37	88,00
1306005380000	21 0009 000	CONST. BLOQUE DE TALLERES Y AULAS U.E. MAX FERNANDEZ FERROVIARIO	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005580000	21 0010 000	CONST. GARAJE E INGRESO SECUNDARIO U.E. PABLO CANO JESUS LARA	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
1306005590000	21 0011 000	CONST. TINGLADO PATIO CENTRAL U.E. NUESTRA SRA. DE LA PAZ	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306005600000	21 0012 000	CONST. U.E. BENEDICTO DURAN	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005610000	21 0013 000	CONST. TINGLADO PATIO CENTRAL Y NIVEL INICIAL U.E. BENEDICTO DURAN	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306004450000	21 0014 000	CONST. NIVEL INICIAL U.E. SAN JOSE DE KAMI - MARISCAL SUCRE	250.000,00	145.139,46	104.860,54	58,06
1306005620000	21 0015 000	CONST. PROSCENIO CANCHA MULTIPLE U.E. DON BOSCO	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005630000	21 0016 000	CONST. POZO DE AGUA POTABLERI UE SAGRADA FAMILIA-ANDRES CUSCHIE	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005640000	21 0017 000	CONST. POZO DE AGUA POTABLE UE PABLO CANO	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005650000	21 0018 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA SAN CRISPIN DIST.E	400.000,00	0	400.000,00	0,00
1306004890000	21 0097 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA MODELO COLCAPIRHUA	5.677.844,10	0	5.677.844,10	0,00
1306004900000	21 0098 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA MODELO CARLOS VILLEGAS	5.792.840,87	1.865.022,82	3.927.818,05	32,20
1306004910000	21 0099 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA MODELO SAN MIGUEL	5.811.580,06	753.636,94	5.057.943,12	12,97
1306004820000	21 0100 000	CONST. BLOQUE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO U.E. 15 DE ABRIL	1.600.000,00	1.599.999,69	0,31	100,00
C061939900000	22 0001 000	CONST. COLISEO MUNICIPAL SAMANCHA URABI MUNICIPIO COLCAPIRHUA FASE III	500.000,00	0	500.000,00	0,00
1306005660000	22 0002 000	CONST. CANCHA MULTIPLE OTB CUATRO ESQUINAS DIST.A	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005670000	22 0003 000	CONST. CANCHA MULTIPLE LOS LIRIOS OTB WILLCATACO DIST.A	80.000,00	0	80.000,00	0,00
1306005680000	22 0004 000	CONST. CANCHA MULTIPLE OTB FLORIDA SUD DIST.B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005690000	22 0005 000	CONST. TEPEADO CANCHA FUTBOL OTB CANADA DIST.C	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005700000	22 0006 000	CONST. TINGLADO CANCHA MULTIPLE OTB GENERAL PANDO DIST.D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005710000	22 0007 000	CONST. TINGLADO CANCHA MULTIPLE OTB SINDICATO AGRARIO DIST.E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
C061946200000	22 0100 000	CONST. CUBIERTA CANCHA MULTIPLE KAMI	17.663,70	0	17.663,70	0,00
1306004830000	22 0101 000	CONST. CAMPO DEPORTIVO GRADERIAS SAN JOSE KAMI	2.879.379,11	1.248.069,63	1.631.309,48	43,35
1306005720000	31 0001 000	CONST. DRENAJE PLUVIAL OTB BLOQUES FLORIDA NORTE DIST. B	80.000,00	0	80.000,00	0,00
1306004550000	31 0002 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN TORRENTERA RUMY MAYU LADO OESTE OTB SAN ALFONSO DIST. B	140.000,00	100.000,00	40.000,00	71,43
1306005730000	31 0003 000	CONST. CANALIZACION DESAGUE PLUVIAL CALLE BENI OTB JAZMIN DIST.C	100.000,00	0	100.000,00	0,00
	Total Entidad		46.363.455,05	8.957.066,71	37.406.388,34	19,32

DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD							
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DIST.A				 <b>G</b> OBIERNO <b>A</b> UTÓNOMO <b>M</b> UNICIPAL <b>C</b> OLCAPIRHUA			
Del 01 de Enero al 31 Mayo 2017							
(Expresado en Bolivianos)							
PROYECTO /ACTIVIDAD	DIST.	APERTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
1306005160000	A	10 0001 000	CONST. PERFORACION POZO PARA RIEGO OTB TARAMOCKO DIST. A	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005100000	A	11 0009 000	CONST. PERFORACION POZO DE AGUA OTB KANAUT DIST. A	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005740000	A	17 0004 000	CONST. PAV.AV. BOLIVIA DIST.A	700.000,00	0	700.000,00	0,00
1306005190000	A	17 0005 000	CONST. PAV. DON BOSCO OTB CALLAJCHULLPA DIST. A	200.000,00	0	200.000,00	0,00
1306005230000	A	17 0013 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB 23 DE MARZO DIST. A	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005240000	A	17 0014 000	CONST. EMPEDRADO CALLE EZEQUIEL OSORIO OTB CAPACACHI NORTE DIST. A	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005250000	A	17 0015 000	CONST. PAV. CALLE INTIRRAYMI DIST. A	260.000,00	0	260.000,00	0,00
1306005260000	A	17 0016 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB COLLAPAMPA DON BOSCO DIST. A	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005270000	A	17 0017 000	CONST. EMPEDRADO DE VIAS CALLE QURIKANCHA OTB VILLA ROSEDAL DIOS ES AMOR DIST. A	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005280000	A	17 0018 000	CONST. EMPEDRADO DE VIAS OTB COLLAPAMPA DIST. A	120.000,00	0	120.000,00	0,00
1306195340000	A	17 0052 000	CONST. PAV. CALLE BUENOS AIRES OTB SAN JOSE DE KAMI DIST. A	92.000,00	86.829,00	5.171,00	94,38
Actividad	A	18 0000 001	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.A	200.000,00	168.608,15	31.391,85	84,30
1306005660000	A	22 0002 000	CONST. CANCHA MULTIPLE OTB CUATRO ESQUINAS DIST.A	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005670000	A	22 0003 000	CONST. CANCHA MULTIPLE LOS LIRIOS OTB WILLCATACO DIST.A	80.000,00	0	80.000,00	0,00
		Total Entidad		2.502.000,00	255.437,15	2.246.562,85	10,21

DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD							
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DIST.B				 <b>GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL COLCAPIRHUA</b>			
Del 01 de Enero al 31 Mayo 2017							
(Expresado en Bolivianos)							
PROYECTO /ACTIVIDAD	DIST.	APERTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION	PRESUPUES TO	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
1306005120000	B	11 0004 000	CONST. PERFORACION POZO DE AGUA OTB SANTA ROSA CENTRAL DIST. B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005110000	B	11 0008 000	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE OTB MARTIN CARDENAS DIST. B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005750000	B	17 0008 000	CONST. PAV. AV. FRANZ TAMAYO DIST. B	700.000,00	0	700.000,00	0,00
1306005210000	B	17 0009 000	CONST. PAV. AV. COMERCIO DIST. B	440.000,00	0	440.000,00	0,00
1306005290000	B	17 0019 000	CONST. PAV. F. DIEZ MEDINA OTB HOLANDA DIST. B	140.000,00	139.907,00	93,00	99,93
1306005300000	B	17 0020 000	CONST. PAV. DE VIAS LATERALES AV. B. GALINDO OTB HUANUNI DIST. B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005310000	B	17 0021 000	CONST. PAV. CALLE 27 DE JULIO OTB MOROCOCALA DIST. B	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005320000	B	17 0022 000	CONST. PAV. CALLE J. BAUTISTA OTBS SANTA ISABEL - MOROCOCALA DIST. B	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005330000	B	17 0023 000	CONST. PAV. CALLE LOS PARAISOS - PULACAYO OTB CALIFORNIA DIST. B	140.000,00	139.931,00	69,00	99,95
1306005350000	B	17 0024 000	CONST. PAV. AV.DE VIAS OTB FABRIL CAPACACHI DIST.B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005340000	B	17 0025 000	CONST. PAV. AV. 27 DE ABRIL OTB ELIZABETH SETON DIST.B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306002840000	B	17 0026 000	CONST. PAV. RIGIDO CALLE CARITAS OTB OASYS DIST. B	120.000,00	0	120.000,00	0,00
1306005000000	B	17 0027 000	CONST. PLAZA DEL EDEN OTB NUEVA JERUSALEN DIST. B	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005390000	B	17 0028 000	CONST. PAV. CALLE LOS CEIBOS OTB LA PRADERA DIST. B	140.000,00	139.150,00	850,00	99,39
1306005400000	B	17 0029 000	CONST. PAV. PASAJE INNOMINADO OTB SANTA ISABEL DIST. B	100.000,00	0	100.000,00	0,00
Actividad	B	18 0000 002	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.B	120.000,00	103.319,90	16.680,10	86,10
1306005680000	B	22 0004 000	CONST. CANCHA MULTIPLE OTB FLORIDA SUD DIST.B	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005720000	B	31 0001 000	CONST. DRENAJE PLUVIAL OTB BLOQUES FLORIDA NORTE DIST. B	80.000,00	0	80.000,00	0,00
1306004550000	B	31 0002 000	CONST. MURO DE CONTENCIÓN TORRENTERA RUMY MAYU LADO OESTE OTB SAN ALFONSO DIST. B	140.000,00	100.000,00	40.000,00	71,43
		Total Entidad		3.210.000,00	622.307,90	2.587.692,10	19,39

DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD							
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DIST.C				 <b>GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL COLCAPIRHUA</b>			
Del 01 de Enero al 31 Mayo 2017							
(Expresado en Bolivianos)							
PROYECTO /ACTIVIDAD	DIST.	APERTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
1306004090000	C	11 0003 000	CONST. CANAL DESAGUE PLUVIAL SECTOR ADUANA DIST.C	203.000,00	59.769,67	143.230,33	29,44
1306005130000	C	11 0005 000	AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE OTB SUMUNPAYA NORTE DIST. C	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306004870000	C	11 0011 000	CONST. CANALIZACION CALLE VILA VILA OTB SUMUMPAYA CENTRAL DIST. C	120.000,00	53.097,08	66.902,92	44,25
1306005410000	C	17 0030 000	CONST.PAV. CALLE VILOMA OTB LIBERTADOR BOLIVAR DIS.C	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306004200000	C	17 0031 000	CONST. PAVIMENTO AV. ANDINA OTB MOYAPAMPA DIST.C	240.000,00	14.195,00	225.805,00	5,91
1306005420000	C	17 0032 000	CONST. PAV. CALLE TUPIZA OTB RONNY ROJAS DIST. C	120.000,00	0	120.000,00	0,00
1306005430000	C	17 0033 000	CONST. PAV. CALLE RICARDO MUJICA OTB SAN FRANCISCO DIST. C	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005440000	C	17 0034 000	CONST. PARQUE INFANTIL OTB SAN FRANCISCO DIST. C	40.000,00	0	40.000,00	0,00
1306005450000	C	17 0035 000	CONST. PAV. VIAS LATERALES AV. BLANCO GALINDO OTB SUMUMPAYA CENTRAL DIST. C	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005460000	C	17 0036 000	CONST. PAV. CALLE CALA CRUZ OTB FERROVIARIO NORTE DIST. C	140.000,00	134.346,00	5.654,00	95,96
1306003030000	C	17 0037 000	CONST. PAV. RIGIDO CALLE PULACAYO OTB FERROVIARIO SUD DIST. C	140.000,00	0	140.000,00	0,00
Actividad	C	18 0000 003	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.C	120.000,00	110.959,44	9.040,56	92,47
1306005690000	C	22 0005 000	CONST. TEPEADO CANCHA FUTBOL OTB CANADA DIST.C	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005730000	C	31 0003 000	CONST. CANALIZACION DESAGUE PLUVIAL CALLE BENI OTB JAZMIN DIST.C	100.000,00	0	100.000,00	0,00
		Total Entidad		1.843.000,00	372.367,19	1.470.632,81	20,20

DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD							
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DIST.D							
Del 01 de Enero al 31 Mayo 2017							
(Expresado en Bolivianos)							
PROYECTO /ACTIVIDAD	DIST.	APERTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION	PRESUPUEST O	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
1306002570000	D	11 0002 000	CONST. CANALIZACION DESAGUE PLUVIAL OTB PARAISO DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306004210000	D	17 0010 000	CONST. PAVIMENTO AV. ANDINA OTB COLCAPIRHUA CENTRAL DIST.D	400.000,00	0	400.000,00	0,00
C060012300000	D	17 0038 000	CONST. C. DE CAP. SOCIAL PROD. OTB 21 DE SEPTIEMBRE DIST. D FASE II	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005470000	D	17 0039 000	CONST. PARQUE INFANTIL LORONCOCHA OTB COLCAPIRHUA CENTRAL DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005480000	D	17 0040 000	CONST. PAV. LATERAL COMPLEJO DEPORTIVO SAMANCHA URABI OTB COLCAPIRHUA SUD DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005490000	D	17 0041 000	CONST. PAV. CALLE GARZAS OTB PIÑAMI SUD DIST. D	130.000,00	44.540,00	85.460,00	34,26
1306005500000	D	17 0042 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB SAN LORENZO DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
1306005510000	D	17 0043 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB SAN SILVESTRE DIST. D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
Actividad	D	18 0000 004	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.D	120.000,00	119.753,00	247,00	99,79
1306005700000	D	22 0006 000	CONST. TINGLADO CANCHA MULTIPLE OTB GENERAL PANDO DIST.D	130.000,00	0	130.000,00	0,00
		Total Entidad		1.560.000,00	164.293,00	1.395.707,00	10,53



DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD							
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DIST.E							
Del 01 de Enero al 31 Mayo 2017							
(Expresado en Bolivianos)							
PROYECTO /ACTIVIDAD	DIST.	APERTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION	PRESUPUEST O	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
1306005140000	E	11 0006 000	AMPL. ALCANTARILLADO OTB SUMUMPAYA SUD DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306005150000	E	11 0007 000	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE OTB SUMUMPAYA CENTRAL GRANDE DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306003370000	E	16 0001 000	AMPL. ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE FUTBOL ESQUILAN GRANDE COLCAPIRHUA DIST.E	120.000,00	0	120.000,00	0,00



1306004240000	E	17 0012 000	CONST. PAV. RIGIDO AV.CALLE JAZMIN OTB ESQUILAN GRANDE DIST.E	824.000,00	122.984,48	701.015,52	14,93
1306005520000	E	17 0044 000	CONST. PAV. DE VIAS OTB ESQUILAN CHIJLLAWIRI DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306004390000	E	17 0045 000	CONST. PAV. RIGIDO AV. ANGULO OTB SUMUMPAYA CHICO DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306004740000	E	17 0047 000	CONST. PAV. RIGIDOE CALLE VIOLETAS OTB SUMUMPAYA CALAMINAS DIST.E	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005530000	E	17 0048 000	CONST. EMPEDRADO DE VIAS OTB KENAMARI KULLCU DIST E.	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306004700000	E	17 0053 000	CONST. PAV. RIGIDO CALLE SUCRE OTB SIND. AGRARIO ESQUILAN GRANDE DIST. E	26.500,00	0	26.500,00	0,00
Actividad	E	18 0000 005	MTTO.Y MEJORAMIENTO Y RIPIADO DE CALLES Y CAMINOS DIST.E	200.000,00	133.503,43	66.496,57	66,75
1306004400000	E	18 0090 000	CONST. PUENTE VEHICULAR OTB SUMUMPAYA KULLCU DIST. E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306004430000	E	21 0001 000	CONST. TECNOLOGICO SAN ISIDRO OTB ESQUILAN DIST.E	250.000,00	0	250.000,00	0,00
1306005710000	E	22 0007 000	CONST. TINGLADO CANCHA MULTIPLE OTB SINDICATO AGRARIO DIST.E	150.000,00	0	150.000,00	0,00
		Total Entidad		2.570.500,00	256.487,91	2.314.012,09	9,98


<b>DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD</b>							
<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS PROY. INSTITUCIONALES</b>							
<b>Del 01 de Enero al 31 Mayo 2017</b>							
<b>(Expresado en Bolivianos)</b>							
<b>PROYECTO /ACTIVIDAD</b>	<b>DIST.</b>	<b>APERTURA PROGRAMATICA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRESUPUEST O</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>SALDO</b>	<b>% AVANCE</b>
1306001190000	II	11 0001 000	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLCAPIRHUA	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0,00
C061940000000	II	11 0010 000	CONST. ESTACION ELEVADORA DESAGUE PLUVIAL COLCAPIRHUA	300.000,00	270.795,88	29.204,12	90,27
1306001820000	II	13 0002 000	CONST. REVESTIMIENTO RIO PAMPA MAYU DIST. E FASE IV	500.000,00	0	500.000,00	0,00
1306005170000	II	17 0001 000	CONST. CASA DE CULTURA MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005180000	II	17 0002 000	CONST. PISCINA MUNICIPAL COLCAPIRHUA	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306004140000	II	17 0003 000	CONST. AV.DANIEL SALAMANCA DIST.A, D	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00
1306004150000	II	17 0006 000	CONST. AV. DORBIGNI DIST. B,C,D	2.945.000,00	1.086.416,30	1.858.583,70	36,89
1306004190000	II	17 0007 000	CONST. PAV. FLEXIBLE AV. TOMAS OCONOR DIST.B,C	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00
1306005220000	II	17 0011 000	CONST. PRADO CENTRAL AV. B. GALINDO REDUCTO MERCADO CENTRAL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	400.000,00	0	400.000,00	0,00
1306003670000	II	17 0049 000	CONST. PLANTA DE ORMIGON MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	100.000,00	99.998,45	1,55	100,00
1306004840000	II	17 0050 000	AMPL. EDIFICIO MUNICIPAL COLCAPIRHUA	146.000,00	0	146.000,00	0,00
1306004950000	II	17 0051 000	CONST. CENTRO DE ACOGIDA DE LA MUJER MUNICIPIO COLCAPIRHUA	50.000,00	0	50.000,00	0,00
C061946000000	II	17 0100 000	CONST. MERCADO CAMPESINO COLCAPIRHUA	557.647,21	0	557.647,21	0,00



**G**  
**A**  
**M**  
**C**  
**GOBIERNO**  
**MUNICIPAL**  
**COLCAPIRHUA**

C061900500000	II	20 0001 000	CONST. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL CAPACACHI FASE II	800.000,00	0	800.000,00	0,00
1306004860000	II	20 0002 000	AMPL. CENTRO DE SALUD KAMI	810.000,00	571.397,30	238.602,70	70,54
1306004470000	II	21 0002 000	CONST. BLOQUE INICIAL U.E. SAUSALITO	170.000,00	99.843,38	70.156,62	58,73
1306005570000	II	21 0003 000	CONST. CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL GENOVEVA RIOS DIST. C	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005360000	II	21 0004 000	CONST. CUBIERTA GRADERIAS TARIMA U.E. SAGRADA FAMILIA ANDRES CUSHIERI	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005370000	II	21 0005 000	CONST. BLOQUE DE LABORATORIO Y TALLERES U.E. SIMON BOLIVAR	200.000,00	0	200.000,00	0,00
1306003290000	II	21 0006 000	CONST. SALON MULTIPLE U.E. DANIEL SALAMANCA - 27 DE MAYO	200.000,00	0	200.000,00	0,00
1306004480000	II	21 0007 000	CONST. BLOQUE NUEVO 6 AULAS U.E. SAN SAN LORENZO - RAFAEL ARNAIZ	200.000,00	0	200.000,00	0,00
C061941900000	II	21 0008 000	CONST. DE AULAS BLOQUE DE AULAS BLOQUE NUEVO U.E. MAX FERNANDEZ-FERROVIARIO	150.000,00	131.997,63	18.002,37	88,00
1306005380000	II	21 0009 000	CONST. BLOQUE DE TALLERES Y AULAS U.E. MAX FERNANDEZ FERROVIARIO	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005580000	II	21 0010 000	CONST. GARAJE E INGRESO SECUNDARIO U.E. PABLO CANO JESUS LARA	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
1306005590000	II	21 0011 000	CONST. TINGLADO PATIO CENTRAL U.E. NUESTRA SRA. DE LA PAZ	150.000,00	0	150.000,00	0,00
1306005600000	II	21 0012 000	CONST. U.E. BENEDICTO DURAN	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306005610000	II	21 0013 000	CONST. TINGLADO PATIO CENTRAL Y NIVEL INICIAL U.E. BENEDICTO DURAN	50.000,00	0	50.000,00	0,00
1306004450000	II	21 0014 000	CONST. NIVEL INICIAL U.E. SAN JOSE DE KAMI - MARISCAL SUCRE	250.000,00	145.139,46	104.860,54	58,06
1306005620000	II	21 0015 000	CONST. PROSCENIO CANCHA MULTIPLE U.E. DON BOSCO	100.000,00	0	100.000,00	0,00
1306005630000	II	21 0016 000	CONST. POZO DE AGUA POTABLERI UE SAGRADA FAMILIA- ANDRES CUSCHIE	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005640000	II	21 0017 000	CONST. POZO DE AGUA POTABLE UE PABLO CANO	140.000,00	0	140.000,00	0,00
1306005650000	II	21 0018 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA SAN CRISPIN DIST.E	400.000,00	0	400.000,00	0,00
1306004890000	II	21 0097 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA MODELO COLCAPIRHUA	5.677.844,10	0	5.677.844,10	0,00
1306004900000	II	21 0098 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA MODELO CARLOS VILLEGAS	5.792.840,87	1.865.022,82	3.927.818,05	32,20
1306004910000	II	21 0099 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA MODELO SAN MIGUEL	5.811.580,06	753.636,94	5.057.943,12	12,97
1306004820000	II	21 0100 000	CONST. BLOQUE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO U.E. 15 DE ABRIL	1.600.000,00	1.599.999,69	0,31	100,00
C061939900000	II	22 0001 000	CONST. COLISEO MUNICIPAL SAMANCHA URABI MUNICIPIO COLCAPIRHUA FASE III	500.000,00	0	500.000,00	0,00
C061946200000	II	22 0100 000	CONST. CUBIERTA CANCHA MULTIPLE KAMI	17.663,70	0	17.663,70	0,00
1306004830000	II	22 0101 000	CONST. CAMPO DEPORTIVO GRADERIAS SAN JOSE KAMI	2.879.379,11	1.248.069,63	1.631.309,48	43,35
		Total Entidad		35.437.955,05	7.922.317,48	27.515.637,57	22,36




DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD							
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS INSTITUCIONALES				 <b>GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL COLCAPIRHUA</b>			
Del 01 de Enero al 31 Mayo 2017							
(Expresado en Bolivianos)							
PROYECTO /ACTIVIDAD	DISTRITO	APERTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
Actividad	I	00 0000 001	FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	12.686.781,00	4.161.366,97	8.525.414,03	32,80
Actividad	I	01 0000 001	FUCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL	2.575.469,00	724.832,66	1.850.636,34	28,14
Actividad	I	10 0000 001	FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	147.423,00	76.483,48	70.939,52	51,88
Actividad	I	11 0000 001	FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO BASICO DE COLCAPIRHUA	400.000,00	83.154,34	316.845,66	20,79
Actividad	I	11 0000 002	MANTENIMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO COLCAPIRHUA	400.000,00	18.507,00	381.493,00	4,63
Actividad	I	11 0000 003	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OTB SANTA ROSA CATAVI DIST.B	100.000,00	0	100.000,00	0,00
Actividad	I	12 0000 001	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO COLCAPIRHUA	80.000,00	0	80.000,00	0,00
Actividad	I	13 0000 001	MANTENIMIENTO ORNAMENTO EQUIP. DE PARQUES Y AREAS VERDES	380.000,00	171.635,62	208.364,38	45,17
Actividad	I	13 0000 002	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	170.000,00	22.739,76	147.260,24	13,38
Actividad	I	13 0000 003	FUNCIONAMIENTO VIVERO MUNICIPAL COLCAPIRHUA	120.000,00	0	120.000,00	0,00
Actividad	I	13 0000 004	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES Y AREAS VERDES	150.000,00	56.700,65	93.299,35	37,80
Actividad	I	13 0000 005	FUNCIONAMIENTO TALLER DE CERRAGERIA MUNICIPAL	100.000,00	61.568,74	38.431,26	61,57
Actividad	I	14 0000 001	LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA COLCAPIRHUA	550.000,00	132.833,88	417.166,12	24,15
Actividad	I	14 0000 002	MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO COLCAPIRHUA	450.000,00	143.460,00	306.540,00	31,88
Actividad	I	16 0000 001	FUNCIONAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUN. COLCAPIRHUA	300.000,00	108.174,47	191.825,53	36,06
Actividad	I	16 0000 002	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.A	100.000,00	96.383,00	3.617,00	96,38
Actividad	I	16 0000 003	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.B	80.000,00	0	80.000,00	0,00
Actividad	I	16 0000 004	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.C	80.000,00	0	80.000,00	0,00
Actividad	I	16 0000 005	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.D	80.000,00	0	80.000,00	0,00
Actividad	I	16 0000 006	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LUMINARIAS DIST.E	100.000,00	94.493,00	5.507,00	94,49
Actividad	I	16 0000 007	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO OTB CAPACACHI NORTE DIST.A	50.000,00	0	50.000,00	0,00
Actividad	I	16 0000 008	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO OTB SUMUMPAYA NORTE DIST.C	30.000,00	0	30.000,00	0,00
Actividad	I	16 0000 009	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO OTB JUNTA VECINAL CALAMINA DIST.D	50.000,00	49.914,00	86,00	99,83
Actividad	I	17 0000 001	EXPROPIACION DE TERRENO EDIFICIO MUNICIPAL	150.000,00	0	150.000,00	0,00
Actividad	I	17 0000 002	EXPROPIACION TERRENO AMPLIACION CEMENTERIO GENERAL COLCAPIRHUA	150.000,00	0	150.000,00	0,00
Actividad	I	17 0000 003	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL OTB SENAC DIST.C	30.000,00	0	30.000,00	0,00
Actividad	I	17 0000 004	EXPROPIACION TERRENO CAMPO DEPORTIVO SAN JOSE KAMI DIST.A	43.500,00	0	43.500,00	0,00
Actividad	I	17 0000 005	EXPROPIACION TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SUMUMPAYA DIST.E	156.000,00	0	156.000,00	0,00
Actividad	I	18 0000 006	CONFORMACION DE PLATAFORMA MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	200.000,00	49.788,30	150.211,70	24,89

Actividad	I	18 0000 007	MTTO. Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	200.000,00	35.100,00	164.900,00	17,55
Actividad	I	20 0000 001	FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO EN ACTIVIDADES DE SALUD	2.300.000,00	550.561,98	1.749.438,02	23,94
Actividad	I	20 0000 002	PROGRAMA ITS VIH-SIDA	50.000,00	0	50.000,00	0,00
Actividad	I	20 0000 003	CAPACITACION Y MANEJO DEL PROGRAMA CHAGAS-SEDES	40.000,00	5.238,80	34.761,20	13,10
Actividad	I	20 0000 004	SERVICIOS PROFESIONALES UNIVERSIDADES Y OTROS	150.000,00	7.849,48	142.150,52	5,23
Actividad	I	20 0000 005	EQUIPAMIENTO Y CAP. CENTRO DE SALUD Y POSTAS COLCAPIRHUA	200.000,00	4.000,00	196.000,00	2,00
Actividad	I	20 0000 006	PROGRAMA DESNUTRICION CERO	250.000,00	0	250.000,00	0,00
Actividad	I	20 0000 007	BOQUITA SANA JURISDICCION COLCAPIRHUA	200.000,00	0	200.000,00	0,00
Actividad	I	20 0000 008	MANTENIMIENTO Y REFACCION INFRAESTRUCTURA DE SALUD	100.000,00	42.293,71	57.706,29	42,29
Actividad	I	20 0000 009	ACTIVIDAD DE ZONOSIS	200.000,00	97.289,07	102.710,93	48,64
Actividad	I	20 0000 010	APOYO PROGRAMA MI SALUD	400.000,00	0	400.000,00	0,00
Actividad	I	20 0000 011	FUNCIONAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI	3.856.498,00	1.012.586,60	2.843.911,40	26,26
Actividad	I	20 0000 012	EQUIPAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI	500.000,00	12.753,80	487.246,20	2,55
Actividad	I	20 0000 013	MANTENIMIENTO Y REFACCION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI	200.000,00	39.309,04	160.690,96	19,65
Actividad	I	20 0000 099	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL (LEY 475)	6.245.709,00	204.250,60	6.041.458,40	3,27
Actividad	I	21 0000 001	FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	1.000.000,00	352.854,77	647.145,23	35,29
Actividad	I	21 0000 002	MTTO. Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUN. COLCAPIRHUA	350.000,00	177.687,88	172.312,12	50,77
Actividad	I	21 0000 003	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	480.000,00	83.210,00	396.790,00	17,34
Actividad	I	21 0000 004	DESAYUNO ESCOLAR GESTION 2017 MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	5.300.000,00	1.251.042,88	4.048.957,12	23,60
Actividad	I	21 0000 005	PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO"	80.000,00	39.882,60	40.117,40	49,85
Actividad	I	21 0000 006	IMPLEMENTACION BACHILLERATO TECNICO HUMANISTICO DIST. EDUCATIVO COLCAPIRHUA	20.000,00	0	20.000,00	0,00
Actividad	I	21 0000 007	MEJORAMIENTO BATERIA DE BAÑOS UNIDADES EDUCATIVAS COLCAPIRHUA	360.000,00	33.633,00	326.367,00	9,34
Actividad	I	22 0000 001	PROMOCION FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE JURISDICCION CALCAPIRHUA	382.284,00	106.710,33	275.573,67	27,91
Actividad	I	22 0000 002	ESCUELA DE DEPORTE MUNICIPAL COLCAPIRHUA	200.000,00	9.860,00	190.140,00	4,93
Actividad	I	22 0000 003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	200.000,00	131.036,12	68.963,88	65,52
Actividad	I	22 0000 004	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (ATLETISMO, GIMNASIA, HALTEROFILIA) COLCAPIRHUA	100.000,00	6.240,00	93.760,00	6,24
Actividad	I	22 0000 005	EQUIPAMIENTO DICIPLINAS DEPORTIVAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	150.000,00	0	150.000,00	0,00
Actividad	I	22 0000 006	APOYO JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES	150.000,00	117.488,65	32.511,35	78,33
Actividad	I	23 0000 001	FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES	180.000,00	101.052,04	78.947,96	56,14
Actividad	I	23 0000 002	FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS	30.000,00	0	30.000,00	0,00
Actividad	I	23 0000 003	FOMENTO A LA ACTIVIDAD CULTURAL SAN LORENZO	100.000,00	0	100.000,00	0,00
Actividad	I	24 0000 001	FORTALECIMIENTO A LA VOCACION TURISTICA	50.000,00	8.857,40	41.142,60	17,71
Actividad	I	25 0000 001	FUNCIONAMIENTO SLIMS	150.000,00	36.916,00	113.084,00	24,61
Actividad	I	25 0000 002	APOYO A LA PROMOCION DE GENERO	100.000,00	0	100.000,00	0,00
Actividad	I	25 0000 003	SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES (SLIM) - IDH D.S.2145	43.587,00	0	43.587,00	0,00
Actividad	I	26 0000 001	ACTIVIDAD Y DEFENSORIA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA	150.000,00	52.841,64	97.158,36	35,23
Actividad	I	26 0000 002	PROYECTO ATENCION NIÑA, NIÑO (U.A.I.N.A)	300.000,00	113.006,70	186.993,30	37,67

Actividad	I	26 0000 003	BRIGADA DE PROTECCION A LA FAMILIA (FELCV)	30.000,00	1.509,90	28.490,10	5,03
Actividad	I	26 0000 004	ACTIVIDAD Y CENTRO DEL ADULTO MAYOR	70.000,00	17.706,60	52.293,40	25,30
Actividad	I	26 0000 005	PRAGRAMA DE PROMOCION DE DERECHOS Y CENTRO DEL DISCAPASITADO	70.000,00	3.968,03	66.031,97	5,67
Actividad	I	27 0000 001	FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	1.700.000,00	756.197,64	943.802,36	44,48
Actividad	I	27 0000 002	ACTIVIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	100.000,00	6.115,00	93.885,00	6,12
Actividad	I	27 0000 003	FUNCIONAMIENTO PLANTA MOVIL Y FIJA DE HORMIGON MUNICIPIO COLCAPIRHUA	300.000,00	141.965,94	158.034,06	47,32
Actividad	I	28 0000 001	FUNCIONAMIENTO CONTROL MERCADO CENTRAL DE FERIAS COLCAPIRHUA	200.000,00	69.425,23	130.574,77	34,71
Actividad	I	28 0000 002	MANTENIMIENTO MERCADOS COLCAPIRHUA	150.000,00	0	150.000,00	0,00
Actividad	I	29 0000 001	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO MATADERO MUNICIPAL	350.000,00	83.712,57	266.287,43	23,92
Actividad	I	30 0000 001	SERVICIO Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL	100.000,00	2.105,60	97.894,40	2,11
Actividad	I	31 0000 001	DESASTRES NATURALES	100.000,00	21.200,00	78.800,00	21,20
Actividad	I	31 0000 002	DRAGADO DE TORRENTERAS MUNICIPIO COLCAPIRHUA	200.000,00	18.907,00	181.093,00	9,45
Actividad	I	31 0000 003	LIMPIEZA DE CANALES Y DESBROCE DE TORRENTERAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	200.000,00	35.100,00	164.900,00	17,55
Actividad	I	33 0000 001	APOYO SEGURIDAD CUIDADANA COLCAPIRHUA	500.000,00	113.552,84	386.447,16	22,71
Actividad	I	33 0000 002	MANTENIMIENTO DE MODULOS POLICIALES	100.000,00	16.746,95	83.253,05	16,75
Actividad	I	33 0000 003	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	100.000,00	0	100.000,00	0,00
Actividad	I	33 0000 004	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CUIDADANA	350.000,00	0	350.000,00	0,00
Actividad	I	33 0000 005	SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION VIAL	150.000,00	0	150.000,00	0,00
Actividad	I	34 0000 001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.775.077,00	774.206,99	1.000.870,01	43,62
Actividad	I	34 0000 002	EQUIPAMIENTO ALCALDIA DE COLCAPIRHUA	350.000,00	134.805,00	215.195,00	38,52
Actividad	I	34 0000 003	MANTENIMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES	100.000,00	73.026,86	26.973,14	73,03
Actividad	I	34 0000 004	SANEAMIENTO LEGAL DE ACTIVOS FIJOS Y PROCESOS JUDICIALES	90.000,00	18.173,67	71.826,33	20,19
Actividad	I	34 0000 005	ACTIVIDAD Y DEFENSA DE LOS LIMITES DE COLCAPIRHUA	100.000,00	8.346,60	91.653,40	8,35
Actividad	I	34 0000 006	ACTIVIDAD UNIDAD DE TRANSPARENCIA	50.000,00	24.647,00	25.353,00	49,29
Actividad	I	34 0000 007	REFERENDUM APROBACION DE CARTAS ORGANICAS MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	200.000,00	0	200.000,00	0,00
Actividad	I	34 0000 008	DEFENSA DE LIMITES MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	100.000,00	0	100.000,00	0,00
Actividad	I	34 0000 009	RECATASTRACION DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	100.000,00	0	100.000,00	0,00
Actividad	I	34 0000 010	COMUNICACION Y DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES	100.000,00	3.500,00	96.500,00	3,50
Actividad	I	34 0000 011	EVALUACION TECNICA AL COLISEO SAMANCHA URABI	30.000,00	0	30.000,00	0,00
Actividad	I	34 0000 099	FONDO CONTROL SOCIAL	50.000,00	0	50.000,00	0,00
Actividad	I	97 0000 001	PARTIDAS NO SIGNABLES A PROGRAMAS	2.078.375,00	0	2.078.375,00	0,00
Actividad	I	97 0000 002	PROMOCION Y APOYO DE POLITICAS DE GESTION MUNICIPAL	31.000,00	0	31.000,00	0,00
Actividad	I	97 0000 003	PREVISIONES PARA OTROS BENEFICIOS SOCIALES	100.000,00	0	100.000,00	0,00
Actividad	I	98 0000 001	RENTA DIGNIDAD	1.868.005,00	452.173,24	1.415.831,76	24,21
Actividad	I	98 0000 002	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICA PATRIOTICO	12.453,00	3.014,49	9.438,51	24,21
Actividad	I	97 0000 006	CONST. DE INFRAESTRUCTURA MULTIMODAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE CON PROBLEMAS DE DROGODEPENDENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	693.000,00	0	693.000,00	0,00
Actividad	I	97 0000 008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO REDUCTO-MOYAPAMPA (COLCAPIRHUA) FPS	292.577,00	0	292.577,00	0,00
Actividad	I	98 0000 090	FINANCIAMIENTO SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL	161.179,00	40.333,82	120.845,18	25,02

Actividad	I	99 0000 001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - FUNCIONAMIENTO	540.000,00	0	540.000,00	0,00
Actividad	I	99 0000 002	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - INVERSION	1.626.906,00	392.289,02	1.234.616,98	24,11
		Total Entidad		59.895.823,00	13.898.318,95	45.997.504,05	23,20

<b>DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD</b>						
<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS RESUMEN</b>						
Del 01 de Enero al 31 Mayo 2017						
(Expresado en Bolivianos)						
<b>DESCRIPCION</b>	<b>DIST.</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>SALDO</b>	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	
DISTRITO	A	2.502.000,00	255.437,15	2.246.562,85	10,21	
DISTRITO	B	3.210.000,00	622.307,90	2.587.692,10	19,39	
DISTRITO	C	1.843.000,00	372.367,19	1.470.632,81	20,20	
DISTRITO	D	1.560.000,00	164.293,00	1.395.707,00	10,53	
DISTRITO	E	2.570.500,00	256.487,91	2.314.012,09	9,98	
INSTUCIONAL	I-II	95.333.778,05	21.820.636,43	73.513.141,62	22,89	
	TOTAL	107.019.278,05	23.491.529,58	83.527.748,47	21,95	
	OK	107.019.278,05	23.491.529,58	83.527.748,47	21,95	

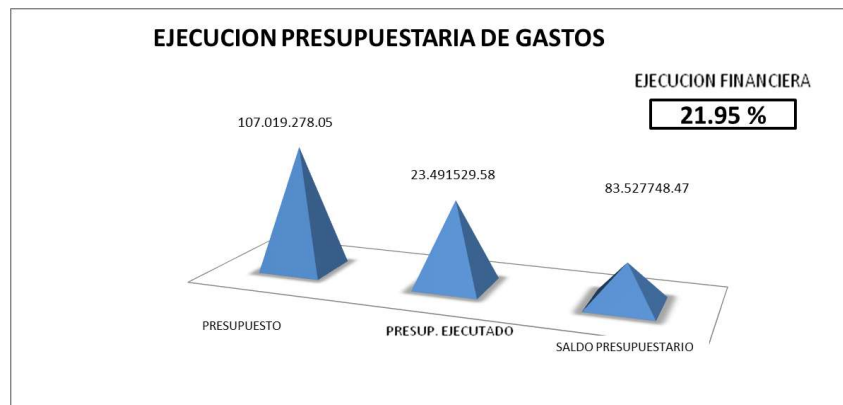


DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD					
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR MES					
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2017 (Expresado en Bolivianos)					
DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DIFERENCIA	EJECUTADO	% AVANCE FINANCIERO MESUAL
ENERO	93.354.548,00	107.019.278,05	13.664.730,05	352.914,66	0,33
FEBRERO	93.354.548,00	107.019.278,05	13.664.730,05	3.312.983,08	3,10
MARZO	93.354.548,00	107.019.278,05	13.664.730,05	5.652.486,40	5,28
ABRIL	93.354.548,00	107.019.278,05	13.664.730,05	7.102.338,67	6,64
MAYO	93.354.548,00	107.019.278,05	13.664.730,05	7.070.806,77	6,61
JUNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPTIEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCTUBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVIEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DICIEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	93.354.548,00	107.019.278,05	13.664.730,05	23.491.529,58	21,95
	93.354.548,00	107.019.278,05	13.664.730,05	23.491.529,58	21,95



DIR. DE FINANZAS-JEFATURA DE CONTABILIDAD				
% REAL DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS VS GASTOS				
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2017				
(Expresado en Bolivianos)				
DESCRIPCION		RECURSO PERCIBIDO	PAGOS REALIZADOS	% AVANCE REAL
	Transferencias de Recursos Especificos / Otros Recursos Especificos	0,00	0,00	0,00
SUB T O T A L E S RECAUDACION REALIZADA		28.039.510,12	23.491.529,58	55,88
Saldo Caja Bancos para la gestion 2017		14.000.000		
T O T A L E S		42.039.510	23.491.530	55,88



## **% EJECUCION REAL 55,88**

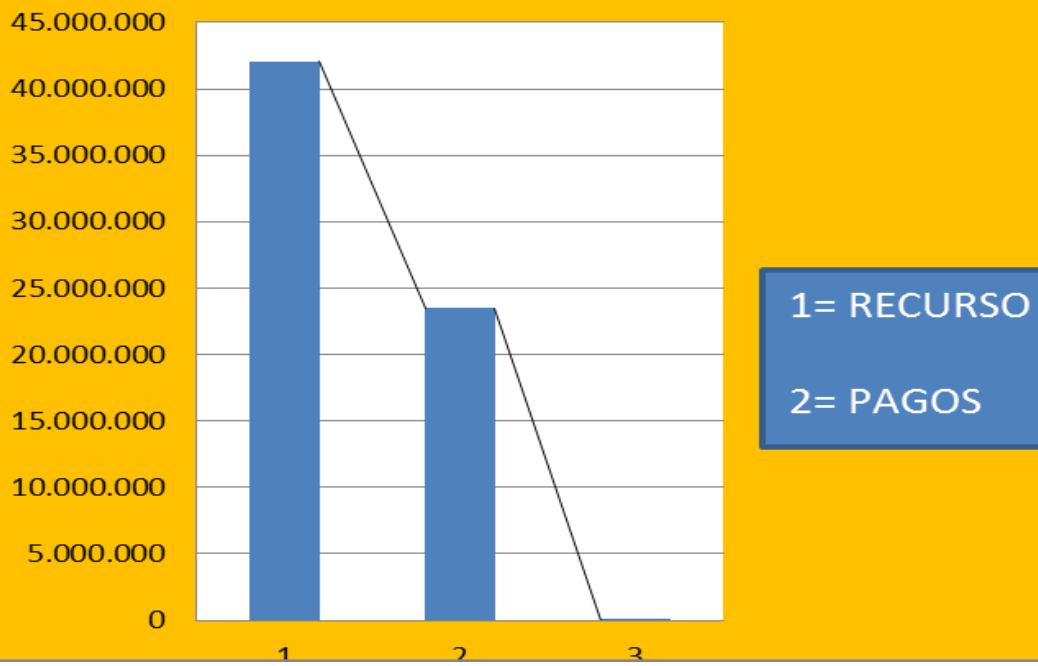


## II.1.1 JEFE DE INGRESOS

Roberto Terán Caballero

### RECAUDACION MENSUAL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES ENERO A JUNIO 2.017

FECHA	IMP. INMUEBLES	IMP. TRANSF.	TOTAL
ENERO 2017	285.574,00	350.527,00	636.101,00
FEBRERO 2017	383.823,00	367.126,00	750.949,00
MARZO 2017	675.089,00	398.370,00	1.073.459,00
ABRIL 2017	334.288,00	293.142,00	627.430,00
MAYO 2017	921.281,00	286.736,00	1.208.017,00
JUNIO 2017	1.380.000,00	720.314,00	2.100.314,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.980.055,00</b>	<b>2.416.215,00</b>	<b>6.396.270,00</b>

### RECAUDACION MENSUAL BIENES INMUEBLES ENERO A JUNIO



## **CEMENTERIO GENERAL**

El cementerio general de Colcapirhua, se constituye en uno de los centros más importantes de nuestra población ya que de alguna manera todos los colcapirhuños nos constituimos en este lugar, es por esta razón que la administración ha ido realizando mejoras dentro del cementerio, garantizando el agua potable, incrementando brigadas de limpieza periódicas, mejorando las vías de acceso y el mantenimiento de las áreas verdes de igual forma con la firme intención de ofrecer un mejor servicio para los enterratorios se ha procedido con la construcción del mausoleo Municipal que ofrece nichos de enterratorio y de perpetuidad que están al servicio de nuestra población.

Se constituye en otra fuente de recaudación de ingresos, por concepto de Inhumaciones, Exhumaciones, Autorización de traslado, Certificaciones de Óbito, Alquiler de nichos, Mantenimiento de mausoleo y de nichos de perpetuidad, Trabajos menores y otros.

## **MATADERO MUNICIPAL**

El Matadero municipal de Colcapirhua, al ser parte de la Jefatura de Ingresos tiene como función principal velar por la salud de la población, en la inocuidad alimentaria del consumo de carne bovina, dando cumplimiento a todos los requisitos de adecuación en el proceso de faenado e infraestructura exigidos por el SENASAG, además del correcto manejo e importancia de la salud animal, que conllevan a buenas practicas antes y después de sacrificar al ganado para faenado.

El ingreso económico que tiene el Matadero municipal es de 26.- Bs. (Veintiséis 00/100 Bolivianos), por cabeza faenada por concepto de los siguientes servicios i/o acciones: recepcionado, resguardado, evaluado, sacrificado, procesado y despachado al consumidor.

La importancia del matadero reside es la producción de carne preparada de manera higiénica mediante la manipulación humana de los animales en lo que respecta al empleo de técnicas higiénicas para el sacrificio de los animales y la preparación de canales mediante una división estricta de zonas “limpias” y “sucias”.



## OTROS INGRESOS


En un trabajo coordinado entre la Jefatura de Ingresos e Intendencia municipal se realiza el control a locales de expendio de bebidas alcohólicas, lugares de comercio, pensiones y otros, en su caso procede con las clausuras y multas aquellas que cometan infracciones o funcionen sin licencias de funcionamiento, así mismo el cobro de sentaje a las actividades económicas, la limpieza en los mercados de abasto donde se realizan el control de pesa y medidas, etc.

## OTRAS ACTIVIDADES

- Elaboración de Licencias, registró computarizado de pagos, pre – liquidación de cobros Mercado, Cementerio, Licencias, Elaboración Chicha, Tasas de mantenimiento, Recojo de Basura.
- Recepción y VoBo informes de cobros de Mercado, Faeneo de Ganado, Centro de Salud.
- Coordinación con otras Direcciones y Jefaturas en actividades que estas llevan a cabo (Festividades, Ferias, eventos difusión, entrega de invitaciones, etc.)
- Se realiza la revisión de los reportes de las recaudaciones diarias de todos los reportes así como los respaldos de cada pago para posteriormente remitir a la Jefatura de Contabilidad para su revisión y registro al sistema contable y archivo correspondiente.

### RECAUDACION DE INGRESOS POR RUBROS

VENTA DE SERVICIOS POR LA ADMINISTRACION PUBLICA	770.335,15
ALQUILER	47.369,00
INGRESOS TRIBUTARIOS	6.658.063,00
TASAS	661.273,00
PATENTES	484.392,00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.421,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.669.853,15</b>



## CUADRO RESUMEN DE RECAUDACIONES

DE 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2.017

(Expresado en Bolivianos)

RUBRO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL RECAUDAC
<b>12000</b>		<b><u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u></b>		
12200		<b><u>Venta de Servicios de las Administraciones Publicas</u></b>		<b>770.335,15</b>
12200	122000-001	Venta de Sitios de Cementario.	64.712,00	
12200	122000-002	Venta de Valores Municipales	47.757,00	
12200	122000-003	Timbres	113.990,00	
12200	122000-004	Pase de Inmumacion y Exhumacion	23.422,00	
12200	122000-005	Venta de Servicios Hospitalarios	454.041,15	
12200	122000-006	Limpieza Publica	59.918,00	
12200		Venta de Medicamentos	0,00	
12200		Venta de Plantas	0,00	
12200	122000-007	Resolucion Municipal	6.495,00	
<b>12300</b>		<b><u>ALQUILER</u></b>		<b>47.369,00</b>
12300	123000-001	Alquiler de Puestos	47.369,00	
<b>13000</b>		<b><u>INGRESOS TRIBUTARIOS</u></b>		<b>6.658.063,00</b>
13310	133000-001	Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles	2.997.796,00	
13330	133000-002	Impuesto a la Propiedad de Vehiculos Automotores	1.298.825,00	
13360	133000-003	Impuesto Municipal a la Transferencias de Bienes Inmueble	1.961.403,00	
13370		Impuesto Municipal a la Transferencias de Vehiculos Autom	396.309,00	
13390	133000-004	Impuesto a la Produccion de Chicha	3.730,00	
13360		Otras Cuentas por Cobrar a cortro plazo	0,00	
<b>15100</b>		<b><u>TASAS</u></b>		<b>661.273,00</b>
15100	151000-001	Aprobacion de Planos	329.333,00	
15100	151000-002	Visacion de Minutas	13.625,00	
15100	151000-003	Autorizacion de Trabajos Menores	7.001,00	
15100	151000-004	Migitorio	34.799,00	
15100	151000-005	Aforacion de pesas y medidas	12.592,50	
15100	151000-006	Reposicion de Comprobantes.	9.714,00	
15100	151000-007	Servicio de Conexión de Alcantarrillado Sanitario	126.099,50	
15100	151000-008	Por Uso de Alcantarrillado	128.109,00	
<b>15340</b>		<b><u>PATENTES</u></b>		<b>484.392,00</b>
15340	154000-001	Patente de Funcionamiento	328.318,00	
15340	154000-002	Patente de Funcionamiento de Espectaculos Publicos	9.070,00	
15340	154000-003	Patente de Trans de Ganado	69.006,00	
15340	154000-004	Sentaje	63.553,00	
15340	154000-005	Feria de la Jackalawa	14.445,00	
<b>15900</b>		<b><u>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS PROPIOS</u></b>		<b>48.421,00</b>
15910	159000-001	Multas y Recargos	45.178,00	
15910	159000-002	Multa por Mora de Pago de Impuestos	0,00	
15990	159900-001	Otros (Alumbrado Publico)	3.243,00	
15990	159900-002	Otros		
15990	159900-003	Otros (Contraparte OTBs)	0,00	
<b>23000</b>		<b><u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u></b>		<b>0,00</b>
23110		de Unidades Familiares ( Aportes de Beneficiarios )		
		<b>TOTAL RECAUDADO Bs.</b>		<b>8.669.853,15</b>
<b>TOTAL IRPPB</b>		6.658.063,00		
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS DEPOSITOS</b>		254.208,50		
<b>TOTAL RECURSOS PROPIO</b>		1.757.581,65		
<b>TOTAL</b>		<b>8.669.853,15</b>		

## II.1.1.1 INTENDENTE MUNICIPAL.

**Alfredo Zambrana**

MES DE LA INSPECCION	ACTIVIDADES A REALIZAR	CONCLUSIONES
<b>CONTROL E INSPECCION EN LA FERIA DE LA JAKA LAWA MES FEBRERO</b>	Se realizó un control riguroso, juntamente con Ingresos, Intendencia y Salubridad se controló precios, higiene, y avances de sus puestos.	Se realizó el control respectivo, y se pasó la feria sin ninguna novedad
<b>MES DE FEBRERO</b>	<p><b><u>UNIDADES EDUCATIVAS</u></b>            Se inspecciono a todas las unidades Educativas de nuestro municipio de Colcapirhua como ser:            U.E. DON BOSCO            U.E. 15 DE ABRIL            U.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ            U.E. SAN JOSE KAMI            U.E. BENEDICTO DURAN            U.E. SAGRADA FAMILIA            U.E. SAUSALITO            U.E. PADRE ANDRES CUSCHERI            U.E. PABLO CANO GALBARRO            U.E. DANIEL SALAMANCA            U.E. FERROVIARIA            U.E. SIMON BOLIVAR            U.E. SAN LORENZO            U.E. JESUS LARA            U.E. 27 DE MAYO            U.E. CRISTIANO COLCAPIRHUA</p> <p><b><u>Y TAMBIEN TALLERES INICIALES</u></b>             SEMILLITA            P.E.P.E</p>	Se procede a realizar las inspecciones en todas las unidades educativas del municipio de Colcapirhua donde se pudo observar dejades por parte de las porteras en algunas unidades educativas se dejaron las correspondientes citaciones y se proporcionó los informes a los directores de las unidades educativas para que ellos también puedan dar sus sanciones correspondientes a sus porteras también cabe recalcar que en muchas de las unidades educativas falta la implementación de material de limpieza y sus respectivos basureros para sus baños.
<b>MES DE FEBRERO</b>	<p><b><u>OPERATIVO DE LOCALES Y CHICHERIAS</u></b>             En fecha 03/02/2017 se procede a realizar operativo sorpresa en la jurisdicción de Colcapirhua con el objetivo de realizar seguridad a todos los ciudadanos colcapirhueños se revisaron inspección a locales, moteles, naigh club bola 8 y chicherías</p> <p><b><u>INFORME DECOMISO DE LETREROS</u></b>             Después de notificar a los distintos comercios que exponen sus letreros por toda la avenida blanco Galindo en fecha 07/02/2017 se procede a realizar el decomiso respectivo de los letreros</p> <p><b><u>INFORME MOTEL OKEY</u></b></p>	<p>Se da respuesta a la hoja de ruta de la señora Carmen Rosa Ali quien solicitaba un padrón municipal el cual no se dio curso por no contar con los implementos necesarios para un padrón</p> <p>Dando cumplimiento a la ley 259 de control de expendio de consumo de bebidas alcohólicas se procede a la inspección de los distintos locales y chicherías del municipio de Colcapirhua</p> <p>De la misma forma se procedió a realizar el decomiso de los letreros de la avenida blanco Galindo ya que en dos ocasiones se les proporciono la ordenanza municipal N° 83/2012 que</p>

<p>MES DE MARZO</p>	<p>En fecha 03/02/2017 se procede a realizar una inspección al motel okey donde se pudo encontrar la presencia de menores de edad e infraestructura en mal estado, por lo cual se deja citación y se procede a clausurar</p> <p><b><u>OPERATIVO LOCALES Y CHICHERIAS</u></b></p> <p>En fecha 13/03/2017 se procede de la misma forma a realizar un operativo sorpresa a los locales y chicherías de todo el municipio de Colcapirhua así también se inspecciona la chichería del señor Milán ubicado en barrio Kami</p> <p><b><u>INFORME HOJA DE RUTA N° 0540</u></b></p> <p>Se procede a realizar una inspección sorpresa a la chichería ubicada en Barrio Kanaut y Martin Cárdenas, se procede a la clausura de la misma por atender fuera de horario de atención y por no contar con licencia de funcionamiento</p> <p><b><u>INSPECCION MATADERO CLANDESTINO</u></b></p> <p>En fecha 12/03/2017 se procede a inspeccionar el trozadero de la señora Gabriela Cabrera quien cuenta con un domicilio particular el cual lo utiliza como trozadero y el día que procedimos a realizar la inspección se encontró en la misma, faeneando vacas, el lugar no cuenta con los implementos, ni las condiciones mínimas para su funcionamiento se procede a la clausura</p> <p><b><u>LIMPIEZA GENERAL DEL MERCADO</u></b></p> <p>Se procede a realizar la limpieza general de los pasillos principales del mercado central de Colcapirhua</p> <p><b><u>CERTIFICACION PARA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO LA BOLA 8</u></b></p> <p>Después de realizar las correspondientes inspecciones a pedido del señor Wilson Garey quien pide la inspección para la renovación de su licencia de funcionamiento, después de haber cumplido con todas las falencias que había en dicho lenocinio</p> <p>Se procede a la segunda inspección en fecha 21/03/2017 donde el dueño del local ya había realizado todas las mejoras del lugar</p> <p><b><u>INSPECCION Y CLAUSURA CHURRASQUERIA DOÑA FELY</u></b></p> <p>En fecha 20/03/2017 se realiza una inspección rutinaria a la churrasquería doña feli ubicado en la avenida blanco Galindo en la calle cleomedes blanco</p>	<p>estipula la prohibición de cualquier tipo de material en calzadas, aceras. Haciendo caso omiso a la ordenanza y por no cumplir se procede al retiro de dichos letreros</p> <p>En el operativo realizado se encontró algunas irregularidades en el motel por lo cual se procede a dejar citación al dueño del motel y se realiza la respectiva clausura</p> <p>Dando cumplimiento a la ley 259 de control y expendio de consumo de bebidas alcohólicas se procede a la inspección de locales de la jurisdicción de Colcapirhua se procede a clausurar el local san Lucas por no contar con licencia de funcionamiento</p> <p>Se procede a la inspección de la chichería la cual se encontraba atendiendo fuera de horario permitido y no contaba con licencia de funcionamiento se procede a desalojar a todas las personas que se encontraban bebiendo y se procede a la clausura del mismo</p> <p>Ya teniendo antecedentes anteriores se procede a inspeccionar el trozadero y matadero clandestino de la señora Gabriela se encuentra faeneado por lo cual se procede a clausurar por no contar con las implementaciones mínimas para el faeneado</p> <p>Se procede a la limpieza de los pasillos principales del mercado central de Colcapirhua para dar un mejor aspecto a los visitantes del mercado</p> <p>Se da la correspondiente certificación del lenocinio ya que después de las recomendaciones y mejoramiento de los ambientes, cumple con todos los requisitos necesarios para su funcionamiento</p>
-----------------------------	--	---

<p>MES DE ABRIL</p>	<p>Se realiza la respectiva inspección donde se encuentran muchas falencias y también no contaba con licencia de funcionamiento por lo cual se procede a la clausura</p> <p><b><u>INFORME UNIDAD EDUCATIVA BENEDICTO DURAN</u></b></p> <p>En fecha 30/03/2017 se procede a la inspección de la unidad educativa Benedicto Duran donde se pudo encontrar una serie de irregularidades por lo cual se procede a revisar los productos que vende a los escolares se decomisa productos chinos como ser krapulitos por no contar con registro sanitario Se deja citación por venta de productos chinos sin registro sanitario y por falta de higiene en su cocina</p> <p><b><u>OPERATIVO BALNEARIO LA FRONTERA</u></b></p> <p>Se procede a una inspección ha llamado de los vecinos de la otb san Idelfonso en contra del balneario la frontera ya que supuestamente se encontraban bebiendo personas menores de edad y había muchos borrachos en la calle</p> <p><b><u>INFORME CHICHERIA DOÑA TRUDI</u></b></p> <p>A denuncia de vecinos de la zona de kaspichaca nos constituimos a la chichería de la señora trudi quien supuestamente atiende desde tempranas horas, hasta altas horas de la noche en el momento de la inspección no se encontró ninguna persona tomando, pero se procedió a la clausura por no contar con licencia de funcionamiento</p> <p><b><u>CONTROL A PENSIONES</u></b></p> <p>se procede a realizar la inspección de las distintas pensiones del municipio de Colcapirhua</p> <p><b><u>CONTROL A SECCION ABARROTES</u></b></p> <p>En fecha 21/05/2017 se procede a realizar control rutinario de las comerciantes del sector de abarrotes donde se procedió a decomisar productos vencidos</p> <p><b><u>INSPECCION CHICHERIAS MAÑANERAS</u></b></p>	<p>En operativo sorpresa se procede a realizar la inspección correspondiente de la churrasquería doña feli en la cual se encuentran irregularidades como ser presencia de vectores y no contaba con licencia de funcionamiento se procede a realizar la clausura de la misma</p> <p>A denuncia de los padres de familia de esta unidad educativa y las quejas constantes se procede a realizar la inspección rutinaria de la portería de la unidad educativa donde se encontraron una serie de irregularidades se deja la correspondiente citación a la portera para que se presente en intendencia</p> <p>Se procede a la inspección donde no se encontró ninguna irregularidad procedimos a retirarnos</p> <p>Se procede a la inspección de las distintas chicherías mañaneras quienes no cumplen con los horarios establecidos de atención por lo cual se procede al decomiso de algunos enceres y se procede a la clausura de los mismos</p> <p>Se pudo observar irregularidades en mucha de las pensiones que ingresamos como ser falta de indumentaria para la atención se procede a dejar citaciones a todas aquellas que no cumplían con la indumentaria correcta</p> <p>Realizando nuestro control rutinario se procede a realizar la inspección asector abarrotes del mercado central de Colcapirhua se pudo encontrar productos vencidos y procedió a dejar citaciones a las distintas comerciantes</p>
<p>MES DE MAYO</p>	<p>En fecha 29/05/2017 se procede a realizar las inspecciones de los locales de las distintas chicherías</p>	

<p><b>MES DE JUNIO</b></p>	<p>de la zona sud y norte se clausura la local doña mikicha, y el local de don Víctor. También se realizaron inspecciones en fecha 11/05/2017 y también en fecha 02/06/20107 en los locales de las distintas chicherías y locales de toda nuestra jurisdicción de Colcapirhua</p>	<p>Dando cumplimiento a la ley 259 de control y expendio de consumo de bebidas alcohólicas se procede a la inspección de locales de la jurisdicción de Colcapirhua se procede a clausurar el local doña mikicha por no contar con licencia de funcionamiento y atender fuera del horario establecido</p>
----------------------------	---	--

## II.1.2 JEFE DE CONTABILIDAD

**Lic. Osvaldo Marca**

### II.1.2.1 ACTIVOS FIJOS

**Jimena Tapia Orozco**

La unidad de Activos Fijos del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua tiene las funciones, actividades y procedimientos; de administrar todos los bienes de propiedad de la institución, ingresar incorporaciones, asignar bienes, proceder con los mantenimientos requeridos, salvaguardar, controlar y registrar todos los bienes, considerando que su valor sea considerable y su vida útil supere a un año, con el objetivo de conservar la integridad Patrimonial del Municipio.

Durante el primer semestre de la gestión 2017 se obtuvo los siguientes resultados: Se efectuaron **adquisiciones e incorporaciones** comprendidas entre; Equipos de Computación, muebles y equipos de oficina, equipo educacional y recreativo, otras maquinarias, equipos médicos de laboratorio cuyos destinos fueron al Sector Central Administrativo, Sector Salud, Sector Educativo y Otros:

- Destacando al **SECTOR EDUCATIVO**; Se procedió a realizar la entrega de 9 equipos de computación, destinado a la Biblioteca Virtual Municipal.  
Se procedió a la entrega de mobiliario escolar para nivel primario y nivel secundario de las Unidades Educativas del Municipio de Colcapirhua.  
Entrega de microscopios, Máquinas de Coser, estantes, escritorios para las diferentes Unidades Educativas del Municipio.  
Entrega de mesas y sillas iniciales y refrigeradores para los 5 Centros Infantiles del Municipio.
- En el **SECTOR DE ADMINISTRACIÓN**; Se registraron las adquisiciones de equipamiento para la Unidad de Zoonosis, Unidad de Transportes, Máquinas de Coser para el taller de Costura, Maquinas para el Taller de Mecánica, muebles de oficina para la Dirección de Desarrollo Productivo, Unidad de Slim, Unidad de Deportes, Unidad de Contrataciones y Dirección de

Planificación, equipo de computación para la Unidad de Matadero, adquisición de handys para diferentes áreas técnicas y administrativas.

Se adjunta detalle de Activos Fijos adquiridos en la gestión 2017 en 2 páginas.

En el Sector del **PARQUE AUTOMOTOR**, se procedió a la contratación de seguros contra robos, incendios, pérdidas, siniestros y otros a fin de prevenir riesgos de pérdida económica al Municipio.

Actualmente el Municipio cuenta con el siguiente Parque Automotor:

Nº	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD
1	CAMIONETAS PATRULLERAS	5
2	MOTOCICLETAS PATRULLERAS	9
3	CAMIONETAS	5
4	VAGONETAS	3
5	AMBULANCIAS	7
6	VOLAQUETAS	8
7	CARROS COMPACTADORES	2
8	CAMIONES (CISTERNA Y CARRO BALDE)	2
9	EQUIPO PESADO	12
10	MOTOCICLETAS	40
11	CAMIONES HORMIGONEROS	3
12	TRACTORES	4
13	BUS MUNICIPAL	1
14	VEHICULOS DE DIRCABI	8
<b>TOTAL PARQUE AUTOMOTOR:</b>		<b>109</b>

- En el sector de los **BIENES INMUEBLES** durante el primer semestre de la gestión 2017 se coadyuvo con la Dirección de Asesoría Legal el Saneamiento de la Documentación Legal de los bienes inmuebles a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua de predios existentes con matriculación y registro catastral, a la presente se adjunta reporte de predios en 10 páginas.

El desarrollo de actividades que efectúa la unidad de Activos Fijos es en base a las disposiciones que establece el Sub Sistema de Manejo de Bienes del Decreto Supremo **0181 NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS NB-SABS** y el manejo del Sistema de Información de Administración Activos Fijos (SIAAF).

Actualmente se cuenta con inventario de todos los Activos Fijos de los 3 Sectores: Administración Municipal (Edificio Municipal, Secretaria Técnica, Zoonosis, Intendencia, Transportes, Matadero, Seguridad Ciudadana y otros), Salud y Educación, con la descripción de las características del bien, su codificación individualizada, su estado de conservación y/o obsolescencia, para permitir identificar la ubicación y en custodia de que servidor público se encuentran los bienes.

A continuación se detalla por cuentas contables, el ingreso al Patrimonio del Municipio desde el mes de Enero a Junio de 2017.

<b>Nº</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>INCORPORACION GESTION 2017 (enero – junio)</b>
<b>1</b>	<b>Equipo de oficina y muebles</b>	<b>219.725 BS.-</b>
<b>2</b>	<b>Equipo médico y de laboratorio</b>	<b>15.853 BS.-</b>
<b>3</b>	<b>Equipo de comunicaciones</b>	<b>40.240 BS.-</b>
<b>4</b>	<b>Equipo educacional y recreativo</b>	<b>17.340 BS.-</b>
<b>5</b>	<b>Otra maquinaria y equipo</b>	<b>193.633,81 BS.-</b>
<b>Total: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 81/100 BOLIVIANOS</b>		<b>486.791,81 BS.-</b>

### **II.1.2.2 ENCARGADO DE RUAT a.i. José L. Fernández Huanca**

**Los objetivos de la Unidad de Ruat son:**

- Dotar de información y asesoramiento a los contribuyentes para que puedan realizar con éxito sus trámites en general.
- Administrar el sistema de Rua-Net para la realización de registros de los diferentes trámites demandados por los contribuyentes en general.
- Generar en coordinación con la máxima autoridad, la habilitación de nuevos roles para una mejor atención al contribuyente o propietario.
- Ser la instancia de información tributaria municipal de vehículos automotores.

### **TRAMITES ATENDIDOS**

Entre los trámites realizados por la Unidad de Ruat, correspondiente del 31 de mayo de 2017, se detallan a continuación:



**TRAMITES ATENDIDOS**  
(01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017)

DESCRIPCION DE TRAMITES ATENDIDOS	N ° DE TRAMITES
ACTUALIZACION CRPVA	1
ANULACION REGISTRO OBSERVADOS	34
CAMBIO RADICATORIA	124
CAMBIO RADICATORIA, TRANSFERENCIA	134
CAMBIO SERVICIO - PUBLICO	104
CONTINUAR TRANSFERENCIA	101
DESCUENTOS ARTICULO 156 IP	63
DUPLICADO CERTIFICADO PROPIEDAD	3
DUPLICADO PLACA Y PLAQUETA MOTOCICLETA	4
DUPLICADO PLACA Y PLAQUETA VEHICULO	6
EXENCIONES VEHICULOS	0
HABILITACION PARA LIQUIDACION	1
INSCRIPCION CASA COMERCIAL MOTOCICLETA	28
INSCRIPCION CASA COMERCIAL MOTOCICLETA, TRANSFERENCIA	0
INSCRIPCION CASA COMERCIAL VEHICULO	218
INSCRIPCION IMPORTACION DIRECTA MOTOCICLETA	9
INSCRIPCION IMPORTACION DIRECTA MOTOCICLETA, TRANSFERENCIA	7
INSCRIPCION IMPORTACION DIRECTA VEHICULO	78
INSCRIPCION IMPORTACION DIRECTA VEHICULO, TRANSFERENCIA	4
MODIFICACION DATOS TECNICOS	3
MODIFICACION DATOS TECNICOS OPERADOR	23
PRESCRIPCION	1
REGISTRO BASES IMPONIBLES	57
REGISTRO DE PLAN DE CUOTAS	8
REGISTRO OBSERVADOS	3
TRANSFERENCIA NORMAL	54
<b>TOTAL TRAMITES ATENDIDOS</b>	<b>1068</b>

**RECAUDACIÓN**

Referente a la recaudación generada del 01 de enero al 31 de mayo de 2017, son por concepto de Impuestos a la Propiedad de Vehículos, Impuesto a la Transferencia de Vehículo Automotor y Recibos y/o Tasas, que los mismos se detalla a continuación:

RECAUDACION 2017				
MES	RECAUDACION BRUTO	COMISION		RECAUDACION NETO
		RUA	BANCO	
ENERO	382.351,00	14.420,30	3.441,21	364.489,49
FEBRERO	295.298,00	13.908,58	2.657,60	278.731,82
MARZO	255.270,00	17.242,33	2.297,33	235.730,34
ABRIL	282.388,00	14.158,66	2.591,42	265.687,92
MAYO	479.827,00	18.670,86	4.318,32	456.837,82
<b>TOTAL</b>	<b>1.695.134,00</b>	<b>78.400,73</b>	<b>15.305,88</b>	<b>1.601.477,39</b>

Recaudación por concepto como ser Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, Impuesto de Transferencias y Tasa por cada trámite.

RECAUDACION 2017					
MES	CONCEPTO	RECAUDACION BRUTO	COMISION		RECAUDACION NETO
			BANCO	RUA	
ENERO	IMPUESTOS	291.306,00	2.621,94	5.767,86	282.916,20
	TRANSFERENCIA	71.739,00	645,65	1.420,44	69.672,91
	TASAS	19.306,00	173,62	7.232,00	11.900,38
FEBRERO	IMPUESTOS	226.985,00	2.042,93	4.494,26	220.447,81
	TRANSFERENCIA	45.017,00	405,19	891,32	43.720,49
	TASAS	23.296,00	209,48	8.523,00	14.563,52
MARZO	IMPUESTOS	149.281,00	1.343,68	2.955,77	144.981,55
	TRANSFERENCIA	70.836,00	637,57	1.402,56	68.795,87
	TASAS	35.153,00	316,08	12.884,00	21.952,92
ABRIL	IMPUESTOS	225.851,00	2.032,76	4.471,86	219.346,38
	TRANSFERENCIA	32.565,00	293,10	644,80	31.627,10
	TASAS	23.972,00	215,56	9.042,00	14.714,44
MAYO	IMPUESTOS	405.402,00	3.648,69	8.027,07	393.726,24
	TRANSFERENCIA	47.565,00	428,10	941,79	46.195,11
	TASAS	26.860,00	241,53	9.702,00	16.916,47
<b>TOTAL</b>		<b>1.695.134,00</b>	<b>15.255,88</b>	<b>78.400,73</b>	<b>1.601.477,39</b>

RESUMEN DE LA RECAUDACION 2017				
CONCEPTO	RECAUDACION BRUTO	COMISION		RECAUDACION NETO
		BANCO	RUA	
IMPUESTO A LA PROPIEDAD	1.298.825,00	11.690,00	25.716,82	1.261.418,18
IMPUESTO A LA TRASNFERENCIA	267.722,00	2.409,61	5.300,91	260.011,48
RECIBOS - TASAS	128.587,00	1.156,27	47.383,00	80.047,73

TOTAL	1.695.134,00	15.255,88	78.400,73	1.601.477,39
-------	--------------	-----------	-----------	--------------

## REGISTRO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Referente al parque automotor que se tiene registrado en el Municipio de Colcapirhua es como se detalla a continuación:

VEHICULOS					
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA					
PARQUE AUTOMOTOR CLASIFICADO POR CLASE Y SERVICIO (VEHICULOS CON RADICATORIA DEFINIDA)					
AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017					
ALCALDIA	CLASE	OFICIAL	PARTICULAR	PUBLICO	TOTAL
COLCAPIRHUA	AUTOMOVIL		1265	42	1307
	CAMION	10	442	379	831
	CAMIONETA	13	863	26	902
	FURGON		31	9	40
	JEEP	1	168	1	170
	MICROBUS		23	18	41
	MINIBUS		269	152	421
	MOTO	40	1301		1341
	OMNIBUS	1	13	23	37
	QUADRATRACK		4		4
	TORPEDO			1	1
	TRACTO-CAMION	1	58	458	517
	VAGONETA	10	2605	144	2759
<b>TOTAL</b>		<b>76</b>	<b>7043</b>	<b>1252</b>	<b>8371</b>

## ENCARGADO DE FISCALIZACIÓN

Dr. Gustavo Gantier

Con respecto a los inmuebles que se encuentran con irregularidades o mora tributaria, situación por la que, mediante el área de Fiscalización y Ejecución tributaria, se procedió a dar inicio a los Procesos de Fiscalización a las personas naturales y jurídicas propietarias de los inmuebles mencionados, emitiéndose 24 órdenes de fiscalización entre personas jurídicas y naturales. Se realizó el primer embargo a un predio que estaba en etapa de ejecución tributaria, que ya se llegó a concluir porque contribuyente cancelo la totalidad de la deuda.

Hasta la fecha **74 ORDENES DE FISCALIZACIÓN** los cuales se encuentran notificados, en etapa de verificación y algunos concluidos, mismos que deben cumplir con los plazos y procedimiento establecidos en el Art. 95 al 100 y 104 de la Ley 2492,

Asimismo, cabe mencionar que algunos de los Procesos de Fiscalización iniciados se encuentran ya en etapa de Vista de Cargo y Resolución Determinativa debidamente notificados, en los cuales se

pudo evidenciar y determinar el mal pago que realizaban el sujeto pasivo, procediendo a detallar a continuación los mismos y el monto de recuperación de la mora tributaria:

#### CONTRIBUYENTES CON DEUDA DETERMINADA

Nº	Contribuyente	Nº Proceso	Resolución	Monto a cancelar (Bs)
1	J AND J INDUSTRIES S.A.	M-051/2016	Resolución Determinativa Nº 01/2017	3'143.062.-
2	ZAMBRANA DE MANICONE GERTRUDYS EDITH	M-005/2016	Resolución Determinativa Nº 01/2016	1'146.099.-
3	MARCELO VIDAL CANEDO	M-044/2016	VISTA DE CARGO Nº 17/2017	1.322.-
4	ALBINA CANEDO VDA. DE VIDAL	M-042/2016	VISTA DE CARGO Nº 16/2017	1'026.372.-
5	FREDY VIDAL CAMACHO	M-043/2016	VISTA DE CARGO Nº 18/2017	1.722.-
6	MOTEL SWEET DREAMS	M-013/2016	VISTA DE CARGO Nº 06/2017	520.271.-
7	RAMIRO AYALA FLORES Y HNOS.	M-041/2016	VISTA DE CARGO Nº 15/2017	236.386.-
8	CRISTEMBO SRL	M-002/2016	TITULO EJECUCION	1'304.710.-
9	MOTEL NIGTH DAY	M-012/2016	VISTA DE CARGO Nº 01/2017	159.507.-
<b>TOTAL</b>				<b>7.539.351</b>

#### FISCALIZACION CONCLUIDA

Nº	Contribuyente	Nº Proceso	Resolución	Monto a cancelar (Bs)
1	ACUÑA SOLIS LIZETH SOLEDAD Y ACUÑA de SOLIS GASTON DAVID	M-010/2016	Resolución Determinativa Nº 02/2016	14.630
2	MOROCCO TOLA LUCIO	M-064/2016	Orden De Fiscalización	1752
3	INDUSTRIAS MADERERA SALI	M-003/2016	VISTA DE CARGO	44.386
4	INDUSTRIAS MADERERA SALI	M-004/2016	VISTA DE CARGO	76.186
5	IGNACIO DAZA PORUGUEZ Y SOFIA ROSSEL	M-028/2016	VISTA DE CARGO Nº 12/2017	169.789
6	CHOQUE CASTRO RAFAEL	M-087/2016	VISTA DE CARGO Nº 11/2017	282.950
7	RUDY CASTELLON Y MARY NANCY GARCIA	M-027/2016	VISTA DE CARGO Nº 02/2017	225.167
8	JORGE PEREDO ZELADA	M-036/2016	VISTA DE CARGO Nº 07/2017	678
9	TERESA ZELADA DE PEREDO	M-037/2016	VISTA DE CARGO Nº 05/2017	11.620
10	TERESA ZELADA VDA. DE PEREDO	M-035/2016	VISTA DE CARGO Nº 04/2017	7.116
11	ELIZABETH Y JORGE PEREDO ZELADA	M-034/2016	VISTA DE CARGO Nº 06/2017	17.857

12	CARMEN CAMACHO VALENZUELA	M-038/2016	VISTA DE CARGO N° 03/2017	5.316
13	VETERQUIMICA BOLIVIANA	M-030/2016	VISTA DE CARGO N° 07/2017	31.810
14	VETERQUIMICA BOLIVIANA	M-052/2016	VISTA DE CARGO N° 09/2017	83.574
15	VETERQUIMICA BOLIVIANA	M-053/2016	VISTA DE CARGO N° 08/2017	58.660
16	VETERQUIMICA BOLIVIANA	M-054/2016	VISTA DE CARGO N° 10/2017	272.635
<b>TOTAL</b>				<b>1.304.135</b>

Por otro lado pongo a su conocimiento que como administración tributaria se procedió a la verificación de los vehículos que se encuentran en mora tributaria por las gestiones 2010 y 2011, mismos por los que se realizó la emisión de la Resolución Determinativa por liquidación mixta la cual interrumpe el término de la prescripción para la gestión 2011, asimismo dicho listado de 1420 contribuyentes en mora fue publicada de forma masiva mediante periódico de Circulación nacional (OPINION) en fecha 8 y 22 de diciembre de 2016, de conformidad a lo establecido en el Art. 97 y 89 de la Ley 2492, haciendo un total de recuperación en mora de **Bs. 2'593.506.-** (Dos millones Quinientos noventa y tres mil quinientos seis 00/100 Bolivianos), se adjunta publicaciones realizadas. Al respecto a consecuencia de la publicación e interrupción de la prescripción de dichas gestiones se procedió con una recaudación a la fecha que asciende a un monto de **Bs. 157.779.- (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 00/100 BOLIVIANOS)**, sin embargo se esa continuando con la etapa de ejecución tributaria contra los vehículos que aun adeudan el IPVA gestiones 2010 y 2011 que ascienden a un numero de más de 1000 contribuyentes, procediendo a la notificación de forma masiva del inicio de ejecución tributaria y retención de cuentas bancarias, para así de esa manera garantizar la recuperación y cobro de la deuda tributaria, procedimiento que demanda recursos humanos ya que debido a la cantidad de contribuyentes pues es necesario el apoyo de personal en el departamento de fiscalización y ejecución tributaria, por lo que los oficiales de diligencias contratados son los encargados de la notificación y armado de las carpetas de estos procesos.

Asimismo, respecto a la contratación de la consultoría del Lic. Javier Ortiz se tiene que, el trabajo del mismo conlleva la identificación de los inmuebles que se encuentran con mora tributaria dentro del municipio de Colcapirhua desde las gestión 2005 a 2015, detalle que abarca UN TERCIO DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO lo que implicaría un gran incremento en la recaudación municipal y de los cuales se procederá con la emisión de las respectivas Ordenes de Fiscalización para posteriormente ser notificadas con ayuda de los dos oficiales de diligencias contratados para tal trabajo ya que debido a la cantidad de contribuyentes pues es necesario contar con la ayuda de personal para así poder abarcar las metas establecidas y cumplir con los plazos establecidos en la Ley 2492 Código Tributario.

Por lo expuesto a consecuencia de todos los actos administrativos tributarios realizados y con la finalidad como Gobierno Municipal Tributario el de recaudar, hasta la fecha se tiene un Total de recuperación en mora = **Bs. 10'550.354.- (DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS)**, los mismos que se encuentran en proceso de cobro y

un **MONTO RECUPERADO** de Bs. 886.729.- (**OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00/100 BOLIVIANOS**), dichos procesos anteriormente mencionados no pueden paralizarse debiendo cumplir un procedimiento en el plazo establecido por Ley y así poder realizar una mayor recaudación de la mora tributaria por mal pago de los contribuyentes aumentando de esta manera los ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua.

## II.2 JEFA MUNICIPAL DE SALUD

**Dra. Cintia Carvajal**

### CONSULTAS Y ATENCIONES

La producción mensual de los servicios del Hospital Municipal Andrés Cuschieri desde enero al mes de mayo en la presente gestión, de acuerdo al Reporte presentado por el Estadígrafo Informático del Hospital, es el siguiente:


Los servicios en consulta externa de ginecología, pediatría medicina general, emergencia, traumatología, cirugía y medicina interna, atenciones odontológicas, además de actividades de enfermería como inyectables, sueros y curaciones, partos, cesáreas, cirugías e internaciones y otros. A continuación se muestra la tabla de la información mencionada anteriormente en forma mensual, total y comparando con la gestión 2016.

PRODUCCION DE SERVICIOS DEL HOSPITAL GESTION 2017							
Nº	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
1	CONSULTAS EXTERNAS	3.107,00	2.444,00	3.189,00	2.796,00	3.021,00	<b>14.557,00</b>
2	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	2.102,00	1.693,00	1.878,00	1.264,00	1.833,00	<b>8.770,00</b>
3	CONSULTAS PRENATALES	384,00	365,00	425,00	319,00	314,00	<b>1.807,00</b>
4	TOMA DE MUESTRAS DE PAPANICOLAO	56,00	48,00	61,00	12,00	33,00	<b>210,00</b>
5	ORIENTACION EN ANTICONCEPCION	494,00	357,00	329,00	270,00	526,00	<b>1.976,00</b>
6	SUEROS	432,00	403,00	363,00	383,00	422,00	<b>2.003,00</b>
7	INYECTABLES	1.504,00	1.586,00	1.630,00	5.360,00	1.935,00	<b>12.015,00</b>
8	CURACIONES / SUTURAS	389,00	368,00	334,00	1.831,00	432,00	<b>3.354,00</b>
9	PARTOS VAGINALES	16,00	22,00	21,00	23,00	20,00	<b>102,00</b>
10	PARTOS CON CESAREAS	20,00	12,00	5,00	8,00	20,00	<b>65,00</b>
11	INTERNACIONES	112,00	102,00	93,00	81,00	108,00	<b>496,00</b>
12	MADRES BEBECIARIAS BONO JUANA AZURDUY	11,00	16,00	21,00	25,00	17,00	<b>90,00</b>
13	NINAS(OS) BENEFICIARIAS(OS) BONO JUANA AZURDUY	17,00	15,00	19,00	23,00	18,00	<b>92,00</b>

## VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HMAC - 2017

La vigilancia Epidemiológica realizada por personal de Programas del Hospital Municipal Andrés Cuschieri desde enero al mes de mayo en la presente gestión, de acuerdo al Reporte presentado por el Estadígrafo Informático del Hospital, es el siguiente:

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE NOTIFICACION SEMANAL						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA	71	80	86	65	91	393
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS SIN NEUMONIA	187	191	413	477	561	1829
NEUMONIA	15	8	46	27	36	132
Nº DE PERSONAS EXPUESTAS AL VIRUS RABICO	13	11	11	6	8	49
HEPATITIS VIRAL A	3	3	0	1	0	7
VARICELA	1	5	0	4	1	11
FLUJO URETRA VAGINAL	17	17	18	5	9	66



## CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

Se han firmado Convenios Interinstitucionales de Cooperación entre GAM Colcapirhua y algunas Universidades del medio, para el desarrollo de Internado rotatorio evaluado y practicas hospitalarias de la carrera de medicina y otras en el Hospital Municipal Andrés Cuschieri.

La cantidad promedio de Internos de Universidades para la carrera de medicina en el Hospital Municipal Andrés Cuschieri es de: 50 internos

Las Universidades e Institutos con los que se firmó Convenios son:

- UNIVALLE,
- UPAL,
- UNITEPC,
- UDABOL,
- UNIFRANZ
- Instituto ITSI para la carrera de enfermería, y
- Instituto TECBA para gabinete de Rayos X

<b>RESUMEN DE INGRESOS POR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUTOS</b>	
<b>GESTION 2017</b>	<b>A FECHA 31 DE MAYO</b>
UNIVERSIDAD PRIVADA ABIERTA LATINO AMERICANA	91.454,40
UNIVERSIDAD DEL VALLE	54.288,00
UNIV. TECNICA PRIVADA COSMOS CONV.CUSCHIERI	66.962,00
UNIV. TECNICA PRIVADA COSMOS CONV.C.S.CANADA	23.698,00
UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA	28.792,00
UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO	73.402,40
TECNOLOGICO BOLIVIANO ALEMAN	3.780,00
INSTITUTO TECNICO SAN IGNACIO	5.576,00
	<b>TOTAL (Bs)</b>
	<b>347.952,80</b>

Fuente: Auditor HMAC

### **INGRESOS PROPIOS**


El Hospital Municipal Andrés Cuschieri generó ingresos propios por concepto por Consultas externas y por Venta de Servicios como: Laboratorio, Ecografía, Rayos X, Cirugías, Internación y Farmacia entre otros.

A continuación se muestra el detalle:



<b>INGRESOS PROPIOS - ENERO A MAYO (2016 - 2017)</b>			
<b>Nº</b>	<b>Mes</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
		<b>Ingreso (Bs)</b>	<b>Ingreso (Bs)</b>
1	Enero	11.190,50	81.964,50
2	Febrero	21.827,50	79.859,50
3	Marzo	47.391,00	59.091,90
4	Abril	52.226,50	44.209,65
5	Mayo	35.142,50	67.376,80
	<b>TOTAL</b>	<b>167.778,00</b>	<b>332.502,35</b>

Fuente: Reportes de Tecnico de Caja HMAC



Hubo una disminución de ingresos propios durante los meses de marzo y abril de la presente gestión debido a que no se contaba con médicos anesestesiólogos, casi no se realizaron cirugías en este periodo.

#### **RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL**

El área de Salud en el Hospital actualmente cuenta con 67 profesionales entre médicos y paramédicos.

A continuación se muestra un Cuadro de Recursos Humanos mostrando la proporción de Consultores de Línea del área Salud y Personal con Ítem SEDES / Ministerio de Salud:

## RRHH – SALUD HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI

	SEDES	MIN SALUD	MIN SALUD (ASSO)	GAM CL	Total
Directora	1				1
Medicos Especialistas	1	3	2	8	14
Medicos Generales	2	4		2	8
Bono Juana Azurduy		1			1
Odontologo	1			1	2
Farmacia				4	4
Laboratorio	1			4	5
Tecnico Sup Biotecnologo	1				1
Lic Enfermeria	2			12	14
Aux Enfermeria	1			13	14
Fisioterapia				1	1
Fisioterapia (medio tiempo)				1	1
TS Rayos X				1	1
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>67</b>

Fuente: Encargado de RRHH HMAC

## SALUD - ESPECIALISTAS

	SEDES	MIN SALUD	MIN SALUD (ASSO)	GAM CL	Total
MED. PEDIATRA				3	3
MED. GINECOLOGO	1			3	4
MED. ANESTESIOLOGO		1			1
MED. CIRUJANO				1	1
MEDICO OFTALMOLOGO			1		1
MEDICO INTERNISTA		1			1
MEDICO TRAUMATOLOGO		1			1
MEDICO ECOGRAFISTA				1	1
MEDICO UROLOGO			1		1
<b>TOTAL MEDICOS ESP.</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>14</b>

Existe faltante de médicos especialistas: Pediatra, Ginecólogo, Anestesiólogos y Cirujano

## RRHH ADMINISTRACIÓN - HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI

El área Administrativa del Hospital actualmente cuenta con 31 profesionales, técnicos y personal de apoyo:

	SEDES	ITEM GAM	GAM CL	SERVICIOS	Total
Administrador HMAC		1			1
Encargado RRHH			1		1
Encargado Estadigrafo			1		1
Auditor		1			1
Asistente de Direccion			1		1
Aux de Almacen y Act Fijos		1			1
Aux Adm y Caja		1			1
Aux Admision y Archivo	1		4		5
Caja Chica		1			1
Chofer de Ambulancia		3	1		4
Sereno		1			1
Servicio Sereno				2	2
Servicio Cocina				3	3
Servicio Lavanderia				2	2
Servicio Limpieza				6	6
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>31</b>

## APERTURAS PROGRAMATICAS Y EJECUCION DEL POA

El Hospital fue Municipal Andrés Cuschieri cuenta con tres aperturas programáticas y comparte estas aperturas programáticas con el Servicio de Hemodiálisis

Las aperturas programáticas del Hospital para esta gestión son las siguientes:

### GESTION 2017

Apertura Programatica			DESCRIPCION
PROG	PROY	ACT	
20	0000	011	Funcionamiento Hospital Municipal Andres Cuschieri
20	0000	012	Equipamiento Hospital Municipal Andres Cuschieri
20	0000	013	Mantenimiento y refaccion infraestructura Hospital Municipal Andres Cuschieri

### ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO AL 08/06/2017:

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - AL 08/06/2017									
Apertura Programatica			PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO				%
PROG	PROY	ACT	INICIAL	APROBADA	VIGENTE	PREVENTIVO	DEVENGADO	PAGADO	EJECUCION
20	0000	011	2.756.498,00	1.100.000,00	3.856.498,00	2.774.588,69	1.052.235,90	1.052.235,90	27,28%
20	0000	012	500.000,00	0,00	500.000,00	464.348,19	12.753,80	12.753,80	2,55%
20	0000	013	200.000,00	0,00	200.000,00	39.309,04	39.309,04	39.309,04	19,65%

## FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL

El Presupuesto actual de Funcionamiento del Hospital Municipal Andrés Cuschieri, que incluye el Servicio de Hemodiálisis es insuficiente, se ha solicitado se incremente el presupuesto a fin de cubrir los requerimientos esenciales de las diferentes unidades y servicios del Hospital.

## EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL

Están en curso dos procesos de compra de Equipamiento para algunos Servicios del Hospital Municipal Andrés Cuschieri, por otra parte el Servicio de Hemodiálisis de también está efectuando su proceso de compra de equipamiento. El Presupuesto vigente de Equipamiento es de Bs 500.000,00 y ya se han efectuado Certificaciones Presupuestarias por Bs 464.348,19 (92.8%). Hemos solicitado incremento de presupuesto para Equipamiento del Hospital así como del Servicio de Hemodiálisis. Ni bien se tengan estos recursos, se efectuaran los procesos para realizar las adquisiciones de equipos y mobiliario requeridos para dar mejor atención a los pacientes que acuden al Hospital como al Servicio de Hemodiálisis.

## MANTENIMIENTO REFACCION INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL

El Hospital Municipal Andrés Cuschieri fue municipalizado en octubre de 2015, para el reinicio de atención se han realizado trabajos de adecuación en la infraestructura del hospital a fin de reiniciar actividades de acuerdo a normativa del SEDES. Están pendientes aún varios trabajos de mantenimiento y refacción de la infraestructura del Hospital y se está realizando en forma parcial.

El Presupuesto vigente para Mantenimiento y Refacción de Infraestructura del Hospital es de Bs 200.000,00, ya se han algunos trabajos de refacción, especialmente cambio de cubiertas y refacción de ambientes que por la temporada de lluvias, sufrimos inundaciones.

### 1. RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS – HOSPITAL MUNICIPAL ANDRES CUSCHIERI

En el área de Salud, el Servicio de Hemodialisis cuenta con 9 profesionales entre médicos y licenciadas y en área administrativa, cuenta con 4 personas, 1 administrador y 3 personal de servicios.

A continuación, se muestra un Cuadro de Recursos Humanos mostrando la proporción de Personal de Salud con Ítem: SEDES / Ministerio de Salud / Min Salud (ASSO) y Consultores de Línea, así como del Personal Administrativo entre Ítem GAM y Consultores de Línea:

#### 1.1. RRHH - SALUD:

	SEDES	MIN SALUD	MIN SALUD (ASSO)	GAM CONS.	Total
Responsable Serv. Hemodiálisis Nefrólogo –			1		1
Médicos Generales		2			2
Lic. Enfermería		3		3	6
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>

## 1.2. RRHH - ADMINISTRATIVOS

	ITEM GAM	GAM CONS.	SERVICIOS	Total
Administrador		1		1
Personal Serv. Lavandería			1	1
Personal Serv. Limpieza			2	2
TOTAL		1	3	4

## 2. DEPENDENCIA SERVICIO DE HEMODIALISIS.

El Servicio de Hemodiálisis depende del Hospital Municipal Andres Cuschieri.

## 3. EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS.

El equipamiento que existe en el Servicio de Hemodiálisis es de dos fuentes:

Ministerio de Salud – Donación.

- Ocho maquinas – Aparatos de Diálisis.
- 10 sillones para pacientes.
- Planta de tratamiento de agua.
- Central de Oxigeno, Aire y Vacío.

Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua.

- 1 balanza de precisión
- 4 televisores de 48 pulgadas
- 1 refrigerador 18 pies
- 1 frigo bar
- 17 cámaras de seguridad
- 1 DVR de 32 canales
- 1 stock ropa hospitalaria
- 1 stock de equipamiento médico menor
- 1 stock de instrumental medico
- 1 stock de mobiliario en melamina
- 1 stock de mobiliario metálico inox
- 1 carro de paro metálico
- 1 camilla de acero inoxidable
- 1 stock de mobiliario metálico
- 2 colchones y almohadas
- 1 cableado estructurado para red de datos, red de telefonía y cableado de tv.
- 3 piezas de extinguidores
- 3 piezas de letreros pvc 23 x 30cm.

- 3 equipos de aire acondicionado
- 1 extractor metálico tipo hélice.
- 1 reloj biométrico
- 1 letrero metálico 3 x 1,40

**4. ATENCIONES A PACIENTES Y NUMERO DE SESIONES DE HEMODIALISIS. -**

En el mes de marzo se atendieron 13 pacientes y un total de 50 sesiones en el mes.

No. Pacientes	Sexo	
	Masculino	Femenino
13	10	3


En el mes de abril se atendieron a 27 pacientes y un total de 260 sesiones en el mes.

No. Pacientes	Sexo	
	Masculino	Femenino
27	16	11

En el mes de mayo 25 pacientes, y un total de 267 sesiones en el mes.

No. Pacientes	Sexo	
	Masculino	Femenino
25	15	10

**5.1 GRAFICO RESUMEN DE SESIONES POR MES.**



**6.- COMPRA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS. -**

Para el inicio de las sesiones de hemodiálisis se hicieron la compra de medicamentos, estas fueron:

- ANPE 137/2016 COMPRA DE MEDICAMENTOS
- ANPE 138/2016 COMPRA DE SOLUCIONES
- ANPE 139/2016 ADQUISICION DE INSUMOS

En el mes de abril se iniciaron tres procesos de compras, estos fueron:

- ANPE 061/2017 COMPRA DE INSUMOS, ESTA EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DE LA CONTRATACION.
- ANPE 062/2017 COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTA EN LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DE LA CONTRATACION.
- ANPE 063/2017 COMPRA DE DESINFECTANTES Y DESINCRUSTANTES, CONCLUYO EL PROCESO.

## **III.- SECRETARÍA MUNICIPAL TÉCNICA**

**Arq. Juan Carlos Trujillo  
SECRETARIO MUNICIPAL TECNICO**

### **UNIDADES DEPENDIENTES**

#### **III.1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

III.1.1 Jefe de Saneamiento Básico

#### **III.2 DIRECCION DE URBANISMO Y CATASTRO**

#### **III.3. DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE**

III.3.1 Jefe de Medio Ambiente

III.3.2 Jefe de Gestión Integral de Residuos Sólidos GIRS

## **III.1.- DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**


**Arq. Claudia Orellana  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS**

INFORME DE AVANCE FISICO PROYECTOS DISTRITO A														
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017														
Director de Obras Publicas: Arq. Claudia F. Orellana Alba														
Supervisor Dist. A: Evert Parra Chileno														
N°	APERTURA PROGRAMATICA				PROYECTO	UBICACION	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO PLANILADO Bs.	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
1	18	0000	001		Mtto, Mejoramiento y Rapiado Calles y caminos distrito A	DISTRITO A	VARIOS	200.000	159.607,15	159.607,15	100%			CONCLUIDO
2	17	0058	000	R	Const. Pav. Rigido Calle Ayacucho OTB Cuatro Esquinas Dist.A	OTB CUATRO ESQUINAS	CONS - I	320.000	296.098,84	296.098,84	100%	SI	SI	CONCLUIDO
3	21	0100	000	R	Const. Bloque Nivel Inicial y Primario U.E. 15 de Abril (Const. Tinglado cancha multiple)	OTB WILLCATACO	CONSTRUCIONES SAIBA CHAMBI	200.000	197.116,96	199.192,27	100%	SI	SI	CONCLUIDO
4	17	0052	000	R	Const. Pav. Calle Buenos Aires OTB San Jose de Kami Dist. A	OTB SAN JOSE DE KAMI	VARIOS	92.000	86.829,00	86.829,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
5	17	0018	000		Const. Empedrado de Vias OTB Collpapampa Dist. A	OTB COLLPAPAMPA	MARLENE ANTONIO RAMOS	120.000	102.917,88	107.812,17	100%	SI	SI	CONCLUIDO
6	17	0014	000		Const. Empedrado Calle Ezequiel Osorio OTB Capacachi Norte Dist. A	OTB CAPACACHI NORTE	OBRA MAGISTRAL	50.000	49.981,11		20%			EN EJECUCION
7	17	0013	000		Const. Pav.de Vias OTB 23 de Marzo Dist. A	OTB 23 DE MARZO	GASTON ESCOBAR CHAMBI	130.000	124.086,67		10%			EN EJECUCION
8	18	0063	000	R	Const. Empedrado Calle Tawantinsuyo OTB Villa Rosedal Dios es Amor Dist. A	OTB VILLA ROSEDAL	OBRA MAGISTRAL	56.000	54.974,16	54.974,16	100%	SI	SI	CONCLUIDO
9	17	0003	000	R	Construccion Av.Daniel Salamanca Dist. A, D	DISTRITO A, D		1.000.000						EN PROCESO DE CONTRATACION
10	17	0004	000		Const. Pav. Av. Bolivia Dist.A	OTB SAN JOSE DE KAMI		700.000						PLANIFICACION
11	17	0005	000		Const. Pav.Don Bosco OTB Callajchullpa Dist.A	OTB CALLAJCHULLPA		200.000						PLANIFICACION



1 2	17	0016	00 0		Const.Pav. De Vias OTB Collpapampa Don Bosco Dist. A	OTB COLLPAPAMPA DON BOSCO		130.00 0						PLANIFICACION
1 3	17	0015	00 0		Const. Pav.Calle Intiraymi Dist. A	OTBS CIELO MOCKO Y SAN JOSE REDUCTO		260.00 0						PLANIFICACION
1 4	17	0017	00 0		Const. Empedrado de Vias Calle Qurikancha OTB Villa Rosedal Dioses Amor Dist. A	OTB VILLA ROSEDAL		130.00 0						TRASPASO
1 5	22	0002	00 0		Const. Cancha Multiple OTB Cuatro Esquinas Dist. A	OTB CUATRO ESQUINAS		130.00 0						TRASPASO
1 6	22	0003	00 0		Const. Cancha Multiple Los Lirios OTB Willcataco Dist. A	OTB WILLCATACO		80.000						PLANIFICACION (SIN AREA DE EMPLAZAMIENTO)
1 7	22	0008	00 0	R	Const. Graderias Cancha Multiple OTB San Jose Reducto Dist. A	OTB SAN JOSE DE KAMI		61.230						PLANIFICACION
<b>TOTALES</b>								<b>3.859.230</b>	<b>1.071.612</b>	<b>904.514</b>				

N° PROYECTOS DISTRITO B	17
PROYECTOS CONCLUIDOS	6
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	2
PROYECTOS PENDIENTES	9
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO</b>	<b>37%</b>
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO</b>	<b>23%</b>

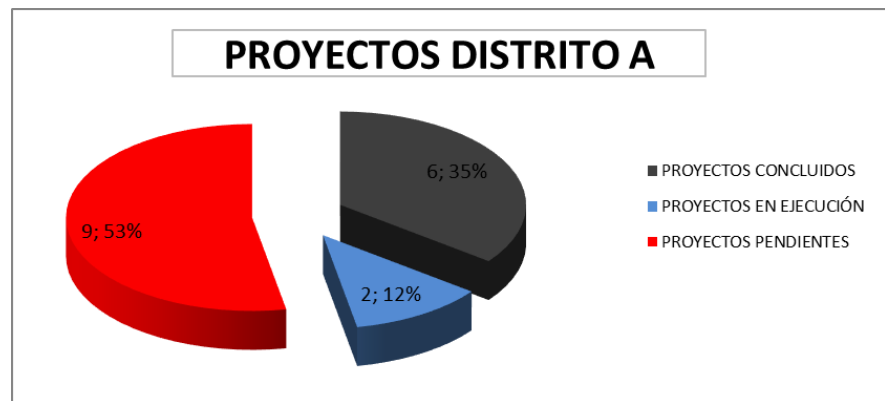

APERTURA PROGRAMÁTICA				DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO O Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO PLANILLADO O Bs.	AVANCE FÍSICO %	ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	OBSERVACIONES
PROG	PROY	ACT										
12	0000	000		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS								
12	0004	000		Const. Sist. Canal de Riego OTB Fabril Capacachi Dist. B		0						
13	0000	000		DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE								
13	0008	000		Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	ROSENDO MOSQUERA A.	220.000	197.111,01	54.250,29	28%			EN EJECUCION
16	0000	000		ALUMBRADO PÚBLICO								
16	0000	003		Mantenimiento Alumbrado Publico OTB Magisterio Dist. B		34.032						
16	0000	004		Mantenimiento Alumbrado Publico OTB Santa Isabel Dist. B		10.000						
16	0004	000	R	Ampliacion Alumbrado Publico OTB Bloques Florida Dist, B		8.000						
17	0000	000		INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL								
17	0003	000		Mejoramiento de la Plaza OTB Santa Isabel Dist. B		220.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0004	000		Mejoramiento Area Verde Av. Comercio OTB Santa Rosa Catavi Dist. B		0						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0011	000	R	Construcción de Plazuela y Parque Infantil OTB San Alfonso Dis. B		186.524						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0012	000	R	Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B		179.843						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0032	000		Const. Pav. Rígido Av. Julio Romano OTB Holanda Dist. B		90.390						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0053	000		Const. Pav. Rígido Empalme Av. Villaruel OTB Municipal Dist. B	PLASCONST	43.000	43.000,00	43.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0000	000		CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES								

18	0000	002		Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	VARIOS	220.000						
18	0000	006		Conformacion de Plataformas Municipio de Colcapirhua	VARIOS	1.350.000						
18	0013	000		Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	LIC. MELVI HEREDIA C.	50.000	49.989,06	49.989,06	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0014	000		Const. Pav. Rigido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	CARLOS MORANTE	250.000	231.418,02	224.339,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0015	000		Const. Pav. Rigido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	COPHE CONSTRUCCIONES	220.000	219.544,62	219.544,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0016	000		Const. Empedrado Lado Sud Urb. Abaroa OTB Santa Rosa Central Dist. B		259.918						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0017	000		Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	ING. NELSON MERCADO V.	305.000	219.808,00	219.808,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
							85.192,00					POR EJECUTAR
18	0018	000		Const. Pav. Rigido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	ELMER C. PADILLA O.	177.000	171.271,92	157.155,05	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0019	000		Const. Pav. Rigido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	174.161,24	163.342,50	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0020	000		Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	ARQ. KATTY K. PEREZ M.	175.000	99.217,71	99.217,71	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0021	000		Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	219.689,73	219.684,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000		Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	265.000	149.925,64	144.482,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					ING. ROY R. LUJAN R.		89.995,10	89.876,95	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0023	000		Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	ING. FELIPE HERRERA S.	234.280	215.462,92	219.920,87	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0024	000		Const. Pav. Rigido Av. Sexta y Calle Jorge Barrero OTB Elizabeth Seton Dist. B		220.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0025	000		Const. Pav. Rigido Calle Cercado-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B		0						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0026	000		Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	418.989	300.318,80	327.448,52	100%	SI	SI	CONCLUIDO
												POR EJECUTAR
18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	SIAJSA LTDA	316.000	219.107,07	219.107,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0028	000		Const. Pav. Rigido Calle Los Pinos OTB La Pradera Dist. B		320.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0029	000		Const. Pav. Rigido Calle Paraiso OTB California Dist. B		220.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA

18	0030	000		Apertura de Camino OTB San Alfonso Dist. B		0						
18	0031	000		Const. Empedrado Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B		0						
18	0032	000		Const. Pav. Rígido Calle Arani OTB Urbanizacion Elfec, Cucardas Dist. B	ING. FELIPE HERRERA S.	270.000	49.566,62	49.566,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
							219.278,44	219.278,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0050	000		Const. Pav. Rígido OTB Huanuni Dist. B		109.705						
18	0062	000	R	Const. Pav. Rígido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	PLASCONST	6.605.630	2.507.078,45	2.507.078,45	100%	SI	SI	CONCLUIDO
							3.948.714,14		22%			EN EJECUCION
18	0064	000	R	Const. Pav. Rígido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	F & Z ING. LORENA ZENTENO	537.555	893.146,25	831.210,80	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	JOSE TERAN	321.408	146.779,22	146.779,22	100%	SI	SI	CONCLUIDO
							149.913,97	149.913,97	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0066	000	R	Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	JOSE TERAN	60.000	59.680,21	59.680,21	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rígido de Vías OTB Barrio Holanda Dist. B		35.000						
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vías OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II		11.609						
18	0072	000	R	Const. Pav. Rígido C/Noel Kemp Mercado OTB Holanda Dist. B Tramo III		0						
18	0073	000	R	Mejoramiento de Vías OTB San alfonso Dist. B		0						
18	0087	000	R	Const. Empedrado OTB Capacachi Central Dist. B		445						
18	0088	000	R	Const. Empalme de Vías Excombatientes y Capitan V. Ustariz OTB Santa Rosa Central Dist. B		15.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0101	000		Const. Pav. Rígido de Vías OTB Elfec Cucardas Dist. B		10.063						
18	0102	000	R	Const. Pav. Rígido C/Noel Kemp Mercado OTB Holanda Dist. B Tramo IV		0						
18	0103	000	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	HILDA MAMANI ARCE	55.000	55.000,00	55.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0104	000		Apertura Camino Vecinal OTB Martin Cardenas Dist. B (Expropiacion)		80.000						
18	0106	000	R	Const. Pav. Rígido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	ARQUIFORMA S.R.L.	101.106	91.452,73	91.452,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO

18	0110	000	R	Const. Empedrado de Vias OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B		40.470						
18	0111	000	R	Const. Empedrado OTB Comercio Cochabamba Dist. B		195.000						
18	0116	000		Const. Empalmes C/ Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B		0						
18	0121	000		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	CARLOS SALVATIERRA	215.000	211.999,96	61.336,49	29%			EN EJECUCION
18	0122	000		Const. Pav. Rigido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	HIPOLITO CAMACHO	120.000	118.400,05	111.907,96	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B		230.141						
18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B		285.000						
20	0000	000		SERVICIO DE SALUD								
20	0001	000	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	GAAR INGENIERIA	5.691.439	2.893.386,76	3.162.604,70	100%	SI	SI	CONCLUIDO
22	0000	000		DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE								
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	METAL OBRAS CONSTRUCCIONES	335.000	254.243,86	254.243,86	100%	SI	SI	CONCLUIDO
							80.756,14					POR EJECUTAR
22	0007	000		Mejoramiento Cancha Multiple OTB Santa Rosa Catavi Dist. B		0						
22	0025	000		Mejoramiento Cancha Polifuncional OTB Fabril Capacachi Dist. B		5.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
22	0030	000		Const. Cancha Polifuncional la Salvadora OTB Capacachi Central Dist. B		140.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
31	0000	000		PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES								
31	0006	000		Const. Muro de Contencion lado oeste Torrentera Rummy Mayu OTB San alfonso Dist. B		269.540						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
						0						

APERTURA PROGRAMATICA			PROYECTO	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
13	0008	000	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	28%			EN EJECUCION
17	0053	000	Const. Pav. Rigido Empalme Av. Villarroel OTB Municipal Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0000	002	Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	65%			EN EJECUCION
18	0013	000	Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0014	000	Const. Pav. Rigido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0015	000	Const. Pav. Rigido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0017	000	Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0017	000	Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0018	000	Const. Pav. Rigido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0019	000	Const. Pav. Rigido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0020	000	Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0021	000	Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalen Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalen Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0023	000	Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0026	000	Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0026	000	Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0027	000	Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0027	000	Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0032	000	Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Efec, Cucardas Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0032	000	Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Efec, Cucardas Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0062	000	R Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0062	000	R Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	35%			EN EJECUCION
18	0064	000	R Const. Pav. Rigido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0066	000	R Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	100%	SI	SI	CONCLUIDO

18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vías OTB Barrio Holanda Dist. B	0%				PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vías OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	0%				PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vías OTB Efec Cucardas Dist. B	0%				PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0103	000	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	100%	SI	SI		CONCLUIDO
18	0106	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	100%	SI	SI		CONCLUIDO
18	0110	000	R	Const. Empedrado de Vías OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B	100%	SI	SI		CONCLUIDO
18	0121	000		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	29%				EN EJECUCION
18	0122	000		Const. Pav. Rigido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	100%	SI	SI		CONCLUIDO
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	0%				PARA EJECUCION
18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	0%				PARA EJECUCION
20	0001	000	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	100%	SI	SI		CONCLUIDO
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	100%	SI	SI		CONCLUIDO
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	0%				PENDIENTE P/ REPROGRAMAR

INFORME DE AVANCE FISICO PROYECTOS DISTRITO B												
AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015												
Director de Obras Publicas: Ing. Carlo G. Mercado Rocabado												
Supervisor Dist. B: Ing. Wilson Jobany Bustamante A.												
APERTURA PROGRAMATICA			PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO PLANILLO Bs.	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVINCIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
1	00	0	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	OTB SANTA ROSA CATAVI	ROSENDO MOSQUERA A.	220.000	197.111,01	54.250,29	28%			EN EJECUCION
1	00	0	Const. Pav. Rigido Empalme Av. Villarroel OTB Municipal Dist. B	OTB MUNICIPAL	PLASCONST	43.000	43.000,00	43.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
1	00	0	Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	DISTRITO B	VARIOS	220.000			65%			EN EJECUCION


18	0013	000	Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	OTB CAPACACHI CENTRAL	LIC. MELVI HEREDIA C.	50.000	49.989,06	49.989,06	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0014	000	Const. Pav. Rigido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	OTB MOROCOCAL A	CARLOS MORANTE	250.000	231.418,02	224.339,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0015	000	Const. Pav. Rigido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	OTB SAUSALITO	COPHE CONSTRUCCIONES	220.000	219.544,62	219.544,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0017	000	Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	OTB BARTOS	ING. NELSON MERCADO V.	305.000	219.808,00	219.808,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
				OTB BARTOS			85.192,00		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0018	000	Const. Pav. Rigido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	OTB MUNICIPAL	ELMER C. PADILLA O.	177.000	171.271,92	157.155,05	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0019	000	Const. Pav. Rigido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	OTB MAGISTERIO	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	174.161,24	163.342,50	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0020	000	Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	OTB SANTA ISABEL	ARQ. KATTY K. PEREZ M.	175.000	99.217,71	99.217,71	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0021	000	Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	OTB OASYS	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	219.689,73	219.684,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	OTB NUEVA JERUSALEN	ING. ROY R. LUJAN R.	265.000	149.925,64	144.482,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
				OTB NUEVA JERUSALEN	ING. ROY R. LUJAN R.		89.995,10	89.876,95	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0023	000	Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	OTB HOLANDA	ING. FELIPE HERRERA S.	234.280	215.462,92	219.920,87	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0026	000	Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	OTB FLORIDA NORTE	ING. ROY R. LUJAN R.	418.989	300.318,80	327.448,52	100%	SI	SI	CONCLUIDO
				OTB FLORIDA NORTE			118.670,20		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0027	000	Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	OTB FLORIDA SUD	SIAJSA LTDA	316.000	219.107,07	219.107,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
				OTB FLORIDA SUD			96.892,93		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0032		Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Elfec, Cucardas Dist. B	OTB ELFEC CUCARDAS	ING. FELIPE HERRERA S.	270.000	49.566,62	49.566,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO



		0 0 0			OTB ELFEC CUCARDAS	ING. FELIPE HERRERA S.		219.278, 44	219.278, 44	100 %	SI	SI	CONCLUIDO
1 8	00 62	0 0 0	R	Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	DISTRITO B	PLASCONST	6.605.630	2.507.07 8,45	2.507.07 8,45	100 %	SI	SI	CONCLUIDO
					DISTRITO B	K-LUYO & ASOCIADOS		3.948.71 4,14		35%			EN EJECUCION
1 8	00 64	0 0 0	R	Const. Pav. Rigido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	DISTRITO B	F & Z ING. LORENA ZENTENO	537.555	893.146, 25	831.210, 80	100 %	SI	SI	CONCLUIDO
1 8	00 65	0 0 0	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	OTB OASYS	JOSE TERAN	321.408	146.779, 22	146.779, 22	100 %	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB OASYS	JOSE TERAN		149.913, 97	149.913, 97	100 %	SI	SI	CONCLUIDO
1 8	00 66	0 0 0	R	Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	OTB LA PRADERA	JOSE TERAN	60.000	59.680,2 1	59.680,2 1	100 %	SI	SI	CONCLUIDO
1 8	00 70	0 0 0	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B	OTB HOLANDA		35.000			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
1 8	00 71	0 0 0	R	Const. Empedrado de vias OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	OTB SANTA ROSA CENTRAL		11.609			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
1 8	01 01	0 0 0		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Efec Cucardas Dist. B	OTB ELFEC CUCARDAS		10.063			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
1 8	01 03	0 0 0	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	OTB CAPACACHI CENTRAL	HILDA MAMANI ARCE	55.000	55.000,0 0	55.000,0 0	100 %	SI	SI	CONCLUIDO
1 8	01 06	0 0 0	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	OTB ELIZABETH SETON	ARQUIFORMA S.R.L.	101.106	91.452,7 3	91.452,7 3	100 %	SI	SI	CONCLUIDO
1 8	01 10	0 0 0	R	Const. Empedrado de Vias OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B	OTB MARTIN CARDENAS	EUSEBIO ANZALDO	40.470	99.950,0 0	99.950,0 0	100 %	SI	SI	CONCLUIDO
1 8	01 21	0 0 0		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	OTB FABRIL CAPACACHI	CARLOS SALVATIERRA	215.000	211.999, 96	61.336,4 9	29%			EN EJECUCION
1 8	01 22	0 0 0		Const. Pav. Rigido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	OTB SAUSALITO	HIPOLITO CAMACHO	120.000	118.400, 05	111.907, 96	100 %	SI	SI	CONCLUIDO
1 8	01 26	0 0 0		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	OTB URBANIZACIO N LA PAZ		230.141			0%			PARA EJECUCION

18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	OTB COMERCION COCHABAMABA		285.000			0%			PARA EJECUCION
20	0001	000	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	OTB CAPACACHI CENTRAL	GAAR INGENIERIA	5.691.439	2.893.386,76	3.162.604,70	100%	SI	SI	CONCLUIDO
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	OTB MARTIN CARDENAS	METAL OBRAS CONSTRUCCIONES	335.000	254.243,86	254.243,86	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB MARTIN CARDENAS			80.756,14		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
TOTALES							18.258.690	14.680.123	10.251.170				

Nº PROYECTOS DISTRITO B	40
PROYECTOS CONCLUIDOS	27
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	6
PROYECTOS PENDIENTES PARA REPROGRAMACION	7
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO</b>	<b>71,41</b>

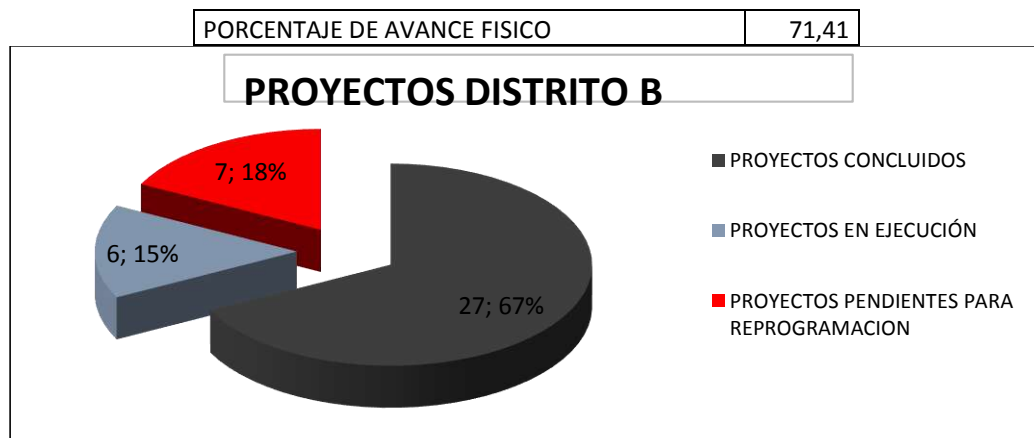

NOTA: LOS DE COLOR ROJO SON LOS PROYECTOS PARA REPROGRAMAR EL 2016

APERTURA PROGRAMATICA				PROYECTO	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO P/SER REPROGRAMADO Bs.	OBSERVACIONES
13	0008	000		Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	220.000,00	165.749,71	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0017	000		Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	305.000,00	85.192,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0026	000		Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	418.989,00	118.670,20	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	316.000,00	96.892,93	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	6.605.630,00	3.098.476,90	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B	35.000,00	35.000,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vías OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	11.609,00	11.609,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Efec Cucardas Dist. B	10.063,00	10.063,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0121	000		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	215.000,00	153.663,51	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	230.141,00	230.141,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	285.000,00	285.000,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	335.000,00	80.756,14	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0000	002		Mtto y Mejoramiento av. 16 de Julio Distrito B		42.024,31	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0000	006		Conformacion de Plataforma Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B		20.942,80	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
<b>TOTALES</b>					<b>8.987.432,00</b>	<b>4.371.214,39</b>	

11	0008	000	B		Const.Pozo de Agua Potable OTB Santa Rosa Central Dist. B	140.000
11	0015	000	B		Mej. Agua Potable C/ Sist. Tratamiento OTB Comercio Cbba. Santa Rosa Sud Dist. B	200.000
11	0021	000	B	R	Mej. Sistema de Agua Potable OTB Nueva Jerusalem Dist. B	45.000
11	0036	000	B	R	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	165.750
11	0040	000	B	R	Const. Perforacion de Pozo de Agua Potable OTB Huanuni Dist. B	140.000
13	0004	000	B	R	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	0
13	0005	000	B	R	Const. Muro de Contencion lado oeste Torrentera Rummy Mayu OTB San alfonso Dist. B	69.540
16	0000	003	B		Mantenimiento y Compra de Luminarias distrito B	80.000
16	0002	000	B	R	Ampliacion Alumbrado Publico OTB Bloques Florida Dist, B	8.000
17	0001	000	B		Mejoramiento Plaza Retamoso OTB Holanda Dist. B	100.000
17	0002	000	B	R	Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B	100.000
17	0004	000	B		Const. Plaza Principal OTB Florida Sud Dist. B	140.000
17	0007	000	B	R	Construcción de Plazuela y Parque Infantil OTB San Alfonso Dis. B	256.524
17	0008	000	B	R	Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B	111.550
17	0013	000	B	R	Const. Empedrado Lado Sud Urb. Abaroa OTB Santa Rosa Central Dist. B	259.918
17	0014	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	75.782
17	0015	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	14.359
17	0016	000	B	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta y Calle Jorge Barrero OTB Elizabeth Seton Dist. B	238.000
17	0017	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	89.540
17	0018	000	B	R	Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	96.896
17	0019	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Los Pinos OTB La Pradera Dist. B	150.527
17	0020	000	B	R	Const. Pav. Rigido OTB Huanuni Dist. B	4.664
17	0021	000	B	R	Const. Empalme de Vías Excombatientes y Capitan V. Ustariz OTB Santa Rosa Central Dist. B	15.000
17	0022	000	B	R	Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	153.663
17	0023	000	B	R	Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	300.141
17	0024	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	285.000
17	0040	000	B	R	Mejoramiento de la Plaza OTB Santa Isabel Dist. B	115.603
17	0044	000	B	R	Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	85.192
17	0045	000	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Modesto Omiste OTB Municipal Dist. B	89.700
17	0046	000	B	R	Const. Pav. Rigido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	56.657
17	0048	000	B	R	Apertura Camino Vecinal OTB Martin Cardenas Dist. B (Expropiacion)	80.000
18	0000	002	B		Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	260.000
18	0002	000	B		Construccion Av. Dorbigni Dist. B,C,D	1.800.000
18	0006	000	B		Const. Pav. Flexible Av. Tomas Oconor Dist.B,C	500.000
18	0015	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Paraiso OTB California Dist. B	420.000
18	0016	000	B		Const. Pav. Rigido Calles Joaquin Sarcedo-Jose Ayala -Eduardo Saracho OTB Elizabeth Seton Dist. B	200.000
18	0017	000	B		Const. Pavimento Calle 18 y 1ro. de Mayo- OTB Fabril Capacachi Dist. B	200.000
18	0018	000	B		Const. Empedrado de Vias OTB Martin Cardenas Dist. B	200.000
18	0019	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	200.000
18	0020	000	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Araya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	230.640
18	0021	000	B		Const. Pav. Av. Comercio OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	200.000
18	0022	000	B		Const. Pav. Rigido OTB Cucardas Dist. B	200.000
18	0023	000	B		Const. Pav. Calle F Cajia de la Vega OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	200.000
18	0024	000	B		Const. Pav. Lado Norte Av. B. Galindo Sector Dimacos-Farmacorp OTB Santa Isabel Dist. B	200.000
18	0025	000	B		Const. Pav. Pasaje Modesto Omiste OTBs Magisterio Coña Coña-Municipal Coña Coña Dist. B	200.000
18	0038	000	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Araya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	0

18	0044	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Paraiso OTB California Dist. B	0
22	0004	000	B		Const. Graderas Cancha Multifuncional OTB Huanuni Dist. B	120.000
22	0006	000	B	R	Const. Cancha Polifuncional la Salvadora OTB Capacachi Central Dist. B	140.000
22	0010	000	B	R	Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	80.756
31	0001	000	B		Const. Muro de Contencion Torrentera Rummy Mayu Lado Oeste OTB San alfonso Dist. B	469.540

INFORME DE AVANCE FISICO PROYECTOS DISTRITO														
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2017														
Director de Obras Publicas:														
Supervisor Dist.				ING. JHONNY TORRICO GOMEZ										
Supervisor Dist.				ING. NOELIA CAMACHO YUJRA										
N°	APERTURA PROGRAMATICA				PROYECTO	UBICACION	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO PLANILLADO Bs.	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
1	17	0006	000	R	Construccion Av. Dorbigni Dist. B,C,D	Av. Dorbigni Dist. B,C,D	SOCIEDAD ACCIDENTAL COLCAPIRHUA Sr. Pedro Nogales Ariel	3.000.000,00	2.999.949,23	2.641.948,40	100%	SI	-	CONCLUIDO
							ADMINISTRACION DIRECTA PAVIMENTO RIGIDO	1.500.000	-	-	-	-	-	COMPRA DE INSUMOS PARA PAVIMENTO - PLANIFICACION
2	17	0007	000		Const. Pav. Flexible Av. Tomas Oconor Dist.B,C	Dist.B,C	-	1.000.000	-	-	-	-	-	PLANIFICACION


3	17	000 8	000		Const. Pav. Av.Franz Tamayo Dist.B	OTB MUNICIPAL Dist.B,C	-	<b>700.000</b>	-	-	-	-	-	-	PLANIFICACION
4	17	000 9	000		Const. Pav. Av. Comercio Dist.B	OTB COMERCI O	-	<b>440.000</b>	-	-	-	-	-	-	PLANIFICACION
5	17	001 1	000		Const. Prado Central Av.B. Galindo Reducto - Mercado Central Municipio de Colcapirhua	Mercado Central Municipio de Colcapirhua	-	400.000	-	-	-	-	-	-	PLANIFICACION
6	17	001 9	000		Const. Pav. F. Diez Medina OTB Holanda Dist. B	OTB Holanda	ADMINISTRACION DIRECTA	<b>140.000</b>	139.795,00	139.795,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
7	17	002 0	000		Const. Pav. De Vias Laterales Av.B. Galindo OTB Huanuni Dist. B	OTB Huanuni	-	<b>140.000</b>	-	-	-	-	-	PLANIFICACION	
8	17	002 1	000		Const. Pav. Calle 27 de Julio OTB Morococala Dist. B	OTB Morococala	CONST.QUIRVILCONS T	<b>100.000</b>	99.789,61	-	2%	-	-	EN PROCESO DE CONTRATACION	
9	17	002 2	000		Const. Pav. Calle J. Bautista OTBs Santa Insabel - Morococala Dist. B	OTBs Santa Insabel - Morococala	-	<b>100.000</b>	-	-	-	-	-	PLANIFICACION	
10	17	002 3	000		Const. Pav. Calle Los Paraisos- Pulacayo OTB California Dist.B	OTB California	ADMINISTRACION DIRECTA	<b>140.000</b>	137.821,00	137.821,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO	

11	17	002 4	000		Const. Pav. Av.de Vias OTB Fabril Capacachi Dist.B	OTB Fabril Capacachi	ADMINISTRACION DIRECTA	140.000	139.795,00	-	100%	SI	SI	CONCLUIDO
12	17	002 5	000		Const. Pav. Av. 27 de Abril OTB Elizabeth Seton Dist.B	OTB Elizabeth Seton	ADMINISTRACION DIRECTA	140.000	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE CONTRATACION
13	17	002 6	000		Const. Pav. Av.Carita OTB OTB Oasys Dist. B	OTB Oasys	ADMINISTRACION DIRECTA	120.000	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE CONTRATACION
14	17	002 7	000	R	Const. Plaza del Eden OTB Nueva Jerusalen Dist. B	OTB Nueva Jerusalen	A-RENTAL Y SERVICIOS Sr. Juan Carlos Borda Marquez	50.000	50.000,00	-	40%	-	-	EN EJECUCION
15	17	002 8	000		Const. Pav. Calle los Ceibos OTB La Pradera Dist. B	OTB La Pradera	ADMINISTRACION DIRECTA	140.000	139.150,00	139.150,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
16	17	002 9	000		Const. Pav. Pasaje Innominado OTB Santa Isabel Dist. B	OTB Santa Isabel	-	100.000	-	-	-	-	-	PLANIFICACION
17	18	000 0	002		Mtto, Mejoramient o y Ripiado Calles y caminos distrito B	DIST. B	VARIOS	120.000	115.000,00	115.000,00	99%	SI	SI	SE TENDIO UN 99 % DE LA DEMANDA DE LAS OTB.
18	22	000 4	000		Const. Cancha Multiple OTB Florida Sud Dist. B	OTB Florida Sud	-	140.000	-	-	-	-	-	PLANIFICACION
19	31	000 1	000		Const. Drenaje Pluvial OTB Bloques	OTB Bloques Florida Norte	DASOCONS Edwin Soria	80.000	80.000,00	-	15%	-	-	EN EJECUCION

					Florida Norte Dist.B									
20	31	000 2	000	R	Const. Muro de Contencion Torrentera Rummy Mayu Lado Oeste OTB San alfonso Dist. B	OTB San alfonso	Enpresa Unipersonal CONSTRUCTORA LLANOS ORELLANO Sr. Jose Gustavo Llanos Orellana	140.000	140.000	-	100%	SI	-	CONCLUIDO
<b>TOTALES</b>								<b>8.830.000</b>	<b>4.041.300</b>	<b>3.173.714</b>				

N° PROYECTOS DISTRITO B	20
PROYECTOS CONCLUIDOS	7
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	3
PROYECTOS PENDIENTES	10
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO</b>	<b>58%</b>
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO</b>	<b>15%</b>

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	37,80
-----------------------------	-------

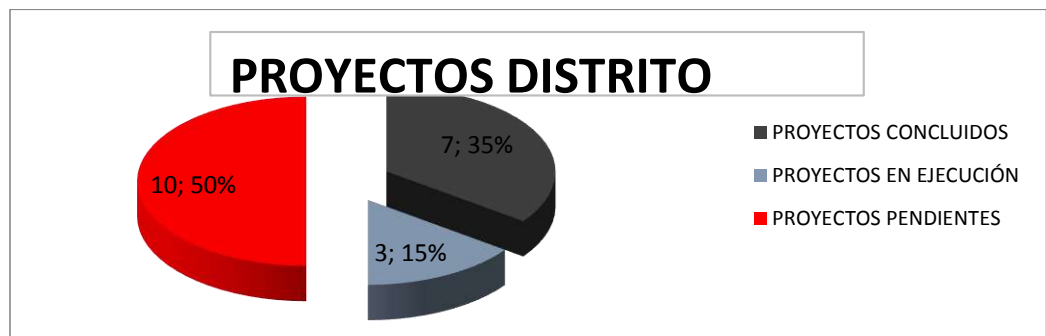



APERTURA PROGRAMÁTICA				DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATADO Bs.	MONTO PLANILLADO Bs.	AVANCE FÍSICO %	ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	OBSERVACIONES
PROG	PROY	ACT										
12	0000	000		<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS</b>								
12	0004	000		Const. Sist. Canal de Riego OTB Fabril Capacachi Dist. B		0						
13	0000	000		<b>DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>								
13	0008	000		Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	ROSENDO MOSQUERA A.	220.000	197.111,01	54.250,29	28%			EN EJECUCION
16	0000	000		<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>								
16	0000	003		Mantenimiento Alumbrado Publico OTB Magisterio Dist. B		34.032						
16	0000	004		Mantenimiento Alumbrado Publico OTB Santa Isabel Dist. B		10.000						
16	0004	000	R	Ampliacion Alumbrado Publico OTB Bloques Florida Dist. B		8.000						
17	0000	000		<b>INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL</b>								
17	0003	000		Mejoramiento de la Plaza OTB Santa Isabel Dist. B		220.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0004	000		Mejoramiento Area Verde Av. Comercio OTB Santa Rosa Catavi Dist. B		0						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0011	000	R	Construcción de Plazuela y Parque Infantil OTB San Alfonso Dis. B		186.524						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0012	000	R	Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B		179.843						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0032	000		Const. Pav. Rígido Av. Julio Romano OTB Holanda Dist. B		90.390						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0053	000		Const. Pav. Rígido Empalme Av. Villarroel OTB Municipal Dist. B	PLASCONST	43.000	43.000,00	43.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0000	000		<b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES</b>								

18	0000	002		Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	VARIOS	220.000							
18	0000	006		Conformacion de Plataformas Municipio de Colcapirhua	VARIOS	1.350.000							
18	0013	000		Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	LIC. MELVI HEREDIA C.	50.000	49.989,06	49.989,06	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0014	000		Const. Pav. Rigido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	CARLOS MORANTE	250.000	231.418,02	224.339,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0015	000		Const. Pav. Rigido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	COPHE CONSTRUCCIONES	220.000	219.544,62	219.544,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0016	000		Const. Empedrado Lado Sud Urb. Abaroa OTB Santa Rosa Central Dist. B		259.918							ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0017	000		Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	ING. NELSON MERCADO V.	305.000	219.808,00	219.808,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
							85.192,00						POR EJECUTAR
18	0018	000		Const. Pav. Rigido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	ELMER C. PADILLA O.	177.000	171.271,92	157.155,05	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0019	000		Const. Pav. Rigido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	174.161,24	163.342,50	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0020	000		Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	ARQ. KATTY K. PEREZ M.	175.000	99.217,71	99.217,71	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0021	000		Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	219.689,73	219.684,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0022	000		Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	265.000	149.925,64	144.482,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
					ING. ROY R. LUJAN R.		89.995,10	89.876,95	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0023	000		Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	ING. FELIPE HERRERA S.	234.280	215.462,92	219.920,87	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0024	000		Const. Pav. Rigido Av. Sexta y Calle Jorge Barrero OTB Elizabeth Seton Dist. B		220.000							ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0025	000		Const. Pav. Rigido Calle Cercado-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B		0							ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0026	000		Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	418.989	300.318,80	327.448,52	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
													POR EJECUTAR
18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	SIAJSA LTDA	316.000	219.107,07	219.107,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0028	000		Const. Pav. Rigido Calle Los Pinos OTB La Pradera Dist. B		320.000							ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0029	000		Const. Pav. Rigido Calle Paraiso OTB California Dist. B		220.000							ARQ. CLAUDIA ORELLANA

18	0030	000		Apertura de Camino OTB San Alfonso Dist. B		0							
18	0031	000		Const. Empedrado Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B		0							
18	0032	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Elfec, Cucardas Dist. B	ING. FELIPE HERRERA S.	270.000	49.566,62	49.566,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
					ING. FELIPE HERRERA S.		219.278,44	219.278,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0050	000		Const. Pav. Rigido OTB Huanuni Dist. B		109.705							
18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villaruel Colcapirhua Fase I	PLASCONST	6.605.630	2.507.078,45	2.507.078,45	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
					K-LUYO & ASOCIADOS		3.948.714,14		22%			EN EJECUCION	
18	0064	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	F & Z ING. LORENA ZENTENO	537.555	893.146,25	831.210,80	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0065	000	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	JOSE TERAN	321.408	146.779,22	146.779,22	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
					JOSE TERAN		149.913,97	149.913,97	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0066	000	R	Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	JOSE TERAN	60.000	59.680,21	59.680,21	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B		35.000							
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vias OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II		11.609							
18	0072	000	R	Const. Pav. Rigido C/Noel Kemp Mercado OTB Holanda Dist. B Tramo III		0							
18	0073	000	R	Mejoramiento de Vias OTB San alfonso Dist. B		0							
18	0087	000	R	Const. Empedrado OTB Capacachi Central Dist. B		445							
18	0088	000	R	Const. Empalme de Vias Excombatientes y Capitan V. Ustariz OTB Santa Rosa Central Dist. B		15.000							ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Elfec Cucardas Dist. B		10.063							
18	0102	000	R	Const. Pav. Rigido C/Noel Kemp Mercado OTB Holanda Dist. B Tramo IV		0							
18	0103	000	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	HILDA MAMANI ARCE	55.000	55.000,00	55.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0104	000		Apertura Camino Vecinal OTB Martin Cardenas Dist. B (Expropiacion)		80.000							
18	0106	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	ARQUIFORMA S.R.L.	101.106	91.452,73	91.452,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
18	0110	000	R	Const. Empedrado de Vias OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B		40.470							

18	0111	000	R	Const. Empedrado OTB Comercio Cochabamba Dist. B		195.000						
18	0116	000		Const. Empalmes C/ Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B		0						
18	0121	000		Const. Pav. Rígido OTB Fabril Capacachi Dist. B	CARLOS SALVATIERRA	215.000	211.999,96	61.336,49	29%			EN EJECUCION
18	0122	000		Const. Pav. Rígido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	HIPOLITO CAMACHO	120.000	118.400,05	111.907,96	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B		230.141						
18	0133	000		Const. Pav. Rígido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B		285.000						
<b>20</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>		<b>SERVICIO DE SALUD</b>								
20	0001	000	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	GAAR INGENIERIA	5.691.439	2.893.386,76	3.162.604,70	100%	SI	SI	CONCLUIDO
<b>22</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>		<b>DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>								
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	METAL OBRAS CONSTRUCCIONES	335.000	254.243,86	254.243,86	100%	SI	SI	CONCLUIDO
							80.756,14					POR EJECUTAR
22	0007	000		Mejoramiento Cancha Multiple OTB Santa Rosa Catavi Dist. B		0						
22	0025	000		Mejoramiento Cancha Polifuncional OTB Fabril Capacachi Dist. B		5.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
22	0030	000		Const. Cancha Polifuncional la Salvadora OTB Capacachi Central Dist. B		140.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
<b>31</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>		<b>PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES</b>								
31	0006	000		Const. Muro de Contencion lado oeste Torrentera Romy Mayu OTB San alfonso Dist. B		269.540						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
						0						

APERTURA PROGRAMATICA				PROYECTO	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVINCIAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
13	0008	000		Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	28%			EN EJECUCION
17	0053	000		Const. Pav. Rigido Empalme Av. Villarroel OTB Municipal Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0000	002		Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	65%			EN EJECUCION
18	0013	000		Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0014	000		Const. Pav. Rigido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0015	000		Const. Pav. Rigido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0017	000		Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0017	000		Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0018	000		Const. Pav. Rigido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0019	000		Const. Pav. Rigido Av. D'orbigni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0020	000		Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0021	000		Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000		Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Araya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000		Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Araya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0023	000		Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0026	000		Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0026	000		Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0032	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Efec, Cucardas Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0032	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Efec, Cucardas Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	35%			EN EJECUCION
18	0064	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	100%	SI	SI	CONCLUIDO

18	0066	000	R	Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vias OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Efec Cucardas Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0103	000	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0106	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0110	000	R	Const. Empedrado de Vias OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0121	000		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	29%			EN EJECUCION
18	0122	000		Const. Pav. Rigido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	0%			PARA EJECUCION
18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	0%			PARA EJECUCION
20	0001	000	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	100%	SI	SI	CONCLUIDO
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR

INFORME DE AVANCE FISICO PROYECTOS DISTRITO B														
AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015														
Director de Obras Publicas: Ing. Carlo G. Mercado Rocabado														
Supervisor Dist. B: Ing. Wilson Jobany Bustamante A.														
N°	APERTURA PROGRAMATICA				PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO PLANILLADO Bs.	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
1	13	0008	000		Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	OTB SANTA ROSA CATAVI	ROSENDO MOSQUERA A.	220.000	197.111,01	54.250,29	28%			EN EJECUCION
2	17	0053	000		Const. Pav. Rígido Empalme Av. Villarroel OTB Municipal Dist. B	OTB MUNICIPAL	PLASCONST	43.000	43.000,00	43.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
3	18	0000	002		Mto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	DISTRITO B	VARIOS	220.000			65%			EN EJECUCION
4	18	0013	000		Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	OTB CAPACACHI CENTRAL	LIC. MELVI HEREDIA C.	50.000	49.989,06	49.989,06	100%	SI	SI	CONCLUIDO
5	18	0014	000		Const. Pav. Rígido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	OTB MOROCOCAL A	CARLOS MORANTE	250.000	231.418,02	224.339,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
6	18	0015	000		Const. Pav. Rígido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	OTB SAUSALITO	COPHE CONSTRUCCIONES	220.000	219.544,62	219.544,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
7	18	0017	000		Const. Pav. Rígido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	OTB BARTOS	ING. NELSON MERCADO V.	305.000	219.808,00	219.808,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
8				OTB BARTOS					85.192,00		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
9	18	0018	000		Const. Pav. Rígido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	OTB MUNICIPAL	ELMER C. PADILLA O.	177.000	171.271,92	157.155,05	100%	SI	SI	CONCLUIDO


10	18	0019	000		Const. Pav. Rigido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	OTB MAGISTERIO	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	174.161,24	163.342,50	100%	SI	SI	CONCLUIDO
11	18	0020	000		Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	OTB SANTA ISABEL	ARQ. KATTY K. PEREZ M.	175.000	99.217,71	99.217,71	100%	SI	SI	CONCLUIDO
12	18	0021	000		Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	OTB OASYS	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	219.689,73	219.684,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
13	18	0022	000		Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Araya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	OTB NUEVA JERUSALEN	ING. ROY R. LUJAN R.	265.000	149.925,64	144.482,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
14						OTB NUEVA JERUSALEN	ING. ROY R. LUJAN R.		89.995,10	89.876,95	100%	SI	SI	CONCLUIDO
15	18	0023	000		Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	OTB HOLANDA	ING. FELIPE HERRERA S.	234.280	215.462,92	219.920,87	100%	SI	SI	CONCLUIDO
16	18	0026	000		Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	OTB FLORIDA NORTE	ING. ROY R. LUJAN R.	418.989	300.318,80	327.448,52	100%	SI	SI	CONCLUIDO
17						OTB FLORIDA NORTE			118.670,20		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	OTB FLORIDA SUD	SIAJSA LTDA	316.000	219.107,07	219.107,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
19						OTB FLORIDA SUD			96.892,93		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
20	18	0032	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Elfec, Cucardas Dist. B	OTB ELFEC CUCARDAS	ING. FELIPE HERRERA S.	270.000	49.566,62	49.566,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
21						OTB ELFEC CUCARDAS	ING. FELIPE HERRERA S.		219.278,44	219.278,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
22	18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	DISTRITO B	PLASCONST	6.605.630	2.507.078,45	2.507.078,45	100%	SI	SI	CONCLUIDO
23						DISTRITO B	K-LUYO & ASOCIADOS		3.948.714,14		35%			EN EJECUCION
24	18	0064	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	DISTRITO B	F & Z ING. LORENA ZENTENO	537.555	893.146,25	831.210,80	100%	SI	SI	CONCLUIDO
25	18	0065	000	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	OTB OASYS	JOSE TERAN	321.408	146.779,22	146.779,22	100%	SI	SI	CONCLUIDO
26						OTB OASYS	JOSE TERAN		149.913,97	149.913,97	100%	SI	SI	CONCLUIDO



27	18	0066	000	R	Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	OTB LA PRADERA	JOSE TERAN	60.000	59.680,21	59.680,21	100%	SI	SI	CONCLUIDO
28	18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B	OTB HOLANDA		35.000			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
29	18	0071	000	R	Const. Empedrado de vías OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	OTB SANTA ROSA CENTRAL		11.609			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
30	18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Efec Cucardas Dist. B	OTB ELFEC CUCARDAS		10.063			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
31	18	0103	000	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	OTB CAPACACHI CENTRAL	HILDA MAMANI ARCE	55.000	55.000,00	55.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
32	18	0106	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	OTB ELIZABETH SETON	ARQUIFORMA S.R.L.	101.106	91.452,73	91.452,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
33	18	0110	000	R	Const. Empedrado de Vias OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B	OTB MARTIN CARDENAS	EUSEBIO ANZALDO	40.470	99.950,00	99.950,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
34	18	0121	000		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	OTB FABRIL CAPACACHI	CARLOS SALVATIERRA	215.000	211.999,96	61.336,49	29%			EN EJECUCION
35	18	0122	000		Const. Pav. Rigido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	OTB SAUSALITO	HIPOLITO CAMACHO	120.000	118.400,05	111.907,96	100%	SI	SI	CONCLUIDO
36	18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	OTB URBANIZACION LA PAZ		230.141			0%			PARA EJECUCION
37	18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	OTB COMERCION COCHABAMBA		285.000			0%			PARA EJECUCION
38	20	0001	000	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	OTB CAPACACHI CENTRAL	GAAR INGENIERIA	5.691.439	2.893.386,76	3.162.604,70	100%	SI	SI	CONCLUIDO
39	22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	OTB MARTIN CARDENAS	METAL OBRAS CONSTRUCCIONES	335.000	254.243,86	254.243,86	100%	SI	SI	CONCLUIDO
40						OTB MARTIN CARDENAS				80.756,14		0%		
<b>TOTALES</b>								<b>18.258.690</b>	<b>14.680.123</b>	<b>10.251.170</b>				

Nº PROYECTOS DISTRITO B	40
PROYECTOS CONCLUIDOS	27
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	6
PROYECTOS PENDIENTES PARA REPROGRAMACION	7
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO</b>	<b>71,41</b>

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	71,41
-----------------------------	-------

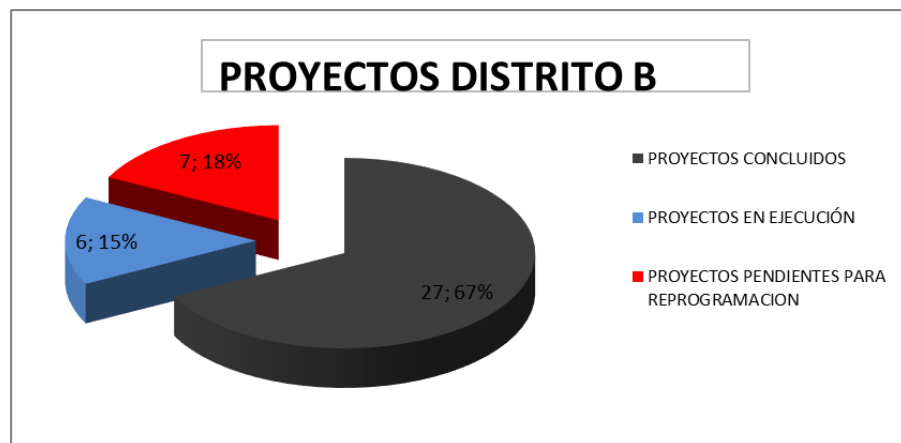

NOTA: LOS DE COLOR ROJO SON LOS PROYECTOS PARA REPROGRAMAR EL 2016

APERTURA PROGRAMATICA				PROYECTO	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO P/SER REPROGRAMADO Bs.	OBSERVACIONES
13	0008	000		Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	220.000,00	165.749,71	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0017	000		Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	305.000,00	85.192,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0026	000		Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	418.989,00	118.670,20	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	316.000,00	96.892,93	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR

18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	<b>6.605.630,00</b>	3.098.476,90	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B	<b>35.000,00</b>	35.000,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vias OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	<b>11.609,00</b>	11.609,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Efec Cucardas Dist. B	<b>10.063,00</b>	10.063,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0121	000		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	<b>215.000,00</b>	153.663,51	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	<b>230.141,00</b>	230.141,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	<b>285.000,00</b>	285.000,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	<b>335.000,00</b>	80.756,14	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
							PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0000	002		Mtto y Mejoramiento av. 16 de Julio Distrito B		42.024,31	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0000	006		Conformacion de Plataforma Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B		20.942,80	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
<b>TOTALES</b>					<b>8.987.432,00</b>	<b>4.371.214,39</b>	

1	000	00	B		Const. Pozo de Agua Potable OTB Santa Rosa Central Dist. B	<b>140.000</b>
1	8	0				
1	001	00	B		Mej. Agua Potable C/ Sist. Tratamiento OTB Comercio Cbba. Santa Rosa Sud Dist. B	<b>200.000</b>
1	5	0				
1	002	00	B	R	Mej. Sistema de Agua Potable OTB Nueva Jerusalem Dist. B	<b>45.000</b>
1	1	0				
1	003	00	B	R	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	<b>165.750</b>
1	6	0				
1	004	00	B	R	Const. Perforacion de Pozo de Agua Potable OTB Huanuni Dist. B	<b>140.000</b>
1	0	0				
1	000	00	B	R	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	<b>0</b>
3	4	0				
1	000	00	B	R	Const. Muro de Contencion lado oeste Torrentera Rummy Mayu OTB San alfonso Dist. B	<b>69.540</b>
3	5	0				
1	000	00	B		Mantenimiento y Compra de Luminarias distrito B	<b>80.000</b>
6	0	3				
1	000	00	B	R	Ampliacion Alumbrado Publico OTB Bloques Florida Dist. B	<b>8.000</b>
6	2	0				
1	000	00	B		Mejoramiento Plaza Retamoso OTB Holanda Dist. B	<b>100.000</b>
7	1	0				
1	000	00	B	R	Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B	<b>100.000</b>
7	2	0				

1 7	000 4	00 0	B		Const. Plaza Principal OTB Florida Sud Dist. B	<b>140.000</b>
1 7	000 7	00 0	B	R	Construcción de Plazuela y Parque Infantil OTB San Alfonso Dis. B	<b>256.524</b>
1 7	000 8	00 0	B	R	Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B	<b>111.550</b>
1 7	001 3	00 0	B	R	Const. Empedrado Lado Sud Urb. Abaroa OTB Santa Rosa Central Dist. B	<b>259.918</b>
1 7	001 4	00 0	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	<b>75.782</b>
1 7	001 5	00 0	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	<b>14.359</b>
1 7	001 6	00 0	B	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta y Calle Jorge Barrero OTB Elizabeth Seton Dist. B	<b>238.000</b>
1 7	001 7	00 0	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	<b>89.540</b>
1 7	001 8	00 0	B	R	Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	<b>96.896</b>
1 7	001 9	00 0	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Los Pinos OTB La Pradera Dist. B	<b>150.527</b>
1 7	002 0	00 0	B	R	Const. Pav. Rigido OTB Huanuni Dist. B	<b>4.664</b>
1 7	002 1	00 0	B	R	Const. Empalme de Vias Excombatientes y Capitan V. Ustariz OTB Santa Rosa Central Dist. B	<b>15.000</b>
1 7	002 2	00 0	B	R	Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	<b>153.663</b>
1 7	002 3	00 0	B	R	Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	<b>300.141</b>
1 7	002 4	00 0	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	<b>285.000</b>
1 7	004 0	00 0	B	R	Mejoramiento de la Plaza OTB Santa Isabel Dist. B	<b>115.603</b>
1 7	004 4	00 0	B	R	Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	<b>85.192</b>
1 7	004 5	00 0	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Modesto Omiste OTB Municipal Dist. B	<b>89.700</b>
1 7	004 6	00 0	B	R	Const. Pav. Rigido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	<b>56.657</b>
1 7	004 8	00 0	B	R	Apertura Camino Vecinal OTB Martin Cardenas Dist. B (Expropiacion)	<b>80.000</b>
1 8	000 0	00 2	B		Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	<b>260.000</b>
1 8	000 2	00 0	B		Construccion Av. Dorbigni Dist. B,C,D	<b>1.800.000</b>
1 8	000 6	00 0	B		Const. Pav. Flexible Av. Tomas Oconor Dist.B,C	<b>500.000</b>
1 8	001 5	00 0	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Paraiso OTB California Dist. B	<b>420.000</b>


18	00160	B		Const. Pav. Rigido Calles Joaquin Sarcedo-Jose Ayala -Eduardo Saracho OTB Elizabeth Seton Dist. B	200.000
18	00170	B		Const. Pavimento Calle 18 y 1ro. de Mayo- OTB Fabril Capacachi Dist. B	200.000
18	00180	B		Const. Empedrado de Vias OTB Martin Cardenas Dist. B	200.000
18	00190	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	200.000
18	00200	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Araya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	230.640
18	00210	B		Const. Pav. Av. Comercio OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	200.000
18	00220	B		Const. Pav. Rigido OTB Cucardas Dist. B	200.000
18	00230	B		Const. Pav. Calle F Caja de la Vega OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	200.000
18	00240	B		Const. Pav. Lado Norte Av. B. Galindo Sector Dimacos-Farmacorp OTB Santa Isabel Dist. B	200.000
18	00250	B		Const. Pav. Pasaje Modesto Omiste OTBs Magisterio Coña Coña-Municipal Coña Coña Dist. B	200.000
18	00380	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Araya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	0
18	00440	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Paraiso OTB California Dist. B	0
22	00040	B		Const. Graderas Cancha Multifuncional OTB Huanuni Dist. B	120.000
22	00060	B	R	Const. Cancha Polifuncional la Salvadora OTB Capacachi Central Dist. B	140.000
22	00100	B	R	Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	80.756
31	00010	B		Const. Muro de Contencion Torrentera Rummy Mayu Lado Oeste OTB San alfonso Dist. B	469.540

INFORME DE AVANCE FISICO PROYECTOS DISTRITO C											
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017											
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS: Arq. Caludia Orellana Alba											
SUPERVISOR DISTRITO: Ing. Ronald Becerra Ponce											
APERTURA PROGRAMATICA	PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO	MONTO DE CONTRATO	MONTO PLANILLA DO	AVANCE FISICO	ACTA RECEP.	ACTA RECEP. DEF.	OBSERVACIONES	

PROG	PROY	ACT	DIS	REP								PROV		
13	0001	000	C	R	Const. Canal Desague Pluvial Sector Aduana Dist.C	OTB FERROVIARIO NORTE	JOSÉ CARLOS HUARACHI	133.000,00	448.962,04	471.294,51	100,00 %	SI	SI	CONCLUIDO
								70.000,00						(PLANIFICACION)
17	0049	000	C	R	Const. Planta de Hormigon Municipio de Colcapirhua	OTB MOYAPAMPA	CONSTRUCTORA "CRISMELARICH"	100.000,00	99.998,45	99.998,45	100,00 %	SI	SI	CONCLUIDO
21	0006	000	D	R	"Const. Salón Múltiple U.E. Daniel Salamanca - 27 de Mayo (Trabajos Complementarios)"	OTB COLCAPIRHUA CENTRAL	CONSTRUCTORA "CRISMELARICH"	70.000,00	69.977,88	69.977,88	100,00 %	SI	SI	CONCLUIDO
20	0000	003	A		Ampliacion centro de salud Kami	OTB SAN JOSÉ DE KAMI	VECRI S.R.L.	810.000,00	969.988,64	929.299,77	100,00 %	SI	SI	CONCLUIDO
17	0030	000	C		Const. Pav. Calle Viloma OTB Libertador Bolívar Dist.C	OTB LIBERTADOR BOLIVAR		140.000,00						EN CRONOGRAMA PLANTA H°
17	0031	000	C		Const. Pavimento Av. Andina OTB Moyapampa Dist.C	OTB MOYAPAMPA		140.000,00						EN CRONOGRAMA PLANTA H°
17	0032	000	C		Const. Pav. Calle Tupiza OTB Ronny Rojas Dist.C	OTB RONNY ROJAS	CONSTRUCTORA GOYTIA COCA	120.000,00	84.423,19		100,00 %			CONCLUIDO
17	0033	000	C		Const. Pav. Calle Ricardo Mujica OTB San Francisco Dist. C	OTB SAN FRANCISCO		100.000,00						(PLANIFICACION)
17	0034	000	C		Const. Parque Infantil OTB San Francisco Dist. C	OTB SAN FRANCISCO		40.000,00						(PLANIFICACION)
17	0035	000	C		Const. Pav. Vías laterales Av. Blanco Galindo OTB Sumumpaya Central Dist. C	OTB SUMUMPAYA CENTRAL		140.000,00						EN CRONOGRAMA PLANTA H°
17	0036	000	C		Const. Pav. Calle Cala Cruz OTB Ferroviario Norte Dist. C	OTB FERROVIARIO NORTE	ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL	140.000,00	134.426,00		100,00 %			CONCLUIDO
17	0037	000	C		Const. Pav. Calle Pulacayo OTB Ferroviario Sud Dist. C.	OTB FERROVIARIO SUD	GOSOBOL S.R.L.	140.000,00	139.321,37		5,00%			EJECUCIÓN

22	0005	000	C		Const.Tepeado Cancha Futbol OTB Canada Dist.C	OTB CANADA		140.000,00					(PLANIFICACION)
31	0003	000	C		Const. Canalizacion Desague Pluvial Calle Beni OTB Jazmin	OTB JAZMIN	OBRA MAGISTRAL	100.000,00	69.943,32		100,00%		CONCLUIDO

Resumen de Proyectos Distrito C		
Numero de Proyectos DISTRITO C	14	15
Proyectos Concluidos	7	47%
Proyectos en Ejecucion	1	7%
Proyectos Pendientes	7	47%
PORCENTAJE FISICO	50,36%	
PORCENTAJE FINANCIERIO	25,93%	

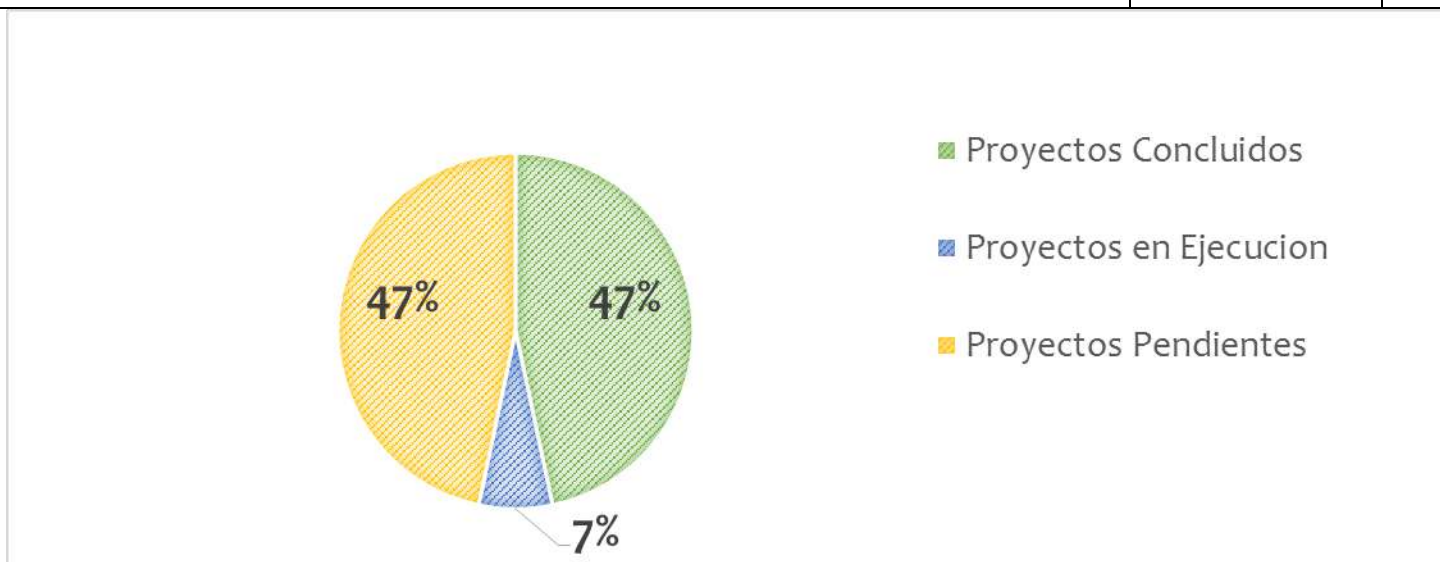

**INFORME DE AVANCE PROYECTOS SUPERVISION DEL DISTRITO C DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**


APERTURA PROGRAMATICA				PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO (Bs.)	MONTO DE CONTRATO (Bs.)	PLAZO SEGÚN CONTRATO (días)	ORDEN DE CAMBIO CONT MODIF	MONTO EJECUTADO/ PLANILLADO	RETENCION 7% (Bs.)	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	FECHA DE CONCLUSION	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ACTA RECEP. PROV.	ACTA RECEP. DEF.	OBSERVACIONES
PROG	PROY	ACT	DIST																
13	0000	001	C	CONST CANAL DE DESGUE PLUVIAL SECTOR ADUANA DIST C	SECTOR ADUANA	CONSTRUCTORA I.S.M.	320.000,00	272.002,98	60	275.541,52	275.541,52	19.287,90	06/06/2016	04/08/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
13	0000	003	C	CONST. CANALIZACION TORRENTERA CHIJLLAWIRI OTB TARAMOCKO DIST. A	OTB TARAMOCKO	INGENIERIA HORAZONTESS SRL.	1.096.000,00	968.519,75	45	1.064.408,56	1.064.408,56		04/01/2016	30/03/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
13	0001	000	C	CONST. CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL SECTOR ADUANA DIST. C	OTB FERROVIARIO NORTE	JOSÉ CARLOS HUARACHI	500.000,00	448.962,04	48	471.294,51			05/12/2016		37,45%	37,45%			EN EJECUCION
16	0001	000	C	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO OTB ANDRES CUSCRIERRI DIST. C	OTB ANDRES CUSCRIERRI	LA ELECTRICA		96.983,00	5		96.983,00		11/12/2015	15/12/2015	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0009	000	C	CONST. PLANTA DE HORMIGON MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	OTB MOYAMPAMPA	RIDEPRO SRL.	1.366.657,00	1.308.736,04	109		1.317.386,13		04/01/2016	27/05/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0025	000	C	CONST. PAV. RIGIDO OTB SAN FRANCISCO DIST. C	OTB SAN FRANCISCO	C.O.C MORANTE S.R.L.	86.857,00	80.748,17	30	78.609,49	78.609,49	5.502,66	30/10/2015	14/12/2015	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0026	000	C	CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE 21 DE SEPTIEMBRE	OTB CANADA	FLORES CACERESS S.R.L.	210.000,00	205.632,81	40	205.632,81	205.632,81	14.394,30	18/11/2015	07/12/2015	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO



					OTB CANADA DIST. C															
17	0028	000	C		CONST. PAV. DE VIAS OTB RONNY ROJAS DIST C	OTB RONNY ROJAS	SR. ARIEL BERNABE HIMOJOS A		139.818,39	35	132.972,95	132.972,95	9.308,11	03/11/2015	07/12/2015	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0029	000	C		CONST PAV RIG LADO NORTE AV BLANCO GALINDO OTB SUM NORTE DIST C	OTB SUMU MPAYA NORTE	SEPRI SRL.	402.300,00	377.363,28	40	384.873,23	384.873,23	26.941,13	29/12/2015	06/02/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0030	000	C		CONST PAV RIG GENERAL PANDO COLCAPIRHUA	DIST. C	ING. EDGAR SALAZAR M.	900.000,00	858.567,74	60	868.194,66	868.194,66	60.773,63	23/10/2015	01/07/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0038	000	C		CONST. PAV. RIGIDO AV. PHIÑA CALLE COLCAPIRHUA	DIST. C	COPHE Y ASOCIADOS	970.889,91	970.889,91	59		970.889,91		11/12/2015	07/02/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0041	000	C		CONST. ENMALLADO AREA VERDE PARA PARQUE OTB SENAC DIST. C	OTB SENAC	ROSENDO MOSQUERA AGUILAR	39.732,00	39.730,85	20		39.730,85		21/09/2016	10/10/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0049	000	C		CONST. PAV. RIGIDO OTB JAZMIN DIST. C	OTB JAZMIN	EMCYSMO	113.511,00	99.996,71	25	98.823,99	98.823,99	6.917,68	14/11/2016	05/12/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0051	000	C		CONST. EMPEDRADO CALLE JOSE ENCINAS OTB FLORIDA II NORTE DIST. C	OTB FLORIDA II NORTE	CONSTRUCTORA GOYTIA COCA	40.500,00	40.499,65	15		40.499,65		26/08/2016	09/09/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0067	000	C		CONST. PAV. RIGIDO CALLE 10 DE FEBRERO OTB FERROVIARIO NORTE DIST. C	OTB FERROVIARIO NORTE	GOSOBO L S.R.L.		144.747,59	30	151.116,84	151.116,84	10.578,18	24/08/2016	22/09/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0007	000	C		COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONST. PAV. RIGIDO Av. ANDINA OTB MOYAPAMPA DIST. C	OTB MOYAPAMPA	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO	169.404,00	169.404,00	1		169.404,00		23/11/2016	23/11/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO

18	0007	000	C	COMPRA DE AGREGADOS PARA CONST. PAVIMENTO Av. ANDINA OTB MOYAPAMPA DIST. C	OTB MOYAPAMPA	CONSTRUCTORA COLOCRUZ	32.415,00	32.415,00	9		32.415,00		21/11/2016	16/12/2016	100,00%	100,00%	SI	CONCLUIDO
18	0007	000	C	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO AVENIDA ANDINA OTB MOYAPAMPA DIST. C Y CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO CALLE SUCRE	OTB MOYAPAMPA	LUJAN INGENIEROS	161.792,56	161.792,56	65				24/10/2016	15/12/2016	100,00%			
18	0026	000	C	CONST. PAV. CALLE WARA WARA OTB LIBERTADOR BOLIVAR DIST. C	OTB LIBERTADOR BOLIVAR	CONGRESO SOL LTDA.	1.100,00	1.044,070,05	102	1.044,070,05	955.876,22		04/01/2016	02/05/2016	95,00%	91,55%	SI	FALTA PAGAR PLANILLA N°3 Y DE CIERRE
18	0027	000	C	CONST. PAV. C/30 DE ENERO OTB SUMUMPAYA CENTRAL DISCT. C	OTB SUMUMPAYA CENTRAL	COPHE Y ASOCIADOS	200.000,00	185.067,32	45	194.320,67	194.320,67	13.602,44	07/04/2016	13/05/2016	100,00%	100,00%	SI	CONCLUIDO
18	0029	000	C	CONST. EMPEDRADO CALLE WARA KASA OTB SUMUMPAYA NORTE DIST. C	OTB SUMUMPAYA NORTE	SALAZAR CRUZ	275.000,00	174.393,49	44		174.393,49	12.207,54	28/04/2016	10/06/2016	100,00%	100,00%	SI	CONCLUIDO
18	0029	000	C	CONST. EMPEDRADO CALLE WARA KASA OTB SUMUMPAYA NORTE DIST. C	OTB SUMUMPAYA NORTE	LEONARDO SALAZAR CRUZ	275.000,00	87.502,36	16		87.502,36	6.125,17	15/11/2016	30/11/2016	100,00%	100,00%	SI	SI
22	0003	000	C	CONST TINGLADO CAMPO POLIFUNCIONAL OTB CANADA DIST C	OTB CANADA	EMPRESA E.S.T	350.000,00	310.047,50	48	325.518,20	325.518,20	22.786,27	18/04/2016	04/06/2016	100,00%	100,00%	SI	SI

Resumen de Proyectos Distrito C		
<b>Numero de Proyectos</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>
Proyectos Concluidos	21	95%
Proyectos en Ejecucion	1	5%
Proyectos Pendientes	0	0%
Porcentaje de Avance Fisico	95%	

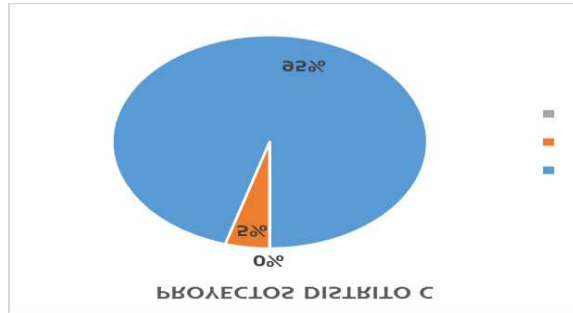

INFORME ANUAL DE MANTENIMIENTOS																	
APERTURA PROGRAMATICA					PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO	MONTO CONTRATO	PLAZO SEGÚN CONTRATO	FECHA DE CONCLUSIÓN	SUPERVISOR	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ACT A REC EP. PROV.	ACT A REC EP. DEF.	OBS.
PROG	PROY	ACT	DI ST	REP													
18	0000	006	C		CONFORMACION DE PLATAFORMA COLCAPIRHUA CALLE BUEN RETIRO FACE 2 OTB FERROVIARIO SUD DIST C	OTB FERR OVIARIO SUD	ING. ELMER CIRILO PADILLA OMONTE	68.224,29	68.224,29	5	03/11/2015	Ing. Víctor León	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0000	006	C		CONFORMACION DE PLATAFORMA PARA CAPA SUBBASE OTB FERROVIARIO NORTE DIST C	OTB FERR OVIARIO NORTE	NELVI HEREDIA COSSIO	39.685,95	39.685,95	3	13/12/2015	Ing. Víctor León	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO

18	000 0	00 6	C		CONFORMACION DE PLATAFORMA MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA LADO NORTE AV. BLANCO GALINDO OTB SUMUMPAYA NORTE DIST. C	OTB SUMUMPAYA NORTE	COPHE	99.63 6,3 1	99.636, 31	21	13/12/2015	Ing. Víctor León	100,0 0%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
18	000 0	00 6	C		CONFORMACION DE PLATAFORMA MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA AV. DORVIGNI OTB MOYAPAMPA	OTB MOYAPAMPA	COPHE	99.99 1,8 2	99.991, 82	7	05/10/2015	Ing. Víctor León	100,0 0%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
18	000 0	00 3	C		EMPEDRADO DE CALZADA OTB FERROVIARIO SUD, CALLE BUEN RETIRO ENTRE 21 DE ENERO Y 21 DE SEPTIEMBRE	OTB FERROVIARIO SUD	CONSTRUCCIONES CIVILES FERCOCI	8.354, 35	8.354,3 5	2	11/03/2016	Ing. Víctor León	100,0 0%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
18	000 0	00 3	C		EMPEDRADO DE CALZADA OTB SUMUMPAYA CENTRAL (CALLE RICARDO MUJIA, PUKA PUKA Y BENI)	OTB SUMUMPAYA CENTRAL	CONSTRUCCIONES CIVILES FERCOCI	43.55 4,6 0	43.554, 60	10	06/04/2016	Ing. Víctor León	100,0 0%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
18	000 0	00 3	C		MEJORAMIENTO DE VIAS CALLE 21 DE SEPTIEMBRE OTB CANADA DIST C	OTB CANADA	ING. MELVI ABASTO SEVERICHE	16.46 1,5 7	16.461, 57	5	13/05/2016	Ing. Víctor León	100,0 0%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
18	000 0	00 3	C		PROVISION DE RIPIO Y CAPA BASE PARA LAS OTBS MOYAPAMPA, FERROVIARIO NORTE Y FERROVIARIO SUD DISTRITO C	DIST. C	BERNABE HINOJOSA	36.96 0,0 0	36.960, 00	8	23/09/2016	Ing. Ronald Becerra	100,0 0%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
18	000 0	00 3	C		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS CALLES SIWAR Y JESUS LARA OTB JAZMIN DIST. C	OTB JAZMIN	SR. EDWIN JUAN SORIA RIVA	36.75 4,8 6	36.754, 86	8	31/08/2016	Ing. Ronald Becerra	100,0 0%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
18	000 0	00 3	C		PROVISION DE RIPIO Y CAPA BASE PARA LAS OTBS MOYAPAMPA, FERROVIARIO SUD, LIBERTADOR BOLIVAR Y SENAC	DIST. C	RODRIGUEZ ALVAREZ LUIS CARLOS	26.28 0,0 0	26.280, 00	5	17/10/2016	Ing. Ronald Becerra	100,0 0%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
18	000 0	00 3	C		MEJORAMIENTO Y BACHEO CON ASFALTO FLEXIBLE INTERSECCION INGRESO PRINCIPAL OTB	OTB LIBERTADOR		35.70 0,0 0	35.700, 00	5	08/12/2016	Ing. Ronald Becerra	100,0 0%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO

					LIBERTADOR Y AV. VICTOR USTARIZ	BOLIVAR											
18	000 0	00 3	C		PROVISION DE RIPIO OTB FLORIDA II NORTE Y OTB LIBERTADOR BOLIVAR DIST. C	DIST. C	BERNABE HINOJOSA	8.200,00	8.200,00	5	08/12/2016	Ing. Ronald Becerra	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
18	000 0	00 3	C		PROVISION DE RIPIO OTB JAZMIN	DIST. C	BERNABE HINOJOSA	5.000,00	5.000,00	3	08/12/2016	Ing. Ronald Becerra	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
18	000 0	00 3	C		PROVISION DE RIPIO OTB's ANDRES CUSCHIERI, MOYAPAMPA Y Av.REDUCTO	DIST. C	BERNABE HINOJOSA	14.880,00	14.880,00	7	08/12/2016	Ing. Ronald Becerra	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
22	000 0	00 3	C		MANTENIMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL OTB SENAC	OTB SENAC	ING. OMAR I. MAGNE CAYOLA	41.928,37	41.928,37	6	23/07/2016	Ing. Víctor León	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
29	000 0	00 1	C		MEJORAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	MATERA MUNICIPAL	ISIHER INGENIERIA DE SERVICIOS INDUSTRIALES HERBAS ROCABADO	49.592,46	49.592,46	7	08/12/2016	Ing. Ronald Becerra	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
31	000 0	00 1	C		PROTECCION Y REVESTIMIENTO DE CANAL OTB JAZMIN DIST. C	OTB JAZMIN	ENCYSMO	47.000,00	47.000,00	7	08/12/2016	Ing. Ronald Becerra	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
31	000 0	00 2	C		DEFENSIVOS RIO CHIJLLAWIRI DISTRITO A	DIST. A	CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA RICOMACONS SRL.	48.159,63	48.159,63	6	31/10/2016	Ing. Ronald Becerra	100%	100%	SI	SI	CONCLUIDO
31	000 0	00 2	C		MUROS DE CONTENCIÓN EN CHIJLLAWIRI	DIST. C	CONSTRUCTORA CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA RICOMACONS SRL.	49.934,80	49.934,80	5	04/11/2016	Ing. Ronald Becerra	100%	100%	SI	SI	CONCLUIDO
31	000 0	00 2	C		DESAGUE PLUVIAL CALLE 21 DE SEPTIEMBRE OTB CANADA	DIST. C	JHONN OSCAR GOYITA COCA	12.929,45	12.929,45	14	18/11/2016	Ing. Ronald Becerra	100%	100%		SI	CONCLUIDO

OBRAS CONCLUIDAS EN LA GESTION 2016																				
APERTUR A PROGRAMATICA				PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO ASIGNADO (Bs.)	MONTO DE CONTRATO (Bs.)	PLAZO SEGÚN CONTRATO (días Calend.)	ORDEN DE CAMBIO CONT MODIF	MONTO EJECUTADO/ PLANILLADO	RETENCION 7% (Bs.)	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	FECHA DE CONCLUSION	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ACTA RECEP. PROV.	ACTA RECEP. DEF.	OBSERVACIONES
PROG	PROY	ACT	DIST																	
13	0000	001	C	CONST CANAL DE DESGUE PLUVIAL SECTOR ADUANA DIST C	SECTOR ADUANA	CONSTRUCTORA I.S.M.	41/113; IDH 41/119; 41/113	3200,00	272.002,98	60	275.541,52	275.541,52	19.287,90	06/06/2016	04/08/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
13	0000	003	C	CONST. CANALIZACION TORRENTERA CHIJLLAWIRI OTB TARAMOCKO DIST. A	OTB TARAMOCKO	INGENIERIA HORAZONTES SRL.	20/210; IDH 41/119	1.096,00	968.519,75	45	1.064.408,56	1.064.408,56		04/01/2016	30/03/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
16	0001	000	C	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO OTB ANDRES CUSCRIERRI DIST. C	OTB ANDRES CUSCRIERRI	LA ELECTRICA	20/210		96.983,00	5		96.983,00		11/12/2015	15/12/2015	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0009	000	C	CONST. PLANTA DE HORMIGON MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	OTB MOYAPAMPA	RIDEPORO SRL.	41/113; 20/210; 41/113	1.366,70	1.308.736,04	109		1.317.386,13		04/01/2016	27/05/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0025	000	C	CONST. PAV. RIGIDO OTB SAN FRANCISCO DIST. C	OTB SAN FRANCISCO	C.O.C MORANTE S.R.L.	41/113	86.857,00	80.748,17	30	78.609,49	78.609,49	5.502,66	30/10/2015	14/12/2015	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO

17	0026	000	C	CONST. PAVIMENTO RIGIDO CALLE 21 DE SEPTIEMBRE OTB CANADA DIST. C	OTB CANADA	FLORES CACERES S.R.L.	41/113	2100,00	205.632,81	40	205.632,81	205.632,81	14.394,30	18/11/2015	07/12/2015	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0028	000	C	CONST. PAV. DE VIAS OTB RONNY ROJAS DIST C	OTB RONNY ROJAS	SR. ARIEL BERNA BE HIMOJOSA	41/113		139.818,39	35	132.972,95	132.972,95	9.308,11	03/11/2015	07/12/2015	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0029	000	C	CONST PAV RIG LADO NORTE AV BLANCO GALINDO OTB SUM NORTE DIST C	OTB SUMU MPAYA NORTE	SEPRI SRL.	41/113	402,300	377.363,28	40	384.873,23	384.873,23	26.941,13	29/12/2015	06/02/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0030	000	C	CONST PAV RIG GENERAL PANDO COLCAPIRHUA	DIST. C	ING. EDGAR SALAZAR M.	41/113 ; 20/210	900,00	858.567,74	60	868.194,66	868.194,66	60.773,63	23/10/2015	01/07/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0038	000	C	CONST. PAV. RIGIDO AV. PHIÑA CALLE COLCAPIRHUA	DIST. C	COPHEY ASOCIADOS	41/113	487,728	970.889,91	59		970.889,91		11/12/2015	29/01/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0041	000	C	CONST. ENMALLADO AREA VERDE PARA PARQUE OTB SENAC DIST. C	OTB SENAC	ROSENDO MOSQUERA AGUILAR	20/210	39,732	39.730,85	20		39.730,85		21/09/2016	10/10/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0049	000	C	CONST. PAV. RIGIDO OTB JAZMIN DIST. C	OTB JAZMIN	EMCYS MO	41/113	113,511	99.996,71	25		99.996,71	6.999,77	14/11/2016	05/12/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0051	000	C	CONST. EMPEDRADO CALLE JOSE ENCINAS OTB FLORIDA II NORTE DIST. C	OTB FLORIDA II NORTE	CONST RUCTORA GOYTIACA COCA	41/113	40,500	40.499,65	15		40.499,65		26/08/2016	09/09/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0067	000	C	CONST. PAV. RIGIDO CALLE 10 DE FEBRERO OTB FERROVIARIO NORTE DIST. C	OTB FERROVIARIO NORTE	GOSOBOL S.R.L.	41/113 ; 20/210		144.747,59	30	151.116,84	151.116,84	10.578,18	24/08/2016	22/09/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO

18	0007	000	C		CONST. PAVIMENTO Av. ANDINA OTB MOYAPAMPA DIST. C	OTB MOYAPAMPA		41/113	300.000,00												
18	0007	000	C		CONST. PAVIMENTO Av. ANDINA OTB MOYAPAMPA DIST. C	OTB MOYAPAMPA	LUJANINGENI EROS	41/113	161.792,56	161.792,56	65		161.792,56		24/10/2016	15/12/2016	100,00%	100,00%		CONCLUIDO	
18	0027	000	C		CONST. PAV. C/30 DE ENERO OTB SUMUMPAYA CENTRAL DISCT. C	OTB SUMUMPAYA CENTRAL	COPHEY ASOCIADOS	41/113	185.067,32	185.067,32	45	194.320,67	194.320,67	13.602,44	07/04/2016	13/05/2016	100,00%	100,00%		SI	CONCLUIDO
18	0029	000	C		CONST. EMPEDRADO CALLE WARA KASA OTB SUMUMPAYA NORTE DIST. C	OTB SUMUMPAYA NORTE	SALAZAR CRUZ	41/113	174.393,49	174.393,49	44		174.393,49	12.207,54	28/04/2016	10/06/2016	100,00%	100,00%		SI	CONCLUIDO
18	0029	000	C		CONST. EMPEDRADO CALLE WARA KASA OTB SUMUMPAYA NORTE DIST. C	OTB SUMUMPAYA NORTE	LEONARDO SALAZAR CRUZ	41/113	87.502,36	87.502,36	16		87.502,36	6.125,17	15/11/2016	30/11/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO
22	0003	000	C		CONST TINGLADO CAMPO POLIFUNCIONAL OTB CANADA DIST C	OTB CANADA	EMPRESA E.S.T	41/113	310.047,50	310.047,50	48	325.518,20	325.518,20	22.786,27	18/04/2016	04/06/2016	100,00%	100,00%	SI	SI	CONCLUIDO




INFORME DE AVANCE FISICO DE PROYECTOS DISTRITO D												
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2017												
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS: ARQ. CLAUDIA FABIOLA ORELLANA ALBA												
SUPERVISOR DE OBRAS: ING. JHON R. TAPIA LAZARTE												
NUEVO SUPERVISOR DE OBRA: ING. PAUL ZAMBRANA												
APERTURA PROGRAMÁTICA			PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO PLANILLADO Bs.	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
17	0038	000	CONSTRUCCION C. DE CAP. SOCIAL PROD. OTB 21 DE SEPTIEMBRE DIST D FASE II	OTB 21 DE SEPTIEMBRE	TAKESHI SRL. REP LEGAL: ARQ. OMAR ANGEL OJEDA ARCE	130.000,00	113.880,22	0,00	90%	NO	NO	EN EJECUCION
17	0039	000	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LORONCOCHA OTB COLCAPIRHUA CENTRAL DISTRITO D	OTB CENTRAL DE COLCAPIRHUA	ARQ MARCIAL ROJAS TERCEROS REP LEGAL: ARQ MARCIAL ROJAS TERCEROS	130.000,00	129.214,48	0,00	90%	NO	NO	EN EJECUCION
17	0043	000	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO SAN SILVESTRE DISTRITO D	OTB SAN SILVESTRE	EMP. CONSTRUCTORA KALUYO SRL. REP. LEGAL: ARQ. JOSE LUIS MENA MALDONADO	130.000,00	129.998,85	129.998,85	100%	SI	SI	CONCLUIDO
17	0042	000	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO SAN LORENZO DISTRITO D	OTB SAN LORENZO	EMP. CONSTRUCTORA KALUYO SRL. REP. LEGAL: ARQ. JOSE LUIS MENA MALDONADO	130.000,00	129.996,06	129.996,06	100%	SI	SI	CONCLUIDO
11	0002	000	CONSTRUCCION CANALIZACION OTB PARAIZO DISTRITO D	OTB PARAIZO	EMP. CONST. UNIP. BORIS SAIBA CHAMBI REP. LEGAL: BORIS SAIBA CHAMBI CONDORI	130.000,00	114.112,51	0,00	85%	NO	NO	EN EJECUCION
17	0041	000	CONSTRUCCION PAV. CALLE GARZAS OTB PIÑAMI SUD DIST D	OTB PIÑAMI SUD	ADMINISTRACION DIRECTA	130.000,00	130,00	130.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO

17	0010	000	CONST. PAV. ANDINA OTB COLCAPIRHUA CENTRAL DISTRITO D	OTB CENTRAL DE COLCAPIRHUA	EN PROCESO POA 2017	<b>400,00</b>	400,00	0,00	0%	NO	NO	EN PLANIFICACION
17	0011	000	CONST. PRADO CENTRAL AV B. GALINDO REDUCTO- MERCADO CENTRAL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA	OTB CENTRAL DE COLCAPIRHUA	EN PROCESO POA 2017	<b>400,00</b>	400,00	0,00	0%	NO	NO	EN PLANIFICACION
17	0040	000	CONSTRUCCION PAV. LATERAL COMPLEJO DEPORTIVO SAMANCHA URABI OTB COLCAPIRHUA DIST D	OTB COLCAPIRHUA	EN PROCESO POA 2017	<b>130.000,00</b>	130,00	0,00	0%	NO	NO	EN PLANIFICACION
22	0001	000	CONST. COLISEO MUNICIPAL SAMANCHA URABI COLCAPIRHUA FASE III	OTB COLCAPIRHUA	EN PROCESO POA 2017	<b>500.000,00</b>	500.000,00	0,00	0%	NO	NO	EN PLANIFICACION
22	0006	000	CONST. TINGLADO CANCHA MULTIPLE OTB GENERAL PANDO DIST D	OTB GRAL PANDO	EN PROCESO POA 2017	<b>130,00</b>	130,00	0,00	0%	NO	NO	EN PLANIFICACION
<b>TOTALES</b>						<b>1.410.930</b>	<b>1.118.392</b>	<b>389.995</b>				

N° DE PROYECTOS "DISTRITO D"			<b>11</b>
		PROYECTOS CONCLUIDOS	3
		PROYECTOS EN EJECUCIÓN	3
		PROYECTOS PENDIENTES	5
		<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO</b>	<b>51%</b>
		<b>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO</b>	<b>34,87%</b>

<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO</b>	<b>51,36%</b>
------------------------------------	---------------

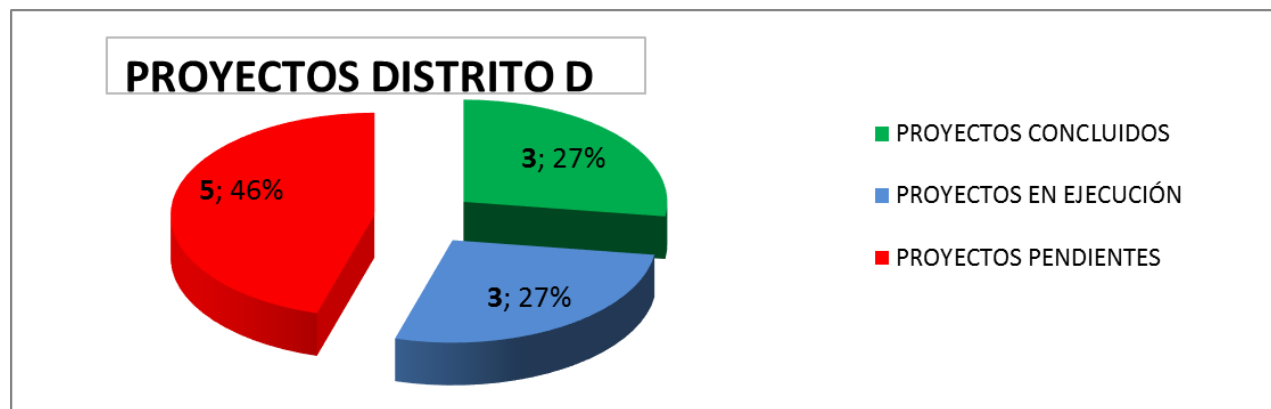

APERTURA PROGRAMÁTICA				DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATADO Bs.	MONTO PLANILLA Bs.	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
PROG	PROY	ACT										
12	0000	000		<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS</b>								
12	0004	000		Const. Sist. Canal de Riego OTB Fabril Capacachi Dist. B		0						
13	0000	000		<b>DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>								
13	0008	000		Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	ROSENDO MOSQUERA A.	220.000	197.111,01	54.250,29	28%			EN EJECUCION
16	0000	000		<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>								
16	0000	003		Mantenimiento Alumbrado Publico OTB Magisterio Dist. B		34.032						
16	0000	004		Mantenimiento Alumbrado Publico OTB Santa Isabel Dist. B		10.000						
16	0004	000	R	Ampliacion Alumbrado Publico OTB Bloques Florida Dist. B		8.000						

17	0000	000		<b>INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL</b>								
17	0003	000		Mejoramiento de la Plaza OTB Santa Isabel Dist. B								ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0004	000		Mejoramiento Area Verde Av. Comercio OTB Santa Rosa Catavi Dist. B								ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0011	000	R	Construcción de Plazuela y Parque Infantil OTB San Alfonso Dis. B								ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0012	000	R	Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B								ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0032	000		Const. Pav. Rígido Av. Julio Romano OTB Holanda Dist. B								ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0053	000		Const. Pav. Rígido Empalme Av. Villarroel OTB Municipal Dist. B	PLASCONST	43.000	43.000,00	43.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0000	000		<b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES</b>								
18	0000	002		Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	VARIOS	220.000						
18	0000	006		Conformacion de Plataformas Municipio de Colcapirhua	VARIOS	1.350.000						
18	0013	000		Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	LIC. MELVI HEREDIA C.	50.000	49.989,06	49.989,06	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0014	000		Const. Pav. Rígido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	CARLOS MORANTE	250.000	231.418,02	224.339,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0015	000		Const. Pav. Rígido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	COPHE CONSTRUCCIONES	220.000	219.544,62	219.544,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0016	000		Const. Empedrado Lado Sud Urb. Abaroa OTB Santa Rosa Central Dist. B		259.918						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0017	000		Const. Pav. Rígido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	ING. NELSON MERCADO V.	305.000	219.808,00	219.808,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
							85.192,00					POR EJECUTAR
18	0018	000		Const. Pav. Rígido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	ELMER C. PADILLA O.	177.000	171.271,92	157.155,05	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0019	000		Const. Pav. Rígido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	174.161,24	163.342,50	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0020	000		Const. Pav. Rígido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	ARQ. KATTY K. PEREZ M.	175.000	99.217,71	99.217,71	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0021	000		Const. Pav. Rígido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	219.689,73	219.684,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000		Const. Pav. Rígido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	265.000	149.925,64	144.482,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					ING. ROY R. LUJAN R.		89.995,10	89.876,95	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0023	000		Const. Pav. Rígido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	ING. FELIPE HERRERA S.	234.280	215.462,92	219.920,87	100%	SI	SI	CONCLUIDO

18	0024	000		Const. Pav. Rigido Av. Sexta y Calle Jorge Barrero OTB Elizabeth Seton Dist. B		220.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0025	000		Const. Pav. Rigido Calle Cercado-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B		0						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0026	000		Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	418.989	300.318,80	327.448,52	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	SIAJSA LTDA	316.000	219.107,07	219.107,07	100%	SI	SI	POR EJECUTAR CONCLUIDO
18	0028	000		Const. Pav. Rigido Calle Los Pinos OTB La Pradera Dist. B		320.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0029	000		Const. Pav. Rigido Calle Paraiso OTB California Dist. B		220.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0030	000		Apertura de Camino OTB San Alfonso Dist. B		0						
18	0031	000		Const. Empedrado Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B		0						
18	0032	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Efec, Cucardas Dist. B	ING. FELIPE HERRERA S.	270.000	49.566,62	49.566,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					ING. FELIPE HERRERA S.		219.278,44	219.278,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0050	000		Const. Pav. Rigido OTB Huanuni Dist. B		109.705						
18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villaruel Colcapirhua Fase I	PLASCONST	6.605.630	2.507.078,45	2.507.078,45	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					K-LUYO & ASOCIADOS		3.948.714,14		22%			EN EJECUCION
18	0064	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	F & Z ING. LORENA ZENTENO	537.555	893.146,25	831.210,80	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	JOSE TERAN	321.408	146.779,22	146.779,22	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					JOSE TERAN		149.913,97	149.913,97	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0066	000	R	Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	JOSE TERAN	60.000	59.680,21	59.680,21	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B		35.000						
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vias OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II		11.609						
18	0072	000	R	Const. Pav. Rigido C/Noel Kemp Mercado OTB Holanda Dist. B Tramo III		0						
18	0073	000	R	Mejoramiento de Vias OTB San alfonso Dist. B		0						
18	0087	000	R	Const. Empedrado OTB Capacachi Central Dist. B		445						
18	0088	000	R	Const. Empalme de Vias Excombatientes y Capitan V. Ustariz OTB Santa Rosa Central Dist. B		15.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Efec Cucardas Dist. B		10.063						

18	0102	000	R	Const. Pav. Rígido C/Noel Kemp Mercado OTB Holanda Dist. B Tramo IV		0						
18	0103	000	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	HILDA MAMANI ARCE	55.000	55.000,00	55.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0104	000		Apertura Camino Vecinal OTB Martin Cardenas Dist. B (Expropiacion)		80.000						
18	0106	000	R	Const. Pav. Rígido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	ARQUIFORMA S.R.L.	101.106	91.452,73	91.452,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0110	000	R	Const. Empedrado de Vias OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B		40.470						
18	0111	000	R	Const. Empedrado OTB Comercio Cochabamba Dist. B		195.000						
18	0116	000		Const. Empalmes C/ Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B		0						
18	0121	000		Const. Pav. Rígido OTB Fabril Capacachi Dist. B	CARLOS SALVATIERRA	215.000	211.999,96	61.336,49	29%			EN EJECUCION
18	0122	000		Const. Pav. Rígido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	HIPOLITO CAMACHO	120.000	118.400,05	111.907,96	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B		230.141						
18	0133	000		Const. Pav. Rígido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B		285.000						
<b>20</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>		<b>SERVICIO DE SALUD</b>								
20	0001	000	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	GAAR INGENIERIA	5.691.439	2.893.386,76	3.162.604,70	100%	SI	SI	CONCLUIDO
<b>22</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>		<b>DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>								
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	METAL OBRAS CONSTRUCCIONES	335.000	254.243,86	254.243,86	100%	SI	SI	CONCLUIDO
							80.756,14					POR EJECUTAR
22	0007	000		Mejoramiento Cancha Multiple OTB Santa Rosa Catavi Dist. B		0						
22	0025	000		Mejoramiento Cancha Polifuncional OTB Fabril Capacachi Dist. B		5.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
22	0030	000		Const. Cancha Polifuncional la Salvadora OTB Capacachi Central Dist. B		140.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
<b>31</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>		<b>PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES</b>								
31	0006	000		Const. Muro de Contencion lado oeste Torrentera Rummy Mayu OTB San alfonso Dist. B		269.540						ARQ. CLAUDIA ORELLANA

APERTURA PROGRAMATICA			PROYECTO	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
13	0008	000	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	28%			EN EJECUCION
17	0053	000	Const. Pav. Rigido Empalme Av. Villarroel OTB Municipal Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0000	002	Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	65%			EN EJECUCION
18	0013	000	Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0014	000	Const. Pav. Rigido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0015	000	Const. Pav. Rigido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0017	000	Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0017	000	Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0018	000	Const. Pav. Rigido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0019	000	Const. Pav. Rigido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0020	000	Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0021	000	Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Araya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Araya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0023	000	Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0026	000	Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0026	000	Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0027	000	Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0027	000	Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0032	000	Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Efec, Cucardas Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0032	000	Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Efec, Cucardas Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0062	000	R Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0062	000	R Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	35%			EN EJECUCION
18	0064	000	R Const. Pav. Rigido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0066	000	R Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	100%	SI	SI	CONCLUIDO

18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vías OTB Barrio Holanda Dist. B	0%				PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vías OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	0%				PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vías OTB Efec Cucardas Dist. B	0%				PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0103	000	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	100%	SI	SI		CONCLUIDO
18	0106	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	100%	SI	SI		CONCLUIDO
18	0110	000	R	Const. Empedrado de Vías OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B	100%	SI	SI		CONCLUIDO
18	0121	000		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	29%				EN EJECUCION
18	0122	000		Const. Pav. Rigido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	100%	SI	SI		CONCLUIDO
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	0%				PARA EJECUCION
18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	0%				PARA EJECUCION
20	0001	000	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	100%	SI	SI		CONCLUIDO
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	100%	SI	SI		CONCLUIDO
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	0%				PENDIENTE P/ REPROGRAMAR

INFORME DE AVANCE FISICO PROYECTOS DISTRITO B												
AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015												
Director de Obras Publicas: Ing. Carlo G. Mercado Rocabado												
Supervisor Dist. B: Ing. Wilson Jobany Bustamante A.												
APERTURA PROGRAMATICA	PROYECTO			UBICACIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO PLANILLADO Bs.	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVINCIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
130000	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B			OTB SANTA ROSA CATAVI	ROSENDO MOSQUERA A.	220.000	197.111,01	54.250,29	28%			EN EJECUCION
170000	Const. Pav. Rigido Empalme Av. Villarroel OTB Municipal Dist. B			OTB MUNICIPAL	PLASCONST	43.000	43.000,00	43.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
180002	Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B			DISTRITO B	VARIOS	220.000			65%			EN EJECUCION



18	0013	000	Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	OTB CAPACACHI CENTRAL	LIC. MELVI HEREDIA C.	50.000	49.989,06	49.989,06	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0014	000	Const. Pav. Rigido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	OTB MOROCOCAL A	CARLOS MORANTE	250.000	231.418,02	224.339,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0015	000	Const. Pav. Rigido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	OTB SAUSALITO	COPHE CONSTRUCCIONES	220.000	219.544,62	219.544,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0017	000	Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	OTB BARTOS	ING. NELSON MERCADO V.	305.000	219.808,00	219.808,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
				OTB BARTOS			85.192,00		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0018	000	Const. Pav. Rigido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	OTB MUNICIPAL	ELMER C. PADILLA O.	177.000	171.271,92	157.155,05	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0019	000	Const. Pav. Rigido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	OTB MAGISTERIO	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	174.161,24	163.342,50	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0020	000	Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	OTB SANTA ISABEL	ARQ. KATTY K. PEREZ M.	175.000	99.217,71	99.217,71	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0021	000	Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	OTB OASYS	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	219.689,73	219.684,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	OTB NUEVA JERUSALEN	ING. ROY R. LUJAN R.	265.000	149.925,64	144.482,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
				OTB NUEVA JERUSALEN	ING. ROY R. LUJAN R.		89.995,10	89.876,95	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0023	000	Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	OTB HOLANDA	ING. FELIPE HERRERA S.	234.280	215.462,92	219.920,87	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0026	000	Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	OTB FLORIDA NORTE	ING. ROY R. LUJAN R.	418.989	300.318,80	327.448,52	100%	SI	SI	CONCLUIDO
				OTB FLORIDA NORTE			118.670,20		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0027	000	Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	OTB FLORIDA SUD	SIAJSA LTDA	316.000	219.107,07	219.107,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
				OTB FLORIDA SUD			96.892,93		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0032		Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Elfec, Cucardas Dist. B	OTB ELFEC CUCARDAS	ING. FELIPE HERRERA S.	270.000	49.566,62	49.566,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO

		0 0 0			OTB ELFEC CUCARDAS	ING. FELIPE HERRERA S.		219.278,44	219.278,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	DISTRITO B	PLASCONST	6.605.630	2.507.078,45	2.507.078,45	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					DISTRITO B	K-LUYO & ASOCIADOS		3.948.714,14		35%			EN EJECUCION
18	0064	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	DISTRITO B	F & Z ING. LORENA ZENTENO	537.555	893.146,25	831.210,80	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	OTB OASYS	JOSE TERAN	321.408	146.779,22	146.779,22	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB OASYS	JOSE TERAN		149.913,97	149.913,97	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0066	000	R	Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	OTB LA PRADERA	JOSE TERAN	60.000	59.680,21	59.680,21	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B	OTB HOLANDA		35.000			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vias OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	OTB SANTA ROSA CENTRAL		11.609			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Efec Cucardas Dist. B	OTB ELFEC CUCARDAS		10.063			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0103	000	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	OTB CAPACACHI CENTRAL	HILDA MAMANI ARCE	55.000	55.000,00	55.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0106	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	OTB ELIZABETH SETON	ARQUIFORMA S.R.L.	101.106	91.452,73	91.452,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0110	000	R	Const. Empedrado de Vias OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B	OTB MARTIN CARDENAS	EUSEBIO ANZALDO	40.470	99.950,00	99.950,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0121	000		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	OTB FABRIL CAPACACHI	CARLOS SALVATIERRA	215.000	211.999,96	61.336,49	29%			EN EJECUCION
18	0122	000		Const. Pav. Rigido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	OTB SAUSALITO	HIPOLITO CAMACHO	120.000	118.400,05	111.907,96	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	OTB URBANIZACION LA PAZ		230.141			0%			PARA EJECUCION

18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	OTB COMERCION COCHABAMABA		285.000			0%			PARA EJECUCION
20	0001	000	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	OTB CAPACACHI CENTRAL	GAAR INGENIERIA	5.691.439	2.893.386,76	3.162.604,70	100%	SI	SI	CONCLUIDO
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	OTB MARTIN CARDENAS	METAL OBRAS CONSTRUCCIONES	335.000	254.243,86	254.243,86	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB MARTIN CARDENAS			80.756,14		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
<b>TOTALES</b>							<b>18.258.690</b>	<b>14.680.123</b>	<b>10.251.170</b>				

<b>INFORME DE AVANCE FISICO PROYECTOS DISTRITO B</b>													
<b>AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015</b>													
<b>Director de Obras Publicas: Ing. Carlo G. Mercado Rocabado</b>													
<b>Supervisor Dist. B: Ing. Wilson Jobany Bustamante A.</b>													
<b>APERTURA PROGRAMATICA</b>		<b>PROYECTO</b>		<b>UBICACIÓN</b>	<b>CONTRATISTA</b>	<b>MONTO ASIGNADO Bs.</b>	<b>MONTO CONTRATO Bs.</b>	<b>MONTO PLANILLADO Bs.</b>	<b>AVANCE FISICO %</b>	<b>ACTAS DE RECEPCION PROVINCIONAL</b>	<b>ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
13	0008	000		Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	OTB SANTA ROSA CATAVI	ROSENDO MOSQUERA A.	220.000	197.111,01	54.250,29	28%			EN EJECUCION
17	0053	000		Const. Pav. Rigido Empalme Av. Villarroel OTB Municipal Dist. B	OTB MUNICIPAL	PLASCONST	43.000	43.000,00	43.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0000	002		Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	DISTRITO B	VARIOS	220.000			65%			EN EJECUCION
18	0013	000		Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	OTB CAPACACHI CENTRAL	LIC. MELVI HEREDIA C.	50.000	49.989,06	49.989,06	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0014	000		Const. Pav. Rigido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	OTB MOROCOCAL A	CARLOS MORANTE	250.000	231.418,02	224.339,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0015	000		Const. Pav. Rigido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	OTB SAUSALITO	COPHE CONSTRUCCIONES	220.000	219.544,62	219.544,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO


18	0017	000		Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	OTB BARTOS	ING. NELSON MERCADO V.	305.000	219.808,00	219.808,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB BARTOS			85.192,00		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0018	000		Const. Pav. Rigido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	OTB MUNICIPAL	ELMER C. PADILLA O.	177.000	171.271,92	157.155,05	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0019	000		Const. Pav. Rigido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	OTB MAGISTERIO	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	174.161,24	163.342,50	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0020	000		Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	OTB SANTA ISABEL	ARQ. KATTY K. PEREZ M.	175.000	99.217,71	99.217,71	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0021	000		Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	OTB OASYS	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	219.689,73	219.684,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000		Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	OTB NUEVA JERUSALEN	ING. ROY R. LUJAN R.	265.000	149.925,64	144.482,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB NUEVA JERUSALEN	ING. ROY R. LUJAN R.		89.995,10	89.876,95	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0023	000		Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	OTB HOLANDA	ING. FELIPE HERRERA S.	234.280	215.462,92	219.920,87	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0026	000		Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	OTB FLORIDA NORTE	ING. ROY R. LUJAN R.	418.989	300.318,80	327.448,52	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB FLORIDA NORTE			118.670,20		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	OTB FLORIDA SUD	SIAJSA LTDA	316.000	219.107,07	219.107,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB FLORIDA SUD			96.892,93		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0032	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Elfec, Cucardas Dist. B	OTB ELFEC CUCARDAS	ING. FELIPE HERRERA S.	270.000	49.566,62	49.566,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB ELFEC CUCARDAS	ING. FELIPE HERRERA S.		219.278,44	219.278,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	DISTRITO B	PLASCONST	6.605.630	2.507.078,45	2.507.078,45	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					DISTRITO B	K-LUYO & ASOCIADOS		3.948.714,14		35%			EN EJECUCION

18	0064	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	DISTRITO B	F & Z ING. LORENA ZENTENO	537.555	893.146,25	831.210,80	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	OTB OASYS	JOSE TERAN	321.408	146.779,22	146.779,22	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB OASYS	JOSE TERAN		149.913,97	149.913,97	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0066	000	R	Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	OTB LA PRADERA	JOSE TERAN	60.000	59.680,21	59.680,21	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B	OTB HOLANDA		35.000			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vias OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	OTB SANTA ROSA CENTRAL		11.609			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Elfec Cucardas Dist. B	OTB ELFEC CUCARDAS		10.063			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0103	000	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	OTB CAPACACHI CENTRAL	HILDA MAMANI ARCE	55.000	55.000,00	55.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0106	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	OTB ELIZABETH SETON	ARQUIFORMA S.R.L.	101.106	91.452,73	91.452,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0110	000	R	Const. Empedrado de Vias OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B	OTB MARTIN CARDENAS	EUSEBIO ANZALDO	40.470	99.950,00	99.950,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0121	000		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	OTB FABRIL CAPACACHI	CARLOS SALVATIERRA	215.000	211.999,96	61.336,49	29%			EN EJECUCION
18	0122	000		Const. Pav. Rigido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	OTB SAUSALITO	HIPOLITO CAMACHO	120.000	118.400,05	111.907,96	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	OTB URBANIZACION LA PAZ		230.141			0%			PARA EJECUCION
18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	OTB COMERCION COCHABAMABA		285.000			0%			PARA EJECUCION
20	0001	000	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	OTB CAPACACHI CENTRAL	GAAR INGENIERIA	5.691.439	2.893.386,76	3.162.604,70	100%	SI	SI	CONCLUIDO
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	OTB MARTIN CARDENAS	METAL OBRAS CONSTRUCCIONES	335.000	254.243,86	254.243,86	100%	SI	SI	CONCLUIDO

					OTB MARTIN CARDENAS			80.756,1 4		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR	
<b>TOTALES</b>									18.258.69 0	14.680.1 23	10.251.1 70			

N° PROYECTOS DISTRITO B	40
PROYECTOS CONCLUIDOS	27
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	6
PROYECTOS PENDIENTES PARA REPROGRAMACION	7
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO</b>	<b>71,41</b>

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	71,41
-----------------------------	-------

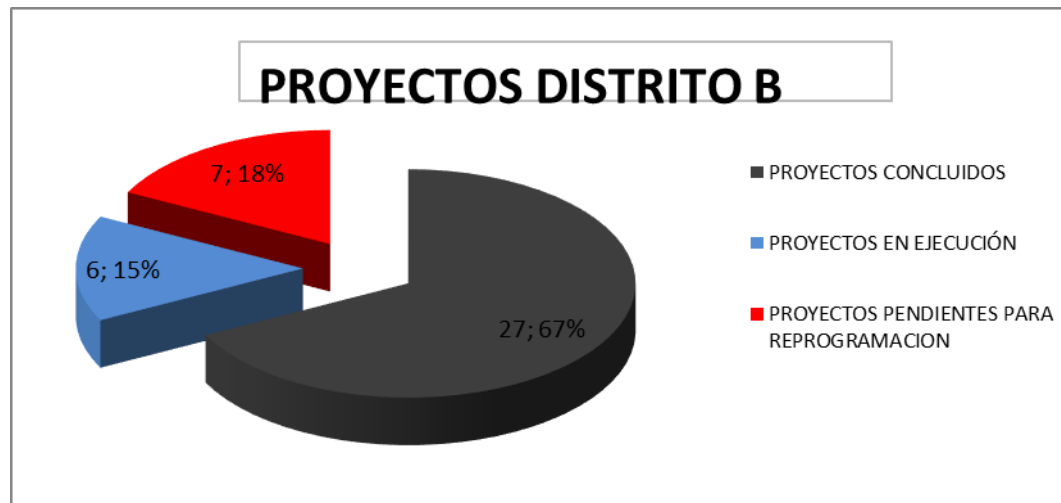

NOTA: LOS DE COLOR ROJO SON LOS PROYECTOS PARA REPROGRAMAR EL 2016

APERTURA PROGRAMATICA			PROYECTO	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO P/SER REPROGRAMADO Bs.	OBSERVACIONES	
13	0008	000		Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	220.000,00	165.749,71	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0017	000		Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	305.000,00	85.192,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0026	000		Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	418.989,00	118.670,20	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	316.000,00	96.892,93	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	6.605.630,00	3.098.476,90	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B	35.000,00	35.000,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vias OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	11.609,00	11.609,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Efec Cucardas Dist. B	10.063,00	10.063,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0121	000		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	215.000,00	153.663,51	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	230.141,00	230.141,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	285.000,00	285.000,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	335.000,00	80.756,14	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
							PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0000	002		Mtto y Mejoramiento av. 16 de Julio Distrito B		42.024,31	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0000	006		Conformacion de Plataforma Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B		20.942,80	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
<b>TOTALES</b>					<b>8.987.432,00</b>	<b>4.371.214,39</b>	

1	000	00	B		Const.Pozo de Agua Potable OTB Santa Rosa Central Dist. B	140.000
1	8	0				
1	001	00	B		Mej. Agua Potable C/ Sist. Tratamiento OTB Comercio Cbba. Santa Rosa Sud Dist. B	200.000
1	5	0				
1	002	00	B	R	Mej. Sistema de Agua Potable OTB Nueva Jerusalem Dist. B	45.000
1	1	0				
1	003	00	B	R	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	165.750
1	6	0				

1	004	00	B	R	Const. Perforacion de Pozo de Agua Potable OTB Huanuni Dist. B	140.000
1	000	00	B	R	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	0
1	000	00	B	R	Const. Muro de Contencion lado oeste Torrentera Rummy Mayu OTB San alfonso Dist. B	69.540
1	000	00	B		Mantenimiento y Compra de Luminarias distrito B	80.000
1	000	00	B	R	Ampliacion Alumbrado Publico OTB Bloques Florida Dist, B	8.000
1	000	00	B		Mejoramiento Plaza Retamoso OTB Holanda Dist. B	100.000
1	000	00	B	R	Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B	100.000
1	000	00	B		Const. Plaza Principal OTB Floridad Sud Dist. B	140.000
1	000	00	B	R	Construcción de Plazuela y Parque Infantil OTB San Alfonso Dis. B	256.524
1	000	00	B	R	Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B	111.550
1	001	00	B	R	Const. Empedrado Lado Sud Urb. Abaroa OTB Santa Rosa Central Dist. B	259.918
1	001	00	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	75.782
1	001	00	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	14.359
1	001	00	B	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta y Calle Jorge Barrero OTB Elizabeth Seton Dist. B	238.000
1	001	00	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	89.540
1	001	00	B	R	Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	96.896
1	001	00	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Los Pinos OTB La Pradera Dist. B	150.527
1	002	00	B	R	Const. Pav. Rigido OTB Huanuni Dist. B	4.664
1	002	00	B	R	Const. Empalme de Vias Excombatientes y Capitan V. Ustariz OTB Santa Rosa Central Dist. B	15.000
1	002	00	B	R	Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	153.663
1	002	00	B	R	Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	300.141
1	002	00	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	285.000
1	004	00	B	R	Mejoramiento de la Plaza OTB Santa Isabel Dist. B	115.603
1	004	00	B	R	Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	85.192




17	00450	000	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Modesto Omiste OTB Municipal Dist. B	89.700
17	00460	000	B	R	Const. Pav. Rigido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	56.657
17	00480	000	B	R	Apertura Camino Vecinal OTB Martin Cardenas Dist. B (Expropiacion)	80.000
18	0000	002	B		Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	260.000
18	0002	000	B		Construccion Av. Dorbigni Dist. B,C,D	1.800.000
18	0006	000	B		Const. Pav. Flexible Av. Tomas Oconor Dist.B,C	500.000
18	0015	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Paraiso OTB California Dist. B	420.000
18	0016	000	B		Const. Pav. Rigido Calles Joaquin Sarcedo-Jose Ayala -Eduardo Saracho OTB Elizabeth Seton Dist. B	200.000
18	0017	000	B		Const. Pavimento Calle 18 y 1ro. de Mayo- OTB Fabril Capacachi Dist. B	200.000
18	0018	000	B		Const. Empedrado de Vias OTB Martin Cardenas Dist. B	200.000
18	0019	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	200.000
18	0020	000	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	230.640
18	0021	000	B		Const. Pav. Av. Comercio OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	200.000
18	0022	000	B		Const. Pav. Rigido OTB Cucardas Dist. B	200.000
18	0023	000	B		Const. Pav. Calle F Caja de la Vega OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	200.000
18	0024	000	B		Const. Pav. Lado Norte Av. B. Galindo Sector Dimacos-Farmacorp OTB Santa Isabel Dist. B	200.000
18	0025	000	B		Const. Pav. Pasaje Modesto Omiste OTBs Magisterio Coña Coña-Municipal Coña Coña Dist. B	200.000
18	0028	000	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	0
18	0044	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Paraiso OTB California Dist. B	0
22	0004	000	B		Const. Graderias Cancha Multifuncional OTB Huanuni Dist. B	120.000
22	0006	000	B	R	Const. Cancha Polifuncional la Salvadora OTB Capacachi Central Dist. B	140.000
22	0010	000	B	R	Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	80.756
31	0001	000	B		Const. Muro de Contencion Torrentera Rummy Mayu Lado Oeste OTB San alfonso Dist. B	469.540

INFORME DE AVANCE FISICO PROYECTOS DISTRITO E													
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2017													
Director de Obras Publicas: Arq. Claudia F. Orellana Alba													
Supervisor Dist. : Ing. Gaston A. Diaz Gomez													
APERTURA PROGRAMATICA	PROYECTO	UBICACION	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO PLANILLADO Bs.	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES			
13	00 02	000		Const. Revestimiento Rio Pampa Mayu Dist. E Fase IV	DIST. E	CARLOS HUARACHI	500.000	464.900,33	0,00	10%	NO	NO	EN EJECUCION
17	00 12	000		Const. Pav. Rigido Av.Calle Jazmin OTB Esquilan Grande Dist.E	OTB ESQUILAN GRANDE	ADM. DIRECTA	700.000		0,00	10%	NO	NO	EN EJECUCION AMPLIACION DE ALCANTARILLADO
17	00 44	000		Const. Pav. De Vias OTB Esquilan Chijllawiri Dist.E	OTB ESQUILAN CHIJLLAWIRI		150.000		0,00	0%	NO	NO	PLANIFICACION
17	00 45	000		Const. Pav. Av. Angulo OTB Sumumpaya Chico Dist.E	OTB SUMUMPAYA A CHICO	NELSON MERCADO	150.000	135.000,00	0,00	40%	NO	NO	EN EJECUCION
17	00 46	000		Const. Puente Vehicular OTB Sumumpaya Kullcu Dist.E	OTB SUMUMPAYA A KULLCU		150.000		0,00	0%	NO	NO	PLANIFICACION
17	00 47	000		Const. Pav.Calle Violetas OTB Junta Vecinal Calamina Dist.E	OTB JUNTA VECINAL CALAMINA	ADM. DIRECTA	100.000		0,00	0%	NO	NO	PLANIFICACION
17	00 48	002		Const. Empedrado de Vias OTB Kenamari Kullcu Dist.E	OTB KENAMARI KULLCU	FRANCISCO MELCHOR	150.000	138.510,50	0,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00 00	005		Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito E	DISTRITO E	VARIOS	200.000	183.143,43	183.143,43	92%	NO	NO	EN EJECUCION
22	00 07	000	R	Const. Tinglado Cancha Multiple OTB Sindicato Agrario Dist.E	OTB SIND. AGRARIO ESQUILAN GRANDE		150.000		0,00	0%	NO	NO	PLANIFICACION
<b>TOTALES</b>							<b>2.250.000</b>	<b>921.554,26</b>	<b>183.143,43</b>				

N° PROYECTOS DISTRITO E	9
PROYECTOS CONCLUIDOS	1
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	4
PROYECTOS PENDIENTES	4
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO</b>	<b>28,00%</b>
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO</b>	<b>8%</b>

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	0,28
-----------------------------	------

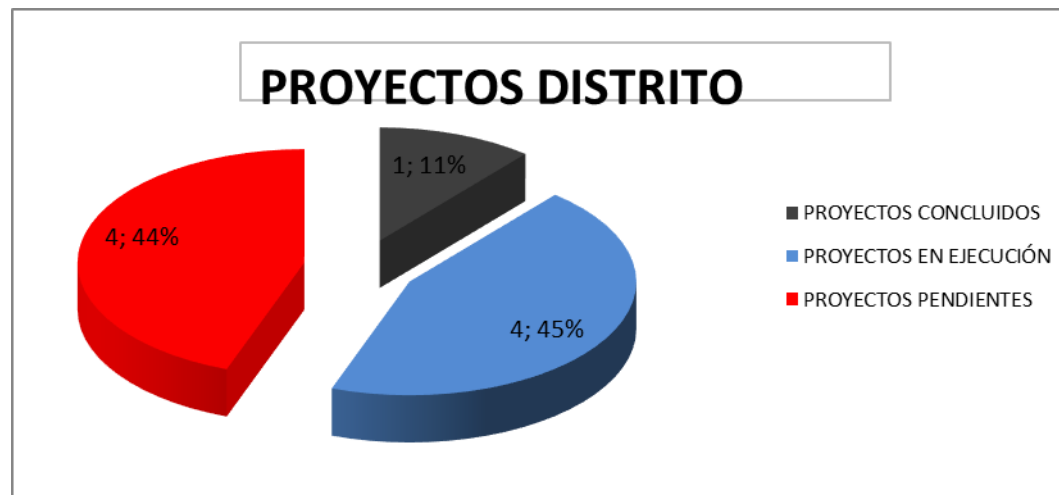

APERTURA PROGRAMÁTICA			DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATADO Bs.	MONTO PLANILLADO Bs.	AVANCE FÍSICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVICIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
PROG	PROY	ACT									
12	0000	000	<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS</b>								
12	0004	000	Const. Sist. Canal de Riego OTB Fabril Capacachi Dist. B		0						
13	0000	000	<b>DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>								
13	0008	000	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	ROSENDO MOSQUERA A.	220.000	197.111,01	54.250,29	28%			EN EJECUCION
16	0000	000	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>								
16	0000	003	Mantenimiento Alumbrado Publico OTB Magisterio Dist. B		34.032						
16	0000	004	Mantenimiento Alumbrado Publico OTB Santa Isabel Dist. B		10.000						
16	0004	000	R Ampliacion Alumbrado Publico OTB Bloques Florida Dist, B		8.000						
17	0000	000	<b>INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL</b>								
17	0003	000	Mejoramiento de la Plaza OTB Santa Isabel Dist. B		220.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0004	000	Mejoramiento Area Verde Av. Comercio OTB Santa Rosa Catavi Dist. B		0						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0011	000	R Construcción de Plazuela y Parque Infantil OTB San Alfonso Dis. B		186.524						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0012	000	R Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B		179.843						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0032	000	Const. Pav. Rígido Av. Julio Romano OTB Holanda Dist. B		90.390						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	0053	000	Const. Pav. Rigido Empalme Av. Villarroel OTB Municipal Dist. B	PLASCONST	43.000	43.000,00	43.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0000	000	<b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES</b>								
18	0000	002	Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	VARIOS	220.000						
18	0000	006	Conformacion de Plataformas Municipio de Colcapirhua	VARIOS	1.350.000						
18	0013	000	Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	LIC. MELVI HEREDIA C.	50.000	49.989,06	49.989,06	100%	SI	SI	CONCLUIDO

18	0014	000	Const. Pav. Rígido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	CARLOS MORANTE	250.000	231.418,02	224.339,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0015	000	Const. Pav. Rígido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	COPHE CONSTRUCCIONES	220.000	219.544,62	219.544,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0016	000	Const. Empedrado Lado Sud Urb. Abaroa OTB Santa Rosa Central Dist. B		259.918						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0017	000	Const. Pav. Rígido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	ING. NELSON MERCADO V.	305.000	219.808,00	219.808,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
						85.192,00					POR EJECUTAR
18	0018	000	Const. Pav. Rígido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	ELMER C. PADILLA O.	177.000	171.271,92	157.155,05	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0019	000	Const. Pav. Rígido Av. D'orbigni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	174.161,24	163.342,50	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0020	000	Const. Pav. Rígido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	ARQ. KATTY K. PEREZ M.	175.000	99.217,71	99.217,71	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0021	000	Const. Pav. Rígido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	219.689,73	219.684,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000	Const. Pav. Rígido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	265.000	149.925,64	144.482,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
				ING. ROY R. LUJAN R.		89.995,10	89.876,95	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0023	000	Const. Pav. Rígido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	ING. FELIPE HERRERA S.	234.280	215.462,92	219.920,87	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0024	000	Const. Pav. Rígido Av. Sexta y Calle Jorge Barrero OTB Elizabeth Seton Dist. B		220.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0025	000	Const. Pav. Rígido Calle Cercado-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B		0						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0026	000	Const. Pav. Rígido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	418.989	300.318,80	327.448,52	100%	SI	SI	CONCLUIDO
											POR EJECUTAR
18	0027	000	Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	SIAJSA LTDA	316.000	219.107,07	219.107,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0028	000	Const. Pav. Rígido Calle Los Pinos OTB La Pradera Dist. B		320.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0029	000	Const. Pav. Rígido Calle Paraiso OTB California Dist. B		220.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0030	000	Apertura de Camino OTB San Alfonso Dist. B		0						
18	0031	000	Const. Empedrado Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B		0						
18	0032	000	Const. Pav. Rígido Calle Arani OTB Urbanizacion Elfec, Cucardas Dist. B	ING. FELIPE HERRERA S.	270.000	49.566,62	49.566,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
				ING. FELIPE HERRERA S.		219.278,44	219.278,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0050	000	Const. Pav. Rígido OTB Huanuni Dist. B		109.705						

18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villaruel Colcapirhua Fase I	PLASCONST	6.605.630	2.507.078,45	2.507.078,45	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					K-LUYO & ASOCIADOS			3.948.714,14		22%		
18	0064	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	F & Z ING. LORENA ZENTENO	537.555	893.146,25	831.210,80	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	JOSE TERAN	321.408	146.779,22	146.779,22	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					JOSE TERAN			149.913,97	149.913,97	100%	SI	SI
18	0066	000	R	Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	JOSE TERAN	60.000	59.680,21	59.680,21	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B		35.000						
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vias OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II		11.609						
18	0072	000	R	Const. Pav. Rigido C/Noel Kemp Mercado OTB Holanda Dist. B Tramo III		0						
18	0073	000	R	Mejoramiento de Vias OTB San alfonso Dist. B		0						
18	0087	000	R	Const. Empedrado OTB Capacachi Central Dist. B		445						
18	0088	000	R	Const. Empalme de Vias Excombatientes y Capitan V. Ustariz OTB Santa Rosa Central Dist. B		15.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Efec Cucardas Dist. B		10.063						
18	0102	000	R	Const. Pav. Rigido C/Noel Kemp Mercado OTB Holanda Dist. B Tramo IV		0						
18	0103	000	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	HILDA MAMANI ARCE	55.000	55.000,00	55.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0104	000		Apertura Camino Vecinal OTB Martin Cardenas Dist. B (Expropiacion)		80.000						
18	0106	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	ARQUIFORMA S.R.L.	101.106	91.452,73	91.452,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0110	000	R	Const. Empedrado de Vias OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B		40.470						
18	0111	000	R	Const. Empedrado OTB Comercio Cochabamba Dist. B		195.000						
18	0116	000		Const. Empalmes C/ Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B		0						
18	0121	000		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	CARLOS SALVATIERRA	215.000	211.999,96	61.336,49	29%			EN EJECUCION
18	0122	000		Const. Pav. Rigido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	HIPOLITO CAMACHO	120.000	118.400,05	111.907,96	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B		230.141						
18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B		285.000						

<b>20</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>		<b>SERVICIO DE SALUD</b>								
20	0001	000	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	GAAR INGENIERIA	5.691.439	2.893.386,76	3.162.604,70	100%	SI	SI	CONCLUIDO
<b>22</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>		<b>DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>								
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	METAL OBRAS CONSTRUCCIONES	335.000	254.243,86	254.243,86	100%	SI	SI	CONCLUIDO
							80.756,14					POR EJECUTAR
22	0007	000		Mejoramiento Cancha Multiple OTB Santa Rosa Catavi Dist. B		0						
22	0025	000		Mejoramiento Cancha Polifuncional OTB Fabril Capacachi Dist. B		5.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
22	0030	000		Const. Cancha Polifuncional la Salvadora OTB Capacachi Central Dist. B		140.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
<b>31</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>		<b>PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES</b>								
31	0006	000		Const. Muro de Contencion lado oeste Torrentera Rummy Mayu OTB San alfonso Dist. B		269.540						ARQ. CLAUDIA ORELLANA

INFORME DE AVANCE FISICO PROYECTOS DISTRITO B												
AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015												
Director de Obras Publicas: Ing. Carlo G. Mercado Rocabado												
Supervisor Dist. B: Ing. Wilson Jobany Bustamante A.												
APERTURA PROGRAMATICA	PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO PLANILLADO Bs.	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES		
13	0008	000		Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB	OTB SANTA ROSA CATAVI	ROSENDO MOSQUERA A.	220.000	197.111,01	54.250,29	28%		EN EJECUCION

				Santa Rosa Catavi Dist. B									
17	0053	000		Const. Pav. Rigido Empalme Av. Villarroel OTB Municipal Dist. B	OTB MUNICIPAL	PLASCONST	<b>43.000</b>	43.000,00	43.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0000	002		Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	DISTRITO B	VARIOS	<b>220.000</b>			65%			EN EJECUCION
18	0013	000		Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	OTB CAPACACHI CENTRAL	LIC. MELVI HEREDIA C.	<b>50.000</b>	49.989,06	49.989,06	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0014	000		Const. Pav. Rigido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	OTB MOROCOCALA	CARLOS MORANTE	<b>250.000</b>	231.418,02	224.339,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0015	000		Const. Pav. Rigido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	OTB SAUSALITO	COPHE CONSTRUCCIONE S	<b>220.000</b>	219.544,62	219.544,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0017	000		Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	OTB BARTOS	ING. NELSON MERCADO V.	<b>305.000</b>	219.808,00	219.808,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB BARTOS			85.192,00		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0018	000		Const. Pav. Rigido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	OTB MUNICIPAL	ELMER C. PADILLA O.	<b>177.000</b>	171.271,92	157.155,05	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0019	000		Const. Pav. Rigido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	OTB MAGISTERIO	ING. ROY R. LUJAN R.	<b>220.000</b>	174.161,24	163.342,50	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0020	000		Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	OTB SANTA ISABEL	ARQ. KATTY K. PEREZ M.	<b>175.000</b>	99.217,71	99.217,71	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0021	000		Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	OTB OASYS	ING. ROY R. LUJAN R.	<b>220.000</b>	219.689,73	219.684,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000		Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalen Dist. B	OTB NUEVA JERUSALEN	ING. ROY R. LUJAN R.	<b>265.000</b>	149.925,64	144.482,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB NUEVA JERUSALEN			ING. ROY R. LUJAN R.	89.995,10	89.876,95	100%	SI	SI
18	0023	000		Const. Pav. Rigido Calle Feliz del	OTB HOLANDA	ING. FELIPE HERRERA S.	<b>234.280</b>	215.462,92	219.920,87	100%	SI	SI	CONCLUIDO




				Granado OTB Holanda Dist. B									
18	0026	000		Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	OTB FLORIDA NORTE	ING. ROY R. LUJAN R.	<b>418.989</b>	300.318,80	327.448,52	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB FLORIDA NORTE			118.670,20		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	OTB FLORIDA SUD	SIAJSA LTDA	<b>316.000</b>	219.107,07	219.107,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB FLORIDA SUD			96.892,93		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0032	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Efec, Cucardas Dist. B	OTB ELFEC CUCARDAS	ING. FELIPE HERRERA S.	<b>270.000</b>	49.566,62	49.566,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB ELFEC CUCARDAS	ING. FELIPE HERRERA S.		219.278,44	219.278,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	DISTRITO B	PLASCONST	<b>6.605.630</b>	2.507.078,4 5	2.507.078,45	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					DISTRITO B	K-LUYO & ASOCIADOS		3.948.714,1 4		35%			EN EJECUCION
18	0064	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	DISTRITO B	F & Z ING. LORENA ZENTENO	<b>537.555</b>	893.146,25	831.210,80	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	OTB OASYS	JOSE TERAN	<b>321.408</b>	146.779,22	146.779,22	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB OASYS	JOSE TERAN		149.913,97	149.913,97	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0066	000	R	Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	OTB LA PRADERA	JOSE TERAN	<b>60.000</b>	59.680,21	59.680,21	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B	OTB HOLANDA		<b>35.000</b>			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vias OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	OTB SANTA ROSA CENTRAL		<b>11.609</b>			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Efec Cucardas Dist. B	OTB ELFEC CUCARDAS		<b>10.063</b>			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR

18	0103	000	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	OTB CAPACACHI CENTRAL	HILDA MAMANI ARCE	55.000	55.000,00	55.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0106	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	OTB ELIZABETH SETON	ARQUIFORMA S.R.L.	101.106	91.452,73	91.452,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0110	000	R	Const. Empedrado de Vias OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B	OTB MARTIN CARDENAS	EUSEBIO ANZALDO	40.470	99.950,00	99.950,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0121	000		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	OTB FABRIL CAPACACHI	CARLOS SALVATIERRA	215.000	211.999,96	61.336,49	29%			EN EJECUCION
18	0122	000		Const. Pav. Rigido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	OTB SAUSALITO	HIPOLITO CAMACHO	120.000	118.400,05	111.907,96	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	OTB URBANIZACION LA PAZ		230.141			0%			PARA EJECUCION
18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	OTB COMERCIO COCHABAMABA		285.000			0%			PARA EJECUCION
20	0001	000	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	OTB CAPACACHI CENTRAL	GAAR INGENIERIA	5.691.439	2.893.386,76	3.162.604,70	100%	SI	SI	CONCLUIDO
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	OTB MARTIN CARDENAS	METAL OBRAS CONSTRUCCIONES	335.000	254.243,86	254.243,86	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB MARTIN CARDENAS				80.756,14		0%		
<b>TOTALES</b>							<b>18.258.690</b>	<b>14.680.123</b>	<b>10.251.170</b>				

N° PROYECTOS DISTRITO B	40
PROYECTOS CONCLUIDOS	27
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	6
PROYECTOS PENDIENTES PARA REPROGRAMACION	7
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO</b>	<b>71,41</b>

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	71,41
-----------------------------	-------

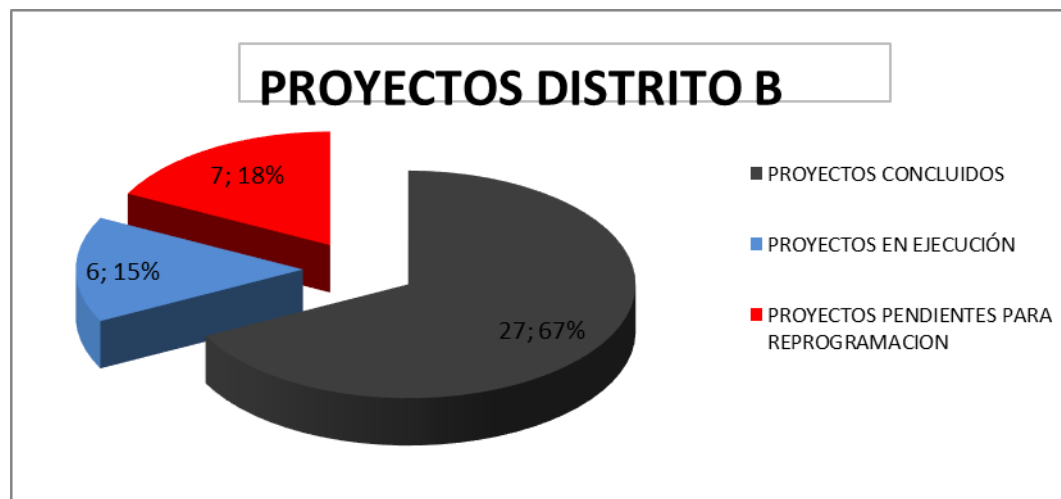

APERTURA PROGRAMATICA				PROYECTO	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO P/SER REPROGRAMADO Bs.	OBSERVACIONES
13	0008	000		Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	220.000,00	165.749,71	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0017	000		Const. Pav. Rígido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	305.000,00	85.192,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0026	000		Const. Pav. Rígido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	418.989,00	118.670,20	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	316.000,00	96.892,93	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0062	000	R	Const. Pav. Rígido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	6.605.630,00	3.098.476,90	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rígido de Vías OTB Barrio Holanda Dist. B	35.000,00	35.000,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vías OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	11.609,00	11.609,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0101	000		Const. Pav. Rígido de Vías OTB Efec Cucardas Dist. B	10.063,00	10.063,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0121	000		Const. Pav. Rígido OTB Fabril Capacachi Dist. B	215.000,00	153.663,51	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR

18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	<b>230.141,00</b>	230.141,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	<b>285.000,00</b>	285.000,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	<b>335.000,00</b>	80.756,14	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
							PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0000	002		Mtto y Mejoramiento av. 16 de Julio Distrito B		42.024,31	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0000	006		Conformacion de Plataforma Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B		20.942,80	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
<b>TOTALES</b>					<b>8.987.432,00</b>	<b>4.371.214,39</b>	

1	000	00	B		Const. Pozo de Agua Potable OTB Santa Rosa Central Dist. B	<b>140.000</b>
1	8	0				
1	001	00	B		Mej. Agua Potable C/ Sist. Tratamiento OTB Comercio Cbba. Santa Rosa Sud Dist. B	<b>200.000</b>
1	5	0				
1	002	00	B	R	Mej. Sistema de Agua Potable OTB Nueva Jerusalem Dist. B	<b>45.000</b>
1	1	0				
1	003	00	B	R	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	<b>165.750</b>
1	6	0				
1	004	00	B	R	Const. Perforacion de Pozo de Agua Potable OTB Huanuni Dist. B	<b>140.000</b>
1	0	0				
1	000	00	B	R	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	<b>0</b>
1	3	0				
1	000	00	B	R	Const. Muro de Contencion lado oeste Torrentera Rummy Mayu OTB San alfonso Dist. B	<b>69.540</b>
1	3	0				
1	000	00	B		Mantenimiento y Compra de Luminarias distrito B	<b>80.000</b>
1	6	3				
1	000	00	B	R	Ampliacion Alumbrado Publico OTB Bloques Florida Dist. B	<b>8.000</b>
1	6	0				
1	000	00	B		Mejoramiento Plaza Retamoso OTB Holanda Dist. B	<b>100.000</b>
1	7	0				
1	000	00	B	R	Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B	<b>100.000</b>
1	7	0				
1	000	00	B		Const. Plaza Principal OTB Floridad Sud Dist. B	<b>140.000</b>
1	7	0				
1	000	00	B	R	Construcción de Plazuela y Parque Infantil OTB San Alfonso Dis. B	<b>256.524</b>
1	7	0				
1	000	00	B	R	Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B	<b>111.550</b>
1	7	0				
1	001	00	B	R	Const. Empedrado Lado Sud Urb. Abaroa OTB Santa Rosa Central Dist. B	<b>259.918</b>
1	7	0				

17	00140	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	75.782
17	00150	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	14.359
17	00160	B	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta y Calle Jorge Barrero OTB Elizabeth Seton Dist. B	238.000
17	00170	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	89.540
17	00180	B	R	Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	96.896
17	00190	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Los Pinos OTB La Pradera Dist. B	150.527
17	00200	B	R	Const. Pav. Rigido OTB Huanuni Dist. B	4.664
17	00210	B	R	Const. Empalme de Vías Excombatientes y Capitan V. Ustariz OTB Santa Rosa Central Dist. B	15.000
17	00220	B	R	Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	153.663
17	00230	B	R	Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	300.141
17	00240	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	285.000
17	00400	B	R	Mejoramiento de la Plaza OTB Santa Isabel Dist. B	115.603
17	00440	B	R	Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	85.192
17	00450	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Modesto Omiste OTB Municipal Dist. B	89.700
17	00460	B	R	Const. Pav. Rigido Av. D'orbigni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	56.657
17	00480	B	R	Apertura Camino Vecinal OTB Martin Cardenas Dist. B (Expropiacion)	80.000
18	00002	B		Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	260.000
18	00020	B		Construccion Av. Dorbigni Dist. B,C,D	1.800.000
18	00060	B		Const. Pav. Flexible Av. Tomas Oconor Dist.B,C	500.000
18	00150	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Paraiso OTB California Dist. B	420.000
18	00160	B		Const. Pav. Rigido Calles Joaquin Sarcedo-Jose Ayala -Eduardo Saracho OTB Elizabeth Seton Dist. B	200.000
18	00170	B		Const. Pavimento Calle 18 y 1ro. de Mayo- OTB Fabril Capacachi Dist. B	200.000
18	00180	B		Const. Empedrado de Vias OTB Martin Cardenas Dist. B	200.000
18	00190	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	200.000


18	0020	000	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	230.640
18	0021	000	B		Const. Pav. Av. Comercio OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	200.000
18	0022	000	B		Const. Pav. Rigido OTB Cucardas Dist. B	200.000
18	0023	000	B		Const. Pav. Calle F Caja de la Vega OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	200.000
18	0024	000	B		Const. Pav. Lado Norte Av. B. Galindo Sector Dimacos-Farmacorp OTB Santa Isabel Dist. B	200.000
18	0025	000	B		Const. Pav. Pasaje Modesto Omiste OTBs Magisterio Coña Coña-Municipal Coña Coña Dist. B	200.000
18	0038	000	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	0
18	0044	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Paraiso OTB California Dist. B	0
22	0004	000	B		Const. Graderas Cancha Multifuncional OTB Huanuni Dist. B	120.000
22	0006	000	B	R	Const. Cancha Polifuncional la Salvadora OTB Capacachi Central Dist. B	140.000
22	0010	000	B	R	Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	80.756
31	0001	000	B		Const. Muro de Contencion Torrentera Rummy Mayu Lado Oeste OTB San alfonso Dist. B	469.540

INFORME DE AVANCE FISICO PROYECTOS DE EDUCACION												
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2017												
Director de Obras Publicas: Arq. Claudia Orellana Alba												
Supervisor de Educacion: Ing. Javier Gutierrez Vilte												
APERTURA PROGRAMATICA	PROYECTO			UBICACION	CONT RATA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO PLANILLADO Bs.	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
21	0002	000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUN. COLCAPIRHUA		357.755,44	310.754,66	310.754,66	73%			
				"MANTENIMIENTO Y REPARACION U.E. BENEDICTO DURAN"		20.102,09	20.102,09	20.102,09	100%			CONCLUIDO

			"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA U.E. FERROVIARIA – MAX FERNANDEZ"			<b>49.608,53</b>	49.608,53	49.608,53	100 %		SI	CONCLUIDO
			"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA U.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ"			<b>19.154,22</b>	19.154,22	19.154,22	100 %		SI	CONCLUIDO
			"MANTENIMIENTO Y REPARACION U.E. PABLO CANO, JESUS LARA Y CEA LA FLORIDA"			<b>49.999,14</b>	49.999,14	49.999,14	100 %		SI	CONCLUIDO
			"MANTENIMIENTO Y REPARACION U.E. PABLO CANO, JESUS LARA Y CEA LA FLORIDA"			<b>25.000,00</b>	0,00	0,00	0%			FALTA PRESUPUESTO
			"MANTENIMIENTO Y REPARACION U.E. SAN LORENZO – RAFAEL ARNAIZ"			<b>23.102,86</b>	23.102,86	23.102,86	100 %		SI	CONCLUIDO
			"MANTENIMIENTO Y REFACCION U.E. DON BOSCO"			<b>22.000,78</b>	0,00	0,00	0%			FALTA PRESUPUESTO
			"MANTENIMIENTO U.E. SAN JOSE DE KAMI"			<b>49.994,28</b>	49.994,28	49.994,28	100 %		SI	CONCLUIDO
			"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCTIVA SAUSALITO"			<b>49.905,55</b>	49.905,55	49.905,55	100 %		SI	CONCLUIDO
			"MANTENIMIENTO DE LA U.E. SIMON BOLIVAR"			<b>48.887,99</b>	48.887,99	48.887,99	100 %		SI	CONCLUIDO
			"MANTENIMIENTO DE LA UNIDADES EDUCATIVAS TINGLADOS"			<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	0%			FALTA PRESUPUESTO
2	00	0	MEJORAMIENTO BATERIA DE BAÑOS UNIDADES EDUCATIVAS COLCAPIRHUA			<b>191.212,77</b>	<b>191.212,77</b>	<b>191.212,77</b>	100 %			
1	00	0	"MEJORAMIENTO BATERIA DE BAÑOS U.E. DANIEL SALAMANCA – 27 DE MAYO"			<b>49.967,78</b>	49.967,78	49.967,78	100 %		SI	CONCLUIDO
		7	"MEJORAMIENTO BATERIA DE BAÑOS U.E. DANIEL SALAMANCA – 27 DE MAYO"			<b>38.062,23</b>	38.062,23	38.062,23	100 %		SI	CONCLUIDO
			"MEJORAMIENTO BATERIA DE BAÑOS U.E. SAUSALITO"			<b>17.739,63</b>	17.739,63	17.739,63	100 %		SI	CONCLUIDO
			"MEJORAMIENTO BATERIA DE BAÑOS U.E. ANDRES CUSCHIERI"			<b>42.733,45</b>	42.733,45	42.733,45	100 %			PROCESO DE CONTRATACION
			"MEJORAMIENTO BATERIA DE BAÑOS U.E. SAGRADA FAMILIA"			<b>42.709,68</b>	42.709,68	42.709,68	100 %			PROCESO DE CONTRATACION
<b>TOTALES</b>						<b>548.968</b>	<b>501.967</b>	<b>501.967</b>	86%			

N° PROYECTOS DE MANTENIMIENTO	16
PROYECTOS CONCLUIDOS	10
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	0
PROYECTOS PENDIENTES	6
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO</b>	<b>86%</b>
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO</b>	<b>86%</b>

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	92,05
-----------------------------	-------

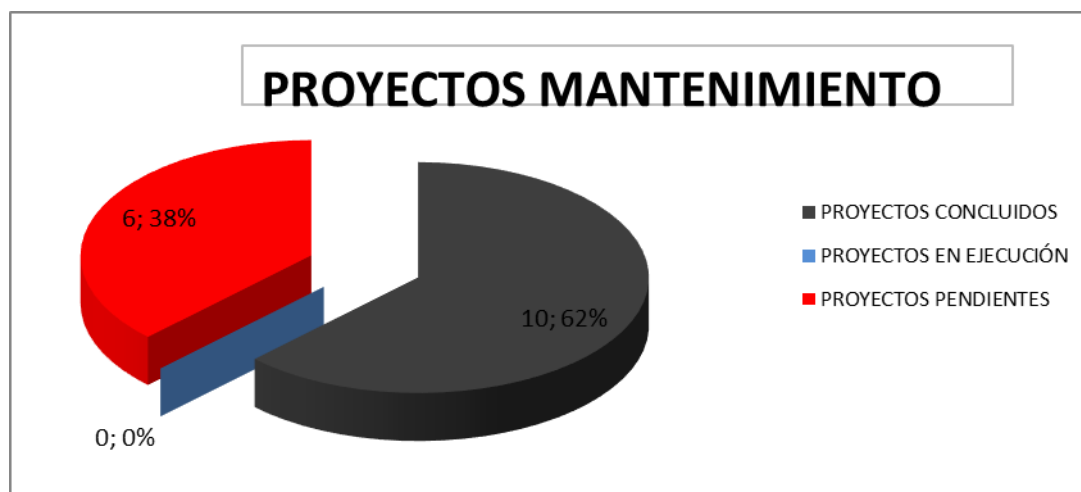




INFORME DE AVANCE FISICO PROYECTOS DE EDUCACION												
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2017												
Director de Obras Publicas: Arq. Claudia Orellana Alba												
Supervisor de Educacion: Ing. Javier Gutierrez Vilte												
APERTURA	PROGRAMATICA	PROYECTO	UBICACION	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO PLANILLADO Bs.	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES	
21	0002	000	CONST. BLOQUE INICIAL U.E. SAUSALITO	U. E. SAUSALITO	170.000,00	170.000,00	94.985,36	100%			EJECUCION	
21	0003	000	CONST. CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL GENOVEVA RIOS (EDTP)	COLCAPIRHUA	50.000,00						PLANIFICACION	
21	0004	000	CONST. CUBIERTA GRADERIAS TARIMA U.E. SAGRADA FAMILIA ANDRES CUSHIERI	U.E. SAGRADA FAMILIA ANDRES CUSHIERI	100.000,00	92.993,92	92.993,92	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
21	0005	000	CONST. BLOQUE DE LABORATORIO Y TALLERES U.E. SIMON BOLIVAR	U.E. SIMON BOLIVAR	200.000,00			100%	SI	SI	PLANIFICACION	
21	0006	000	CONST. SALON MULTIPLE U.E. DANIEL SALAMANCA - 27 DE MAYO	U.E. DANIEL SALAMANCA - 27 DE MAYO	188.206,11	188.206,11	188.206,11	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
21	0007	000	CONST. BLOQUE NUEVO 6 AULAS U.E. SAN LORENZO - RAFAEL ARNAIZ	U.E. SAN LORENZO - RAFAEL ARNAIZ	200.000,00						PLANIFICACION	
21	0008	000	CONST. DE AULAS BLOQUE DE AULAS BLOQUE NUEVO U.E. MAX FERNANDEZ FERROVIARIO	U.E. MAX FERNANDEZ FERROVIARIO	150.000,00	158.867,62	158.867,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO	
21	0009	000	CONST. BLOQUE DE TALLERES Y AULAS U.E. MAX FERNANDEZ FERROVIARIO (EDTP)	U.E. MAX FERNANDEZ FERROVIARIO (EDTP)	50.000,00						PLANIFICACION	
21	0010	000	CONST. GARAJE E INGRESO SECUNDARIO U.E. PABLO CANO JESUS LARA	U.E. PABLO CANO JESUS LARA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO	

21	0011	000		CONST. TINGLADO PATIO CENTRAL U.E. NUESTRA SRA. DE LA PAZ	U.E. NUESTRA SRA. DE LA PAZ		150.000,00							PLANIFICACION
21	0012	000		CONST. U. E. BENEDICTO DURAN (EDTP)	U. E. BENEDICTO DURAN		50.000,00							PLANIFICACION
21	0013	000		CONST. TINGLADO PATIO CENTRAL Y NIVEL INICIAL U.E. BENEDICTO DURAN	U. E. BENEDICTO DURAN	VILLACORTA TAPIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100%				EN EJECUCION
21	0014	000		CONST.NIVEL INICIAL U.E. SAN JOSE DE KAMI-MCAL SUCRE	U.E. SAN JOSE DE KAMI-MCAL SUCRE	OMAR MAGNE	250.000,00	234.579,65	234.579,65	100%	SI		SI	CONCLUIDO
21	0015	000		CONSTRUCCION PROSCENIO CANCHA MULTIPLE U.E. DON BOSCO	U.E. DON BOSCO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	30%				EN EJECUCION
21	0018	000		CONST. UNIDAD EDUCATIVA SAN CRISPIN DIST.E	U.E. SAN CRISPIN		400.000,00							PLANIFICACION
21	0100	000		CONST. BLOQUE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO U. E. 15 DE ABRIL	U. E. 15 DE ABRIL	LUJAN INGENIEROS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100%	SI		SI	CONCLUIDO
PROYE C. NUEVO				CONST MURO PERIMETRAL U. E. SAN MIGUEL	U. E. SAN MIGUEL		250.000,00	250.000,00		0%				PLANIFICACION
PROYE C. NUEVO			R	CONST MURO PERIMETRAL U. E. CARLOS VILLEGAS	U. E. CARLOS VILLEGAS		250.000,00	250.000,00		0%				PLANIFICACION
PROYE C. NUEVO			R	CONST MURO PERIMETRAL U. E. COLCAPIRHUA	U. E. COLCAPIRHUA		250.000,00	250.000,00		0%				PLANIFICACION
<b>TOTALES</b>							<b>4.518.206</b>	<b>3.404.647</b>	<b>2.579.633</b>	<b>49%</b>				

N° PROYECTOS EDUCACION	19
PROYECTOS CONCLUIDOS	6
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	3
PROYECTOS PENDIENTES	10
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO</b>	<b>49%</b>
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO</b>	<b>57%</b>

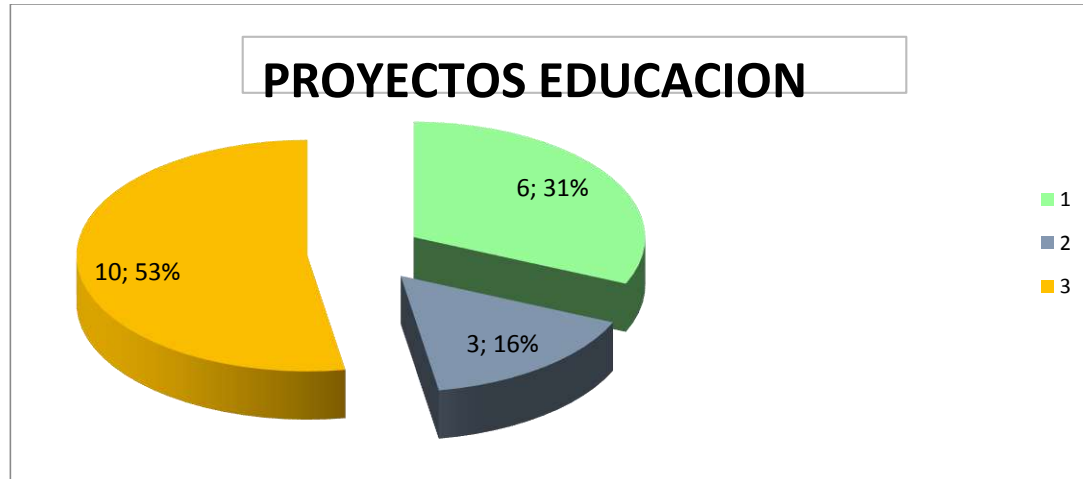


INFORME DE AVANCE FISICO PROYECTOS UPRE (UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES)												
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2017												
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. CLAUDIA FABIOLA ORELLANA ALBA												
SUPERVISOR DE OBRAS: ING. JHON R. TAPIA LAZARTE												
APERTURA PROGRAMATICA	PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO PLANILLADO Bs.	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVINCIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES		
22	0101	000	CONSTRUCCION CAMPO DEPORTIVO	OTB SAN JOSE DE KAMI	CIUDAD CONSTRUCCIONES SRL.	3.599.223,83	3.599.223,83	1.961.704,01	90%	N/C	N/C	EN EJECUCION

			GRADERIAS SAN JOSE DE KAMI		REP LEGAL: MARIELA ESPINOZA CESPEDES							
21	0102	000	CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA MODELO CARLOS VILLEGAS	OTB PIÑAMI SUD	<b>ECOASAN SRL</b> REP LEGAL: SRA. ALINDA LINA SANCHEZ BOZO	7.236.000,30	7.236.000,30	3.291.952,63	50%	N/C	N/C	EN EJECUCION
21	0101	000	CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA MODELO SAN MIGUEL	OTB SANTA ROSA	<b>ASOCIACION ACCIDENTAL CONSORSIO EXELCIOR</b> REP. LEGAL: SRA LILIAN MAGALY ROCABADO DE NAVIA	7.263.108,95	7.263.108,95	2.826.771,32	65%	N/C	N/C	EN EJECUCION
21	0103	000	CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA MODELO COLCAPIRHUA	OTB CONCORDIA	<b>SOCIEDAD ACCIDENTAL GALARZA Y TOCO CONSTRUCCIONES</b> REP. LEGAL: ING. OSCAR GALARZA PEÑARANDA	7.097.305,13	7.097.305,13	2.325.034,51	60%	N/C	N/C	EN EJECUCION
<b>TOTALES</b>						<b>25.195.638</b>	<b>25.195.638</b>	<b>10.405.462</b>				

<b>N° DE PROYECTOS UPRE (UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES)</b>			<b>4</b>
		PROYECTOS CONCLUIDOS	0
		PROYECTOS EN EJECUCIÓN	4
		PROYECTOS PENDIENTES	0
		<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO</b>	<b>66%</b>
		<b>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO</b>	<b>42%</b>

## PROYECTOS UPRE - UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

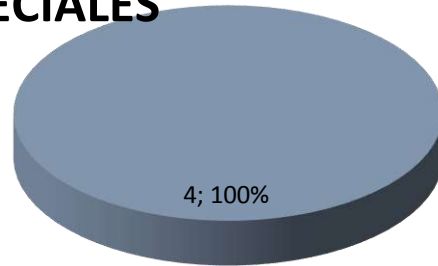

- PROYECTOS CONCLUIDOS
- PROYECTOS EN EJECUCIÓN
- PROYECTOS PENDIENTES

APERTURA PROGRAMÁTICA				DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO PLANILADO Bs.	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVICIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
PROG	PROY	ACT										
12	0000	000		<b>CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS</b>								
12	0004	000		Const. Sist. Canal de Riego OTB Fabril Capacachi Dist. B		0						
13	0000	000		<b>DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>								
13	0008	000		Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	ROSENDO MOSQUERA A.	220.000	197.111,01	54.250,29	28%			EN EJECUCION
16	0000	000		<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>								
16	0000	003		Mantenimiento Alumbrado Publico OTB Magisterio Dist. B		34.032						

16	00 00	0 0 4		Mantenimiento Alumbrado Publico OTB Santa Isabel Dist. B		10.000						
16	00 04	0 0 0	R	Ampliacion Alumbrado Publico OTB Bloques Florida Dist, B		8.000						
17	00 00	0 0 0		<b>INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL</b>								
17	00 03	0 0 0		Mejoramiento de la Plaza OTB Santa Isabel Dist. B		220.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	00 04	0 0 0		Mejoramiento Area Verde Av. Comercio OTB Santa Rosa Catavi Dist. B		0						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	00 11	0 0 0	R	Construcción de Plazuela y Parque Infantil OTB San Alfonso Dis. B		186.524						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	00 12	0 0 0	R	Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B		179.843						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	00 32	0 0 0		Const. Pav. Rígido Av. Julio Romano OTB Holanda Dist. B		90.390						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
17	00 53	0 0 0		Const. Pav. Rígido Empalme Av. Villarroel OTB Municipal Dist. B	PLASCONST	43.000	43.000,0 0	43.000,0 0	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00 00	0 0 0		<b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES</b>								
18	00 00	0 0 2		Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	VARIOS	220.000						
18	00 00	0 0 6		Conformacion de Plataformas Municipio de Colcapirhua	VARIOS	1.350.0 00						
18	00 13	0 0 0		Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	LIC. MELVI HEREDIA C.	50.000	49.989,0 6	49.989,0 6	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00 14	0 0 0		Const. Pav. Rígido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	CARLOS MORANTE	250.000	231.418, 02	224.339, 07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00 15	0 0 0		Const. Pav. Rígido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	COPHE CONSTRUCCIO NES	220.000	219.544, 62	219.544, 62	100%	SI	SI	CONCLUIDO

18	00	0		Const. Empedrado Lado Sud Urb. Abaroa OTB Santa Rosa Central Dist. B		<b>259.918</b>						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	00	0		Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	ING. NELSON MERCADO V.	<b>305.000</b>	219.808,00	219.808,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
	17	0					85.192,00					
18	00	0		Const. Pav. Rigido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	ELMER C. PADILLA O.	<b>177.000</b>	171.271,92	157.155,05	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00	0		Const. Pav. Rigido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	<b>220.000</b>	174.161,24	163.342,50	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00	0		Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	ARQ. KATTY K. PEREZ M.	<b>175.000</b>	99.217,71	99.217,71	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00	0		Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	<b>220.000</b>	219.689,73	219.684,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00	0		Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	<b>265.000</b>	149.925,64	144.482,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
	22	0			ING. ROY R. LUJAN R.		89.995,10	89.876,95	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00	0		Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	ING. FELIPE HERRERA S.	<b>234.280</b>	215.462,92	219.920,87	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00	0		Const. Pav. Rigido Av. Sexta y Calle Jorge Barrero OTB Elizabeth Seton Dist. B		<b>220.000</b>						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	00	0		Const. Pav. Rigido Calle Cercado-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B		<b>0</b>						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	00	0		Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	ING. ROY R. LUJAN R.	<b>418.989</b>	300.318,80	327.448,52	100%	SI	SI	CONCLUIDO
	26	0										
18	00	0		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	SIAJSA LTDA	<b>316.000</b>	219.107,07	219.107,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00	0		Const. Pav. Rigido Calle Los Pinos OTB La Pradera Dist. B		<b>320.000</b>						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	00	0		Const. Pav. Rigido Calle Paraiso OTB California Dist. B		<b>220.000</b>						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	00	0		Apertura de Camino OTB San Alfonso Dist. B		<b>0</b>						

18	00	0		Const. Empedrado Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B		0						
18	00	0		Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Efec, Cucardas Dist. B	ING. FELIPE HERRERA S.	270.000	49.566,62	49.566,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
	32	0			ING. FELIPE HERRERA S.		219.278,44	219.278,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00	0		Const. Pav. Rigido OTB Huanuni Dist. B		109.705						
18	00	0	R	Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	PLASCONST	6.605.630	2.507.078,45	2.507.078,45	100%	SI	SI	CONCLUIDO
	62	0			K-LUYO & ASOCIADOS		3.948.714,14		22%			EN EJECUCION
18	00	0	R	Const. Pav. Rigido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	F & Z ING. LORENA ZENTENO	537.555	893.146,25	831.210,80	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00	0	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	JOSE TERAN	321.408	146.779,22	146.779,22	100%	SI	SI	CONCLUIDO
	65	0			JOSE TERAN		149.913,97	149.913,97	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00	0	R	Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	JOSE TERAN	60.000	59.680,21	59.680,21	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	00	0	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B		35.000						
18	00	0	R	Const. Empedrado de vias OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II		11.609						
18	00	0	R	Const. Pav. Rigido C/Noel Kemp Mercado OTB Holanda Dist. B Tramo III		0						
18	00	0	R	Mejoramiento de Vias OTB San alfonso Dist. B		0						
18	00	0	R	Const. Empedrado OTB Capacachi Central Dist. B		445						
18	00	0	R	Const. Empalme de Vias Excombatientes y Capitan V. Ustariz OTB Santa Rosa Central Dist. B		15.000						ARQ. CLAUDIA ORELLANA
18	01	0		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Efec Cucardas Dist. B		10.063						
18	01	0	R	Const. Pav. Rigido C/Noel Kemp Mercado OTB Holanda Dist. B Tramo IV		0						



18	01 03	0 0 0	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	HILDA MAMANI ARCE	55.000	55.000,0 0	55.000,0 0	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	01 04	0 0 0		Apertura Camino Vecinal OTB Martin Cardenas Dist. B (Expropiacion)		80.000						
18	01 06	0 0 0	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	ARQUIFORMA S.R.L.	101.106	91.452,7 3	91.452,7 3	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	01 10	0 0 0	R	Const. Empedrado de Vías OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B		40.470						
18	01 11	0 0 0	R	Const. Empedrado OTB Comercio Cochabamba Dist. B		195.000						
18	01 16	0 0 0		Const. Empalmes C/ Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B		0						
18	01 21	0 0 0		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	CARLOS SALVATIERRA	215.000	211.999, 96	61.336,4 9	29%			EN EJECUCION
18	01 22	0 0 0		Const. Pav. Rigido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	HIPOLITO CAMACHO	120.000	118.400, 05	111.907, 96	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	01 26	0 0 0		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B		230.141						
18	01 33	0 0 0		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B		285.000						
20	00 00	0 0 0		<b>SERVICIO DE SALUD</b>								
20	00 01	0 0 0	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	GAAR INGENIERIA	5.691.4 39	2.893.38 6,76	3.162.60 4,70	100%	SI	SI	CONCLUIDO
22	00 00	0 0 0		<b>DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>								
22	00 06	0 0 0		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	METAL OBRAS CONSTRUCCIO NES	335.000	254.243, 86	254.243, 86	100%	SI	SI	CONCLUIDO
							80.756,1 4					POR EJECUTAR

22	00 07	0 0 0		Mejoramiento Cancha Multiple OTB Santa Rosa Catavi Dist. B		0					
22	00 25	0 0 0		Mejoramiento Cancha Polifuncional OTB Fabril Capacachi Dist. B		5.000					ARQ. CLAUDIA ORELLANA
22	00 30	0 0 0		Const. Cancha Polifuncional la Salvadora OTB Capacachi Central Dist. B		140.000					ARQ. CLAUDIA ORELLANA
31	00 00	0 0 0		<b>PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES</b>							
31	00 06	0 0 0		Const. Muro de Contencion lado oeste Torrentera Rummy Mayu OTB San alfonso Dist. B		269.540					ARQ. CLAUDIA ORELLANA

APERTURA PROGRAMATICA			PROYECTO	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
13	0008	000	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	28%			EN EJECUCION
17	0053	000	Const. Pav. Rigido Empalme Av. Villarroel OTB Municipal Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0000	002	Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	65%			EN EJECUCION
18	0013	000	Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0014	000	Const. Pav. Rigido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0015	000	Const. Pav. Rigido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0017	000	Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0017	000	Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0018	000	Const. Pav. Rigido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0019	000	Const. Pav. Rigido Av. D'orbignni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0020	000	Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0021	000	Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalen Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalen Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0023	000	Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0026	000	Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO

18	0026	000		Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0032	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Efec, Cucardas Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0032	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Efec, Cucardas Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	35%			EN EJECUCION
18	0064	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0066	000	R	Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vías OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Efec Cucardas Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0103	000	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0106	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0110	000	R	Const. Empedrado de Vias OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0121	000		Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	29%			EN EJECUCION
18	0122	000		Const. Pav. Rigido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	0%			PARA EJECUCION
18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	0%			PARA EJECUCION
20	0001	000	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	100%	SI	SI	CONCLUIDO
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	100%	SI	SI	CONCLUIDO
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR

<b>INFORME DE AVANCE FISICO PROYECTOS DISTRITO B</b>									
<b>AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015</b>									
<b>Director de Obras Publicas: Ing. Carlo G. Mercado Rocabado</b>									


Supervisor Dist. B: Ing. Wilson Jobany Bustamante A.													
APERTURA PROGRAMATICA				PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO O Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO PLANILLADO Bs.	AVANCE FISICO %	ACTAS DE RECEPCION PROVINCIONAL	ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
13	0008	000		Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	OTB SANTA ROSA CATAVI	ROSENDO MOSQUERA A.	220.000	197.111,01	54.250,29	28%			EN EJECUCION
17	0053	000		Const. Pav. Rígido Empalme Av. Villarroel OTB Municipal Dist. B	OTB MUNICIPAL	PLASCONST	43.000	43.000,00	43.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0000	002		Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	DISTRITO B	VARIOS	220.000			65%			EN EJECUCION
18	0013	000		Mejoramiento de Via OTB Capacachi Central Dist. B	OTB CAPACACHI CENTRAL	LIC. MELVI HEREDIA C.	50.000	49.989,06	49.989,06	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0014	000		Const. Pav. Rígido Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B	OTB MOROCOCALE	CARLOS MORANTE	250.000	231.418,02	224.339,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0015	000		Const. Pav. Rígido Calle 1 OTB Sausalito Dist. B	OTB SAUSALITO	COPHE CONSTRUCCIONES	220.000	219.544,62	219.544,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0017	000		Const. Pav. Rígido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	OTB BARTOS	ING. NELSON MERCADO V.	305.000	219.808,00	219.808,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB BARTOS			85.192,00		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0018	000		Const. Pav. Rígido Calle Jaime Escalante y Adyacentes OTB Municipal Dist. B	OTB MUNICIPAL	ELMER C. PADILLA O.	177.000	171.271,92	157.155,05	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0019	000		Const. Pav. Rígido Av. D'orbigni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	OTB MAGISTERIO	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	174.161,24	163.342,50	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0020	000		Const. Pav. Rígido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	OTB SANTA ISABEL	ARQ. KATTY K. PEREZ M.	175.000	99.217,71	99.217,71	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0021	000		Const. Pav. Rígido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	OTB OASYS	ING. ROY R. LUJAN R.	220.000	219.689,73	219.684,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0022	000		Const. Pav. Rígido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	OTB NUEVA JERUSALEN	ING. ROY R. LUJAN R.	265.000	149.925,64	144.482,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB NUEVA JERUSALEN	ING. ROY R. LUJAN R.		89.995,10	89.876,95	100%	SI	SI	CONCLUIDO

18	0023	000		Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	OTB HOLANDA	ING. FELIPE HERRERA S.	234.280	215.462,92	219.920,87	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0026	000		Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	OTB FLORIDA NORTE	ING. ROY R. LUJAN R.	418.989	300.318,80	327.448,52	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB FLORIDA NORTE			118.670,20		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0027	000		Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	OTB FLORIDA SUD	SIAJSA LTDA	316.000	219.107,07	219.107,07	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB FLORIDA SUD			96.892,93		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0032	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani OTB Urbanizacion Elfec, Cucardas Dist. B	OTB ELFEC CUCARDAS	ING. FELIPE HERRERA S.	270.000	49.566,62	49.566,62	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB ELFEC CUCARDAS	ING. FELIPE HERRERA S.		219.278,44	219.278,44	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0062	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	DISTRITO B	PLASCONST	6.605.630	2.507.078,45	2.507.078,45	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					DISTRITO B	K-LUYO & ASOCIADOS		3.948.714,14		35%			EN EJECUCION
18	0064	000	R	Const. Pav. Rigido Av. Excombatientes Colcapirhua Fase I	DISTRITO B	F & Z ING. LORENA ZENTENO	537.555	893.146,25	831.210,80	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0065	000	R	Const. Pav. Flexible Av. Simon Bolivar OTB Oasys Dist. B Fase II	OTB OASYS	JOSE TERAN	321.408	146.779,22	146.779,22	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB OASYS	JOSE TERAN		149.913,97	149.913,97	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0066	000	R	Const. Pav. Flexible C/Adyacentes Parque OTB La Pradera Dist. B tramo IV	OTB LA PRADERA	JOSE TERAN	60.000	59.680,21	59.680,21	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0070	000	R	Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B	OTB HOLANDA		35.000			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0071	000	R	Const. Empedrado de vias OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	OTB SANTA ROSA CENTRAL		11.609			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0101	000		Const. Pav. Rigido de Vias OTB Elfec Cucardas Dist. B	OTB ELFEC CUCARDAS		10.063			0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0103	000	R	Const. Empedrado Av. Andina OTB Capacachi Central Dist. B	OTB CAPACACHI CENTRAL	HILDA MAMANI ARCE	55.000	55.000,00	55.000,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO

18	0106	000	R	Const. Pav. Rígido Av. Sexta OTB Elizabeth Seton Dist. B	OTB ELIZABETH SETON	ARQUIFORMA S.R.L.	101.106	91.452,73	91.452,73	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0110	000	R	Const. Empedrado de Vías OTB Junta Vecinal Martin Cardenas Dist. B	OTB MARTIN CARDENAS	EUSEBIO ANZALDO	40.470	99.950,00	99.950,00	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0121	000		Const. Pav. Rígido OTB Fabril Capacachi Dist. B	OTB FABRIL CAPACACHI	CARLOS SALVATIERRA	215.000	211.999,96	61.336,49	29%			EN EJECUCION
18	0122	000		Const. Pav. Rígido C/ Dos Norte OTB Sausalito Dist. B	OTB SAUSALITO	HIPOLITO CAMACHO	120.000	118.400,05	111.907,96	100%	SI	SI	CONCLUIDO
18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	OTB URBANIZACION LA PAZ		230.141			0%			PARA EJECUCION
18	0133	000		Const. Pav. Rígido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	OTB COMERCION COCHABAMABA		285.000			0%			PARA EJECUCION
20	0001	000	R	Construccion Hospital segundo Nivel Capacachi Fase II	OTB CAPACACHI CENTRAL	GAAR INGENIERIA	5.691.439	2.893.386,76	3.162.604,70	100%	SI	SI	CONCLUIDO
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	OTB MARTIN CARDENAS	METAL OBRAS CONSTRUCCIONES	335.000	254.243,86	254.243,86	100%	SI	SI	CONCLUIDO
					OTB MARTIN CARDENAS			80.756,14		0%			PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
<b>TOTALES</b>							<b>18.258.690</b>	<b>14.680.123</b>	<b>10.251.170</b>				

N° PROYECTOS DISTRITO B	40
PROYECTOS CONCLUIDOS	27
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	6
PROYECTOS PENDIENTES PARA REPROGRAMACION	7
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FISICO</b>	<b>71,41</b>

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	71,41
-----------------------------	-------

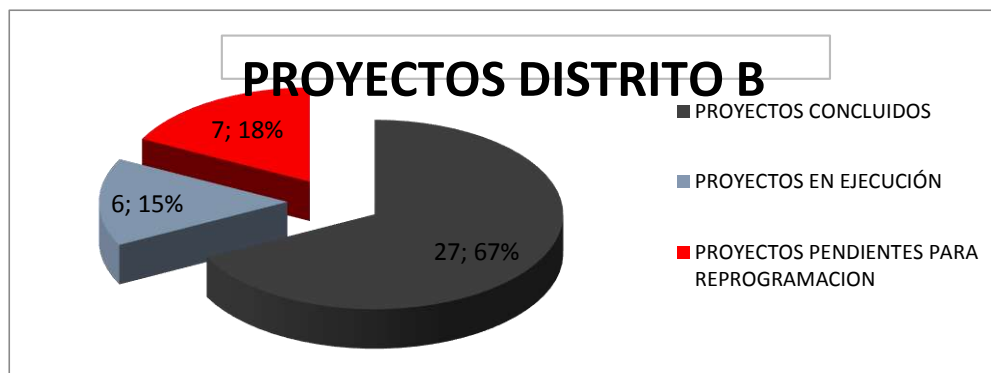

NOTA: LOS DE COLOR ROJO SON LOS PROYECTOS PARA REPROGRAMAR EL 2017

APERTURA PROGRAMATICA			PROYECTO	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO P/SER REPROGRAMADO Bs.	OBSERVACIONES
13	0008	000	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	<b>220.000,00</b>	165.749,71	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0017	000	Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	<b>305.000,00</b>	85.192,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0026	000	Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	<b>418.989,00</b>	118.670,20	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0027	000	Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	<b>316.000,00</b>	96.892,93	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0062	000	R Const. Pav. Rigido Av. Villarroel Colcapirhua Fase I	<b>6.605.630,00</b>	3.098.476,90	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0070	000	R Const. Obras Complementarias Pavimento Rigido de Vias OTB Barrio Holanda Dist. B	<b>35.000,00</b>	35.000,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0071	000	R Const. Empedrado de vías OTB Santa Rosa Central Dist. B Fase II	<b>11.609,00</b>	11.609,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0101	000	Const. Pav. Rigido de Vias OTB Elfec Cucardas Dist. B	<b>10.063,00</b>	10.063,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0121	000	Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	<b>215.000,00</b>	153.663,51	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR

18	0126	000		Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	<b>230.141,00</b>	230.141,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0133	000		Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	<b>285.000,00</b>	285.000,00	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
22	0006	000		Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	<b>335.000,00</b>	80.756,14	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
							PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0000	002		Mtto y Mejoramiento av. 16 de Julio Distrito B		42.024,31	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
18	0000	006		Conformacion de Plataforma Calle Francisco Viedma OTB Morococala Dist. B		20.942,80	PENDIENTE P/ REPROGRAMAR
<b>TOTALES</b>					<b>8.987.432,00</b>	<b>4.371.214,39</b>	

1 1	000 8	00 0	B		Const.Pozo de Agua Potable OTB Santa Rosa Central Dist. B	<b>140.000</b>
1 1	001 5	00 0	B		Mej. Agua Potable C/ Sist. Tratamiento OTB Comercio Cbba. Santa Rosa Sud Dist. B	<b>200.000</b>
1 1	002 1	00 0	B	R	Mej. Sistema de Agua Potable OTB Nueva Jerusalem Dist. B	<b>45.000</b>
1 1	003 6	00 0	B	R	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	<b>165.750</b>
1 1	004 0	00 0	B	R	Const. Perforacion de Pozo de Agua Potable OTB Huanuni Dist. B	<b>140.000</b>
1 3	000 4	00 0	B	R	Const. Canalización Desague Pluvial Av. Arquimedes OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	<b>0</b>
1 3	000 5	00 0	B	R	Const. Muro de Contencion lado oeste Torrentera Rummy Mayu OTB San alfonso Dist. B	<b>69.540</b>
1 6	000 0	00 3	B		Mantenimiento y Compra de Luminarias distrito B	<b>80.000</b>
1 6	000 2	00 0	B	R	Ampliacion Alumbrado Publico OTB Bloques Florida Dist, B	<b>8.000</b>
1 7	000 1	00 0	B		Mejoramiento Plaza Retamoso OTB Holanda Dist. B	<b>100.000</b>
1 7	000 2	00 0	B	R	Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B	<b>100.000</b>
1 7	000 4	00 0	B		Const. Plaza Principal OTB Floridad Sud Dist. B	<b>140.000</b>
1 7	000 7	00 0	B	R	Construcción de Plazuela y Parque Infantil OTB San Alfonso Dis. B	<b>256.524</b>
1 7	000 8	00 0	B	R	Mejoramiento Parque OTB La Pradera Dist. B	<b>111.550</b>
1 7	001 3	00 0	B	R	Const. Empedrado Lado Sud Urb. Abaroa OTB Santa Rosa Central Dist. B	<b>259.918</b>



17	0014	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Sebastian Pagador OTB Santa Isabel Dist. B	75.782
17	0015	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Feliz del Granado OTB Holanda Dist. B	14.359
17	0016	000	B	R	Const. Pav. Rigido Av. Sexta y Calle Jorge Barrero OTB Elizabeth Seton Dist. B	238.000
17	0017	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Miguel Lanza OTB Florida Norte Dist. B	89.540
17	0018	000	B	R	Const. Pav. Flexible Calle 21 de Septiembre y Paralela a la Av. B. G. OTB Florida Sud Dist. B	96.896
17	0019	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Los Pinos OTB La Pradera Dist. B	150.527
17	0020	000	B	R	Const. Pav. Rigido OTB Huanuni Dist. B	4.664
17	0021	000	B	R	Const. Empalme de Vias Excombatientes y Capitan V. Ustariz OTB Santa Rosa Central Dist. B	15.000
17	0022	000	B	R	Const. Pav. Rigido OTB Fabril Capacachi Dist. B	153.663
17	0023	000	B	R	Const. Pavimento Pulacayo-Antonio de la Calancha OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	300.141
17	0024	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Arani-Quillacollo OTB Comercio Cochabamba Dist. B	285.000
17	0040	000	B	R	Mejoramiento de la Plaza OTB Santa Isabel Dist. B	115.603
17	0044	000	B	R	Const. Pav. Rigido Av. Gualberto Villarroel OTB Bartos Dist. B	85.192
17	0045	000	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Modesto Omiste OTB Municipal Dist. B	89.700
17	0046	000	B	R	Const. Pav. Rigido Av. D'orbigni Calzada Sud OTB Magisterio Dist. B	56.657
17	0048	000	B	R	Apertura Camino Vecinal OTB Martin Cardenas Dist. B (Expropiacion)	80.000
18	0000	002	B		Mtto, Mejoramiento y Ripiado Calles y caminos distrito B	260.000
18	0002	000	B		Construccion Av. Dorbigni Dist. B,C,D	1.800.000
18	0006	000	B		Const. Pav. Flexible Av. Tomas Oconor Dist.B,C	500.000
18	0015	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Paraiso OTB California Dist. B	420.000
18	0016	000	B		Const. Pav. Rigido Calles Joaquin Sarcedo-Jose Ayala -Eduardo Saracho OTB Elizabeth Seton Dist. B	200.000
18	0017	000	B		Const. Pavimento Calle 18 y 1ro. de Mayo- OTB Fabril Capacachi Dist. B	200.000
18	0018	000	B		Const. Empedrado de Vias OTB Martin Cardenas Dist. B	200.000
18	0019	000	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Caritas OTB Oasys Dist. B	200.000


180	00200	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	230.640
181	00200	B		Const. Pav. Av. Comercio OTB Santa Rosa Catavi Dist. B	200.000
182	00200	B		Const. Pav. Rigido OTB Cucardas Dist. B	200.000
183	00200	B		Const. Pav. Calle F Caja de la Vega OTB Urbanizacion La Paz Dist. B	200.000
184	00200	B		Const. Pav. Lado Norte Av. B. Galindo Sector Dimacos-Farmacorp OTB Santa Isabel Dist. B	200.000
185	00200	B		Const. Pav. Pasaje Modesto Omiste OTBs Magisterio Coña Coña-Municipal Coña Coña Dist. B	200.000
188	00300	B	R	Const. Pav. Rigido Pasaje Augusto Arraya OTB Nueva Jerusalem Dist. B	0
184	00400	B	R	Const. Pav. Rigido Calle Paraiso OTB California Dist. B	0
224	00000	B		Const. Graderas Cancha Multifuncional OTB Huanuni Dist. B	120.000
226	00000	B	R	Const. Cancha Polifuncional la Salvadora OTB Capacachi Central Dist. B	140.000
220	00100	B	R	Const. Cubierta Cancha Multiple OTB Martin Cardenas Dist. B	80.756
311	00000	B		Const. Muro de Contencion Torrentera Rummy Mayu Lado Oeste OTB San alfonso Dist. B	469.540

### III.1.1 SANEAMIENTO BÁSICO

INFORME DE AVANCE SANEAMIENTO BÁSICO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DE 2017													
Jefe Saneamiento Básico/Supervisor: Ing. Daniel Marcelo Ramallo Serna													
Supervisor/Planificador: Arq. Rudy Ruslan Fuentes Camacho													
APERTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATADO Bs.	MONTO EJECUTADO Bs.	AVANCE FÍSICO %	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
	110000	0000		SANEAMIENTO BÁSICO									
OBRAS MENORES	110003	0000		COMPRA DE TUBERIAS URB. SANTA MARIA KAMI	OTB CUATRO ESQUINAS	FERRETERIA MONICA	15.277,00	15.277,00	15.277,00	100,00	SI	SI	CONCLUIDO

2017	1 1	000 9	00 0		Const. Peforacion Pozo de Agua OTB Kanaut Dist. A	OTB KANAUT	LUPABAL	140.000,00	130.761,18		80,00	NO	NO	EN EJECUCIÓN
	1 1	001 8	00 0		Ampliación Red de Alcantarillado OTB Taramocko Dist. A	OTB TARAMOCK O	AGUAYO	30.039,37	30.039,37		100,00	SI	SI	CONCLUIDO
								PORCENTAJE DE AVANCE FISICO			93,33			

N° PROYECTOS DISTRITO A POA 2017	3
PROYECTOS CONCLUIDOS	2
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	1
PROYECTOS PENDIENTES	0
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	93,33

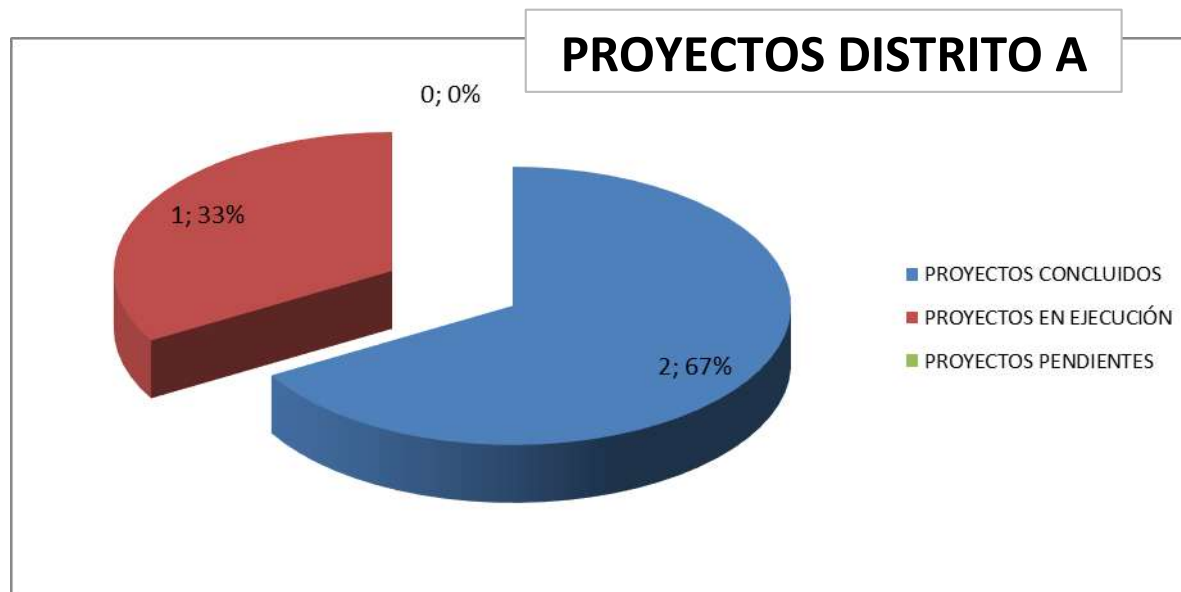


INFORME DE AVANCE SANEAMIENTO BÁSICO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DE 2017													
				Jefe Saneamiento Básico/Supervisor: Ing. Daniel Marcelo Ramallo Serna									
				Supervisor/Planificador: Arq. Rudy Ruslan Fuentes Camacho									
APERTURA	PROGRAMÁTICA			PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATADO Bs.	MONTO EJECUTADO Bs.	AVANCE FÍSICO %	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	OBSERVACIONES
	11	0000	000	SANEAMIENTO BÁSICO									
OBRAS MENORES 2017	11	0000	002	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO AV. DORBIGNI ENTRE CALLE JOSE MARIA SANTIVAÑEZ Y CALLE INNOMINADA DIST. B	OTB CAPACACHI CENTRAL		48.149,30			0,00	NO	NO	EN PROCESO DE CONTRATACION

2017	11	0000	002		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO AV. DORBIGNI ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE AUGUSTO GUZMAN DIST. B	OTB CAPACACHI CENTRAL		49.968,83			0,00	NO	NO	EN PROCESO DE CONTRATACION
	11	0000	002		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO AV. DORBIGNI ENTRE CALLE AUGUSTO GUZMAN Y CALLE MIGUEL RAMALLO DIST. B	OTB CAPACACHI CENTRAL		49.998,63			0,00	NO	NO	EN PROCESO DE CONTRATACION
	11	0000	002		MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS AV. DORBIGNI ENTRE AV. 16 DE JULIO Y CALLE JOSE MARIA SANTIVANEZ DIST. B	OTB CAPACACHI CENTRAL		46.405,96			0,00	NO	NO	EN PROCESO DE CONTRATACION
	11	0000	003		Mantenimiento Sistema de Agua Potable OTB Santa Rosa Catavi Dist.B	OTB SANTA ROSA CATAVI		100.000,00			0,00	NO	NO	EN ELABORACION
	11	0004	000		Const. Peforacion Pozo de Agua OTB Santa Rosa Central Dist. B	OTB SANTA ROSA CENTRAL		140.000,00			0,00	NO	NO	NO EXISTE AREA DE TRABAJO AREA VERDE EN TRAMITE DE URBANISMO
	11	0008	000		Const.Planta de Tratamiento de Agua Potable OTB Martin Cardenas Dist.B	OTB MARTIN CARDENAS		140.000,00			0,00	NO	NO	PROYECTO NUEVO 2017 OTB REALIZO TRASPASO A OTRO PROYECTO
	21	0016	000		Perforacion de pozo de agua potable UE Sagrada Familia- Andres Cuschieri	OTB CAPACACHI CENTRAL	DISTRIBUIDOR A SAN RAFAEL	140.000,00	130.736,93		80,00	NO	NO	EN EJECUCION
	21	0017	000				HIDRODRILL	140.000,00	135.124,93		20,00	NO	NO	EN EJECUCION




	1 1	000 0	00 2		COMPRA DE TUBERIAS DESFOGUE BOMBA FERROVIARIO SUD	OTB SUM. FERR. SUD	FERRETERIA MONICA							
2017	1 1	000 5	00 0		Ampliacion Sistema de Agua Potable OTB Sumumpaya Central Dist. C	OTB SUMUNPAY A CENTRAL		100.000,00			0,00	NO	NO	EN ELABORACION OTB TRAMITANDO TRASPASO A SUMUMPAYA NORTE
	1 1	001 0	00 0	R	Const. Estacion Elevadora Desague Pluvial Colcapirhua	OTB SUM. FERR. SUD	EMP. CONSTRUCTOR A MILLENIUM	300.000,00	626.573,42	270.795,88	100,00	NO	NO	CONCLUIDO
								PORCENTAJE DE AVANCE FISICO			66,67			

Nº PROYECTOS DISTRITO C POA 2017	3
PROYECTOS CONCLUIDOS	2
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	0
PROYECTOS PENDIENTES	1
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	66,67

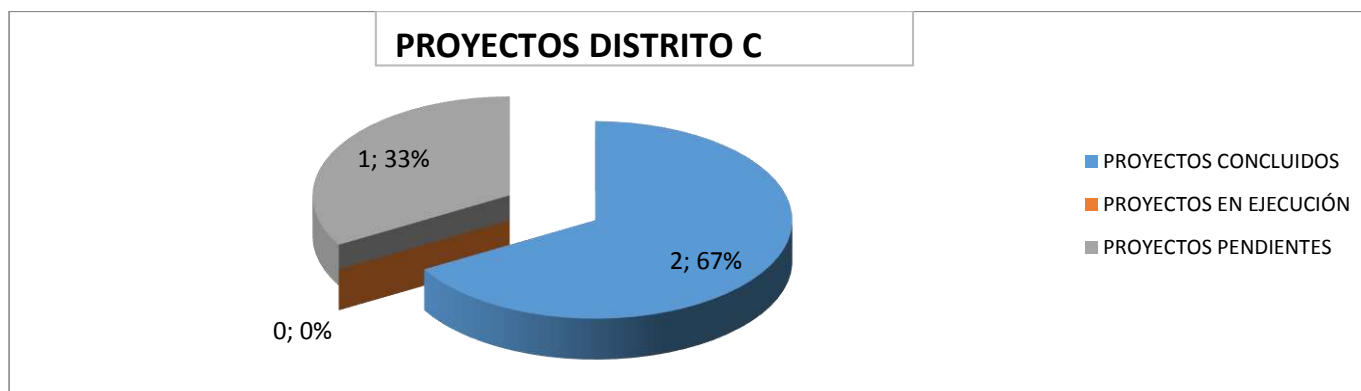

INFORME DE AVANCE SANEAMIENTO BÁSICO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DE 2017														
				Jefe Saneamiento Básico/Supervisor: Ing. Daniel Marcelo Ramallo Serna										
				Supervisor/Planificador: Arq. Rudy Ruslan Fuentes Camacho										
APERTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATO Bs.	MONTO EJECUTADO Bs.	AVANCE FISICO %	ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA	OBSERVACIONES	
	11	0000	000	<b>SANEAMIENTO BÁSICO</b>										
2017	11	0040	000	Perforacion Pozo de Agua Potable OTB 21 de Septiembre Dist. D	OTB 21 DE SEPTIEMBRE	MARIO GUAMAN	140.000,00	111.995,94		100,00	NO	NO	CONCLUIDO	
	11	0041	000	Perforacion Pozo de Agua Potable OTB San Lorenzo Dist. D	OTB SAN LORENZO	MARIO GUAMAN	140.000,00	109.841,00		100,00	NO	NO	CONCLUIDO	
							PORCENTAJE DE AVANCE FISICO			100,00				

N° PROYECTOS DISTRITO D POA 2017	2
PROYECTOS CONCLUIDOS	2
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	0
PROYECTOS PENDIENTES	0
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	100,00

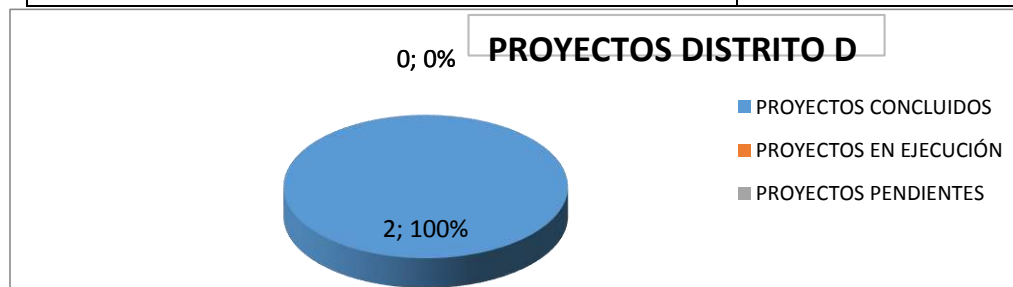





INFORME DE AVANCE SANEAMIENTO BÁSICO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DE 2017														
				Jefe Saneamiento Básico/Supervisor: Ing. Daniel Marcelo Ramallo Serna										
				Supervisor/Planificador: Arq. Rudy Ruslan Fuentes Camacho										
APERTURA PROGRAMÁTICA				PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	MONTO ASIGNADO Bs.	MONTO CONTRATADO Bs.	MONTO EJECUTADO Bs.	AVANCE FÍSICO %	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	OBSERVACIONES	
	11	0000	000		SANEAMIENTO BÁSICO									
2017	11	0001	000		Const. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Colcapirhua	ESQUILAN CHIJLLAWIRI SUMUMPAYA SUD	CONSULTORA ASOC. ACC. DUMAX	2.000.000,00	236.280,64	118.140,32	100,00	NO	NO	PROYECTO 2016 CONCLUIDO NO CUENTA CON ACTA DEFINITIVA ESTA EN EJECUCION TRAMITANDO LICENCIA AMBIENTAL
	11	0006	000		Ampliacion Alcantarrillado OTB Sumumpaya Sud Dist.E	OTB SUMUMPAYA SUD		150.000,00			0,00	NO	NO	PROYECTO NUEVO 2017 OTB GESTIONANDO TRASPASO PRESUPUESTARIO A PARA PERFORACION DE POZO
	11	0007	000		Const. Planta de Tratamiento de Agua Potable OTB Sumumpaya Central Grande Dist.E	OTB SUMUMAPYA CENTRAL GRANDE		150.000,00			0,00	NO	NO	EN ELABORACION
	11	0011	000		Const. Tanque Elevado Agua Potable OTB Esquilan Ladrilleros Dist. E	OTB ESQUILAN LADRILLEROS		140.000,00			0,00	NO	NO	PROYECTO 2016 CONCLUIDO LA FASE CONTRATADA EL 2016 EL SALDO DEBE REPROGRAMARSE PARA CONCLUSION DE ACTIVIDADES COMO PINTURA, BARANDA Y OTROS.
	11	0027	000		Perforacion Pozo de Agua Potable OTB Sumumpaya Kullcu Dist. E	OTB SUMUMPAYA KULLCU	ARQ. L.RICHARD VEGA RIVERA	250.000,00	64.676,50	64.676,50	100,00	SI	SI	CONCLUIDO

11	0029	000		Const. Sistema de Tratamiento de Agua Potable OTB Esquilan Grande Dist. E	OTB ESQUILAN GRANDE	HIDRODRILL	217.496,00	217.172,54		100,00	NO	NO	CONCLUIDO
11	0044	000		Ampliación Red Alcantarillado y Funcionamiento Sist. Alcantarillado Colcapirhua Fase II	OTB ESQUILAN CHIJLLAWIRI		1.000.000,00			0,00	NO	NO	EN ELABORACION
11	0031	000	R	Mej. Sistema de Agua Potable c/ Sist. Tratamiento OTB Sind. Agrario Esquilan Grande Dist. E	OTB SINDICATO AGR. ESQUILAN GRANDE	SR. RUBEN MENESES ROCHA	180.000,00	179.778,39		100,00	NO	NO	PROYECTO 2016 CONCLUIDO CON OBSERVACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ACTUALMENTE ESTA PARA REPROGRAMACION NO SE PUEDE HACER CIERRE EN SISIN ESTA CON INFORME DE RESOLUCION DE CONTRATO POR ABANDONO E INCUMPLIMIENTO
							PORCENTAJE DE AVANCE FISICO			50,00			

N° PROYECTOS DISTRITO E POA 2017	8
PROYECTOS CONCLUIDOS	4
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	0
PROYECTOS PENDIENTES	4
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	50,00



PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE OBRAS SANEAMIENTO BÁSICO								
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2017								
DETALLE/DISTRITOS	A	B	C	D	E	COLCAPIRHUA	PORCENTAJE NUMERICO	
TOTAL PROYECTOS	3	9	3	2	8	25		
PROYECTOS CONCLUIDOS	2	0	2	2	4	10	40,00	
PROYECTOS EN EJECUCIÓN	1	2	0	0	0	3	12,00	
PROYECTOS PENDIENTES	0	7	1	0	4	12	48,00	
PORCENTAJE DE AVANCE %	93,33	11,11	66,67	100,00	50,00	64,22		

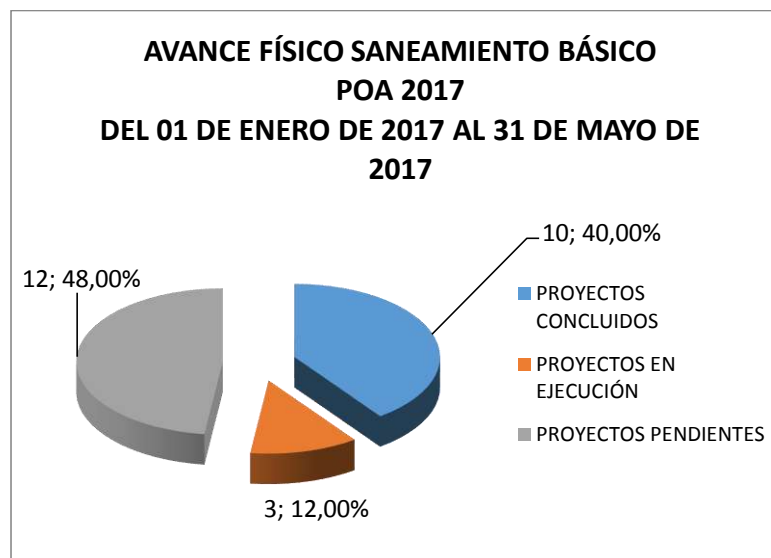

## III.2.- DIRECCION DE URBANISMO Y CATASTRO

**Arq. Jorge López Canedo**  
**DIRECTOR DE URBANISMO Y CATASTRO**  
 INFORME SEMESTRAL 2017 (ENERO A JUNIO)

INFORME DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE URBANISMO Y CATASTRO				
ACTIVIDAD	INGRESO PARA VoBo RESOLUCIONES	REMITIDOS A ASESORIA URB.	OBSERVADOS	OBSERVACIONES
APROBACION-REGULARIZACION DE PROPIEDADES	469	464	10	Resoluciones con trámites de diferentes gestiones.
	INGRESO TRAMITE CONCLUIDO	REMITIDOS A VENTANILLA UNICA	OBSERVADOS	
	408	469		
AREAS DE CESIONES PARA AREAS VERDES EQUIPAMIENTO	2 URBANIZACIONES CONCLUIDOS	6 PARA REMISION CONCEJO	SUPERFICIE PARA SU REGISTRO AREAS VERDES.	SUPERFICIE EN VIAS PARA SU REGISTRO D.D.RR.
INFORMES PARA EXPROPIACIONES	4			INFORMES ELAVORADOS PARA SU PROCESO CORESPONDIENTE

APERTURAS DE VIAS 2017	CALLE / AV.	TIPO DE TRABAJO	DOCUMENTACION	OBSERVACIÓN
DISTRITO 31-N	D'orbigni de 20,00m.	Demolición en un tramo.	CON DOCUMENTACION DE RESPALDO y coordinación con los propietario.	Trabajo en coordinación para que el predio entre en rasante para el ensanche de vía de la Av. D'orbigni.
DISTRITO 30-S	Calle Milanos de 10,00m			Tramo de 97m.
DISTRITO 30-S	Calle Nenufares de 6,00m. y Av. Reducto de 20,00m			Tramo de 220m.
DISTRITO 31-S	Av. Ferroviaria de 24,00m y Calle Quetzales de 12,50m	Limpieza de vía.	Con la coordinación de la OTB y los Propietarios en diferentes tramos.	2° Tramo de 60m.
DISTRITO31-S	Calle Gorriones de 12,50m.	Limpieza de vía.	Con la coordinación de la OTB y los Propietarios en diferentes tramos.	3° Tramo en zona Urbana de 51,00m.
DISTRITO 30-S	Calle Innominada de 10,00m.	Limpieza y ensanche de vía.	Con documentación de respaldo y coordinación de la OTB.	Tramo de 295m.
DISTRITO 30-S	Calle Vila Vila		Con la coordinación de la OTB, los Propietarios en diferentes tramos y documentación de respaldo.	Tramo de 160m.
DISTRITO 30-N	Machu Juscú de 9,00m.	Limpieza de Vía.	Coordinación con los propietarios.	Tramo de 75m aproximadamente.
DISTRITO 30-N	Ricardo Mujía de 12,50m.	Demolición en un tramo y limpieza.	CON DOCUMENTACION DE RESPALDO y coordinación con los propietario.	Trabajo en coordinación para que el predio entre en rasante para el ensanche de vía.

DISTRITO 30-N	Calle tres de 9,00m.	Demolición y Limpieza.	Con la coordinación de la OTB, los Propietarios en diferentes tramos.	Trabajo en coordinación con los propietarios para el ensanche de Vía. En un tramo de 70m.
DISTRITO 30-S	Calle Siglo XX de 10,00m.	Apertura de vía y limpieza.	CON DOCUMENTACION DE RESPALDO y coordinación con los propietario..	Tramo de 95m.
DISTRITO 30-S	Calle Innominada de 9,00m y Siglo XX de 10,00m.	Ensanche de vía y apertura por tramos.	Con la coordinación de la OTB, los Propietarios en diferentes tramos.	Tramo de 65m.
DISTRITO 30-S	Calle Aguas Calientes de 12,50m.	Apertura de Vía.	CON DOCUMENTACION DE RESPALDO y coordinación con los propietario..	Tramo de 100m.
DISTRITO 29-S	Calle Genciana de 20,00m.	Ensanche de vía y apertura por tramos.	Con la coordinación de la OTB, los Propietarios en diferentes tramos.	1° Tramo de 150m.
DISTRITO 29-S	Calle Genciana de 20,00m.	Ensanche de vía y apertura por tramos.	Con la coordinación de la OTB, los Propietarios en diferentes tramos.	2° Tramo de 230m.
DISTRITO 29-N	Av. Andina de 12,50m.	Ensanche de vía y Limpieza.	Con la coordinación de la OTB, los Propietarios en diferentes tramos.	Tramo de 40m. De este a oeste
DISTRITO 29-N	Calle Innominada	Apertura de Vía.	CON DOCUMENTACION DE RESPALDO.	Tramo de 390m. De este a oeste
DISTRITO 29-N	Calle Innominada	Apertura de Vía.	CON DOCUMENTACION DE RESPALDO y coordinación con los propietario.	Tramo de 525m. De este a oeste
DISTRITO 29-N	Calle Teodosio Imaña	Apertura de Vía.	Con la coordinación de la OTB, los Propietarios en diferentes tramos.	Tramo de 225m. De este a oeste
DISTRITO 29-N	Calle Innominada	Apertura de Vía.	CON DOCUMENTACION DE RESPALDO.	Tramo de 100m. De este a oeste.
DISTRITO 29-N	Av. Alcides Arguedas de 12,50m	Ensanche y Limpieza de vía.	Con la coordinación de la OTB, los Propietarios en diferentes tramos.	Tramo de 200m. De norte a sur.
DISTRITO 29-N	Calle Gustavo Adolfo Otero de 12,50m.	Apertura de Vía.	Con la coordinación de la OTB, los Propietarios en diferentes tramos	Tramo de 80m. De este a oeste.
DISTRITO 29-N	Calle Julio Paz de 12,50m.	Apertura de Vía.	CON DOCUMENTACION DE RESPALDO.	Tramo de 223,5m. De norte a sur.

	DETALLE	TRABAJO EMITIDO	DOCUMENTACION	OBSERVACION
<b>APERTURAS DE VIAS EN PROGRAMACION Y ASIGNACIÓN DE FECHA.</b>	Aperturas de vías en diferentes distritos del municipio		con documentación de respaldo	Vías identificadas para la socialización y programación de maquinaria para la apertura.
<b>HOJAS DE RUTA INGRESADOS</b>	<b>500 HOJAS DE RUTA INGRESADAS</b>		con documentación de respaldo	
<b>HOJAS DE RUTA DE CERTIFICACIONES</b>	<b>388 HOJAS DE RUTA INGRESADAS</b>	<b>258 CETIFICACIONES</b>	con documentación de respaldo	
<b>IDENTIFICACION DE AREAS VERDES PARA SU REGISTRO.</b>	<b>AREAS VERDES EN DIFERENTES DISTRITOS DEL MUNICIPIO</b>	<b>Relevamiento Informes técnicos Búsqueda y emisión de información de documentación</b>	con documentación de respaldo	<b>Trabajos en coordinación con responsables del registro de la Dirección de Asesoría Legal.</b>

## INFORME DE INGRESOS Y ENTREGAS DE TRÁMITES

Informe de ingreso de trámites de fecha 01 de enero del 2017 al 30 de junio del 2017, para la aprobación de planos de; lote, vivienda y otros, de la siguiente manera:

### INGRESO POR MES

MES	Nº CARPETAS INGRESADAS	DEL Nº DE CARPETAS	AL Nº DE CARPETAS
ENERO	80	25419	25537
FEBRERO	55	25540	25625
MARZO	107	25626	25782
ABRIL	83	25784	25903
MAYO	83	25905	26028

### INGRESO TOTAL DE GESTION 2017

SEMESTRE	Nº DE CARPETAS	DEL Nº DE CARPETAS	AL Nº DE CARPETAS
ENERO – MAYO	408	25419	26028

De las carpetas finalizadas y entregadas

### ENTREGAS

MESES	Nº DE ENTREGADOS
ENERO – MAYO	469

De las carpetas finalizadas, por recoger

### POR RECOGER

MESES	Nº DE ENTREGADOS
ENERO – MAYO	33

Informe Semestral Gestión - 2017										
ASESORIA LEGAL										
Tramites	Cantidad						Proyección a 30/06/2017	Total Observados (de la presente gestión y carpetas reactivadas de gestiones pasadas)	Despachados	Total más proyección
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio (de 02/06/17 a 05/06/17)				
Informes Legales	52	73	140	76	109	35	65	43	485	550
RMTA s	60	52	101	83	78	16	74	10	390	464
Hojas de Ruta	03	06	05	04	03	02	03	-	23	26

**JEFATURA DE NORMAS URBANAS Y TOPOGRAFOS**  
**CARPETAS TOTAL RECIBIDAS**

TOTAL	458 CARPETAS
-------	--------------

CARPETAS CON LIQUIDACION DESPACHADAS Y DERIVADAS A VENTANILLA UNICA PARA SU CANCELACION CON INFORMES DE TOPÓGRAFO Y ASESOR LEGAL.

MESES	AÑO	CARPETAS RECIBIDAS
01 DE ENERO AL 05 DE JUNIO	2017	312 CARPETAS
		TOTAL CARPETAS DERIVADAS

**Nº DE CARPETAS OBSERBADAS Y EN CUSTODIA 01 DE ENERO AL 05 DE JUNIO**

MESES	AÑO	Nº DE CARPETA OBSERVADAS
01 DE ENERO AL 05 DE JUNIO		
TOTAL DE Nº CARPETAS OBSERBADAS	2017	126 CARPETAS

Nº  
DE

**CARPETAS PARA ACTUALIZACIONES**

Nº DE CARPETAS RESEPCIONADAS	Nº DE CARPETAS ACTUALIZADAS
20 CARPETAS	20 CARPETAS

**CERTIFICACIONES DE HOJAS DE RUTA DESPACHADAS**

01 DE ENERO AL 05 DE JUNIO	TOTAL DE CERTIFICACIONES DESPACHADAS
	258

**ACTUALIZACION DE INFORMES Y OBSERVACIONES**

Se procedió con la actualización de diferentes carpetas observadas, como ser informes con correcciones y modificaciones, actualizaciones de informes de meses pasados o de años anteriores.

**INFORME DE ACTIVIDADES DE TOPOGRAFOS**

**Trabajo de campo.**- Se obtienen datos técnicos en campo realizando ya sea levantamiento topográfico, o una inspección topográfica.

**Trabajo de gabinete.**- Procesamiento de los datos obtenidos en el campo si se trata de un levantamiento importar los puntos para poder dibujar el trabajo realizado, y si se trata de inspección topográfica se realiza el informe según la inspección realizada.

## TOPOGRAFO

TRAMITES INGRESADOS	<b>276</b>	CARPETAS
TRAMITES DESPACHADOS	210	CARPETAS
TRAMITES PARA REALIZAR INSPECCION	15	CARPETAS
TRAMITES PARA DESPACHAR	10	CARPETAS
TRAMITES OBSERVADOS	41	CARPETAS
HOJAS DE RUTA INGRESADAS	<b>157</b>	H.R.
HOJAS DE RUTA DESPACHADAS	118	H.R.
HOJAS DE RUTA POR DESPACHAR	39	H.R.
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS	<b>18</b>	LEV.
LEVANTAMIENTOS ENTREGADOS	15	LEV.
LEVANTAMIENTOS A ENTREGAR	3	LEV.

## APOYO TOPOGRAFICO

TRAMITES INGRESADOS	<b>132</b>	CARPETAS
TRAMITES DESPACHADOS	103	CARPETAS
TRAMITES PARA REALIZAR INSPECCION	11	CARPETAS
TRAMITES PARA DESPACHAR	10	CARPETAS
TRAMITES OBSERVADOS	8	CARPETAS
HOJAS DE RUTA INGRESADAS	<b>150</b>	H.R.
HOJAS DE RUTA DESPACHADAS	130	H.R.
HOJAS DE RUTA POR DESPACHAR	20	H.R.
APOYO LEV. TOPOGRAFICOS REALIZADOS	<b>18</b>	LEV.

## INFORME DE ARQUITECTO DE URBANISMO

- ✚ Proyectos sectoriales para apertura de vías.
  - Calle Kanaud y José Macedonio Urquidi.
  - Reducto lado Sud.
  - Calle Atocha, Sumumpaya Calamina.
  - Calle entres Aserradero Macoró y Longines.
  - Continuación de Calle Gerónimo de Osorio.
  - Propuesta para Froilán Zamorano en Av. Reducto casi D'orbigni.
  - Av. Chijllawiri, cesión de Vigor.
- ✚ Seguimiento de trámites y en los acuerdos con vecinos de calles para apertura.
- ✚ Seguimiento, relevamientos, apoyo fotográfico, coordinación con los demás funcionarios para adjuntar sus informes, elaboración de informe Técnico y derivación para el registro de áreas verdes a favor del Municipio de Colcapirhua.
  - Urbanización Grace.
  - Urbanización San Cayetano.
  - Urbanización Capacachi – de Propiedad de Coop. De Vivienda Capacachi Ltda.
  - Urbanización 21 de septiembre.
  - Área Verde Holanda.
  - Atención de un Área Verde en Sumumpaya Ferroviario Sud.



- ✚ Recolección de planos de Regularizaciones, Divisiones y Cesión para la elaboración de una Base de datos de Áreas Verdes.
- ✚ Seguimiento y asesoramiento Técnico a las carpetas de los vecinos en Zona Limítrofe.
- ✚ Seguimiento y elaboración de proyectos en beneficio del Municipio de Colcapirhua para apertura de vías y proyectos habitacionales que prescindan de expropiaciones.

## **INFORME DEL AREA DE ARCHIVOS**

La unidad de archivos Urbanismo, se encarga de la recepción, el resguardo, codificación y posterior archivo de la siguiente documentación: Cambio de Nombre, Inscripción Catastral, Visación de Minuta, los cuales se clasifican y se ordenan de acuerdo al distrito, manzana y lote. En cuanto a los planos aprobados (lote, vivienda, verja, propiedad horizontal, urbanizaciones, fraccionamientos, entre otros), se los archiva por correlatividad (del 1 al 100).

De igual manera en archivos generales se: recepciona, resguarda, ordena y archiva la documentación empastada de las diferentes unidades del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, clasificándolas por año y tipo de documentación como ser: impuestos anuales de bienes inmuebles, comprobantes de pago al tesoro municipal, comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, proyectos/invitaciones directas/excepciones/licitaciones de proyectos entre otros.

Indicarle también que la función que se realiza en esta unidad es de:

- Legalización de planos.
- Búsqueda de carpetas de aprobación de planos e impuestos anuales, comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, comprobantes de pago, impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, y proyectos entre otros.
- Recepcionar, codificar, ordenar y resguardar la documentación por correlatividad y código catastral.
- Recepción y despacho de Hojas de Ruta.


Informe a su persona que hasta la fecha se recibió la siguiente documentación:

- 587 trámites de Aprobación de planos de lote y/o construcción.
- 280 proyectos y/o adquisiciones de la gestión 2015.
- 24 empastados de impuesto a las transferencias de inmuebles de la gestión 2015.
- 11 empastados de impuesto a las transferencias de inmuebles de la gestión 2016.

### **TRAMITES REALIZADAS EN LA JEFATURA DE CATASTRO**

TRAMITE	CANTIDAD
VISACIONES DE MINUTA DE TRANSFERENCIA	581
CARPETAS OBSERVADAS	20
VISACION DE MINUTAS DE CESION	32
HOJAS DE RUTA	75
ACTUALIZACION DE SELLOS CATASTRALES	8
ATENCION AL CONTRIBUYENTE	184


**Total tramites recepcionadas y atendidas 01 de enero del 2017 al 30 junio del 2017= 716**



**ASESORIA LEGAL DE CATASTRO:**

En esta Área se realiza toda la verificación Legal que Ingresa a la Unidad de Catastro es decir Tramites de Visaciones de Minuta, Cambios de Nombre e Inscripción Catastral Y Legalizaciones coordinaciones con el Director de Urbanismo

**Total tramites recepcionadas y atendidas 01 de Enero del 2017 al 30 de Junio del 2017= 1440**




**SISTEMAS GRAFICOS I y II:**

En esta área se realizan las Siguietes Funciones: Manipulación del Sistema SIGM, Registro de Inscripciones Catastrales, Registro de Cambio de Nombre, Graficacion de Predios, Actualización de Predios de Acuerdo a Inspección, Atención al Contribuyente, Codificación de Predios, Seguimiento a Predios con proceso de Fiscalización, Insertando multas por Omisión y Actualizando según Balances presentados.


TRAMITE	CANTIDAD
INSCRIPCION CATASTRAL	326
CAMBIO DE NOMBRE	257
HOJAS DE RUTA	102
ATENCION AL CONTRIBUYENTE	438
REGISTROS CATASTRALES AREAS VERDES	22
CARPETAS OBSERVADAS	47
APOYO A PROCESOS FISCALIZACION	30

Total tramites recepcionadas y atendidas 01 de enero del 2017 al 30 junio del 2017= 754



**INSPECTOR DE CATASTRO:**

Las Actividades que desarrolla la Inspectora de Catastro son: Registro y Actualización de datos en el Sistema Informático Catastral, Apoyo a Inspecciones de la Unidad de Fiscalización y presentación de Informes, Atención al Contribuyente, Además del Apoyo a la Codificación de las Carpetas en la jefatura de Catastro para su posterior Archivo.




INSPECCIONES CATASTRALES	INSPECCIONES FISCALIZACION	ATENCION AL CONTRIBUYENTE
126	28	406

**TOTAL TRAMITES EN JEFATURA DE CATASTRO  
01 DE ENERO 2017 – 30 DE JUNIO 2017**

TIPO DE TRAMITE	TOTAL
VISACION DE MINUTA	581
INSCRIPCION CATASTRAL	326
CAMBIO DE NOMBRE REGISTRO CATASTRAL	257
REGISTRO CATASTRAL AREAS VERDES	22

ATENCION AL CONTRIBUYENTE	1028
VISACION MINUTAS DE CESION	32
ACTUALIZACION DE SELLOS CATASTRALES	8
HOJAS DE RUTAS	177
APOYO A PROCESOS DE FISCALIZACION	30
INSPECCION A PREDIOS EN PROCESO DE FISCALIZACION	28
CARPETAS EN CUSTODIA	8
CARPETAS OBSERVADAS	67
INSPECCIONES CATASTRO	126
TOTALES TRAMITES	1662

**TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS EN JEFATURA  
DE CATASTRO 01 DE ENERO DE 2017 - 30 DE  
JUNIO DE 2017**

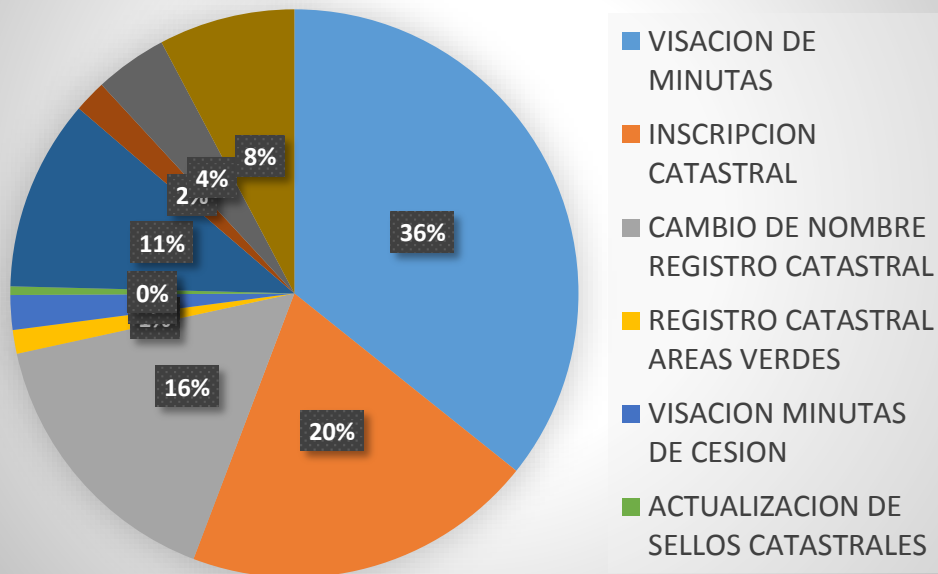

### III.3.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

**Ing. Fredy Aguilar**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO**

#### **COLCAPIRHUA EN ARMONÍA CON LA MADRE TIERRA – MEDIO AMBIENTE, ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGO**

EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA de MEJORAMIENTO **SISTEMA DE RIEGO REDUCTO MOYAPAMPA (COLCAPIRHUA)** está en ejecución por parte de la Dirección de Desarrollo Productivo se está haciendo el **acompañamiento del proyecto**, tiene la siguiente estructura de cofinanciamiento.

<b>PROGRAMA</b>	<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>TOTAL DE CONTRAPARTE E GN/MMAyA (Bs.)</b>	<b>TOTAL DE CONTRAPARTE GAD (Bs.)</b>	<b>TOTAL CONTRAPARTE GAM C. (Bs.)</b>	<b>TOTAL Bs.</b>
PRONAREC 2 MIRIE	MEJ. SIST. DE RIEGO REDUCTO MOYAPAMPA (COLCAPIRHUA)	2.048.034,68	292.576,39	585.152,77	2.925.763,83

Empresa Contratista	: SIKU S.R.L.
Número de Contrato	: C- FPS -03-003881
Fecha de suscripción de contrato	: 5 de agosto de 2016
Monto original de contrato	: Bs. 2.212.567,04
Plazo original de construcción	: 240 días calendario
Plazo final de construcción	: 330 días calendario
% Avance físico de la obra	: 75 (% acumulado)
% Avance financiero de la obra	: 75 (% acumulado)
Tiempo transcurrido	: 200 días calendario

A la fecha del presente informe, se tiene el siguiente progreso de avance: 4500 m.

#### **EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO HIDRÁULICO DEL RÍO ROCHA DESDE EL PUENTE KENAMARI HASTA LA CONFLUENCIA RÍO ROCHA - CHIJLLAWIRI”**

#### **EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

##### **1. DATOS DEL CONTRATO**

N° Licitación o Invitación	: LP N° 01/2016
Empresa Contratista	: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA UGARTE RODRIGUEZ
Número de Contrato	: SDC 10/2016
Fecha de suscripción de contrato	: 25 de agosto de 2016
NIT. de la Empresa Contratista	: 4451430015

ITEMS	PERIOD O 1	PERIOD O 2	PERIOD O 3	PERIOD O 4	PERIOD O 5	PERIOD O 6	PERIOD O 7	TOTAL
INSTALACION DE FAENAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	28,44%	21,33%	18,96%	0,00%	17,54%	0,00%	0,00%	86,26%
LIMPIEZA Y DESBROCE	28,44%	21,33%	18,96%	3,29%	14,25%	0,00%	0,00%	86,26%
EXCAVACION CON MAQUINARIA Y AGOTAMIENTO	30,80%	23,35%	17,67%	0,00%	16,96%	0,00%	0,00%	88,78%
EXCAVACION EN ROCA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RELLENO Y COMPACTADO	6,61%	19,61%	14,04%	0,00%	27,85%	0,00%	0,00%	68,12%
CONFORMACION DE PLATAFORMA CON RIPIO	0,00%	6,84%	0,24%	9,44%	0,00%	38,43%	27,08%	82,03%
LIMPEZA GENERAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL	17,61%	18,24%	13,00%	1,15%	16,73%	4,60%	3,24%	74,57%

Monto original de contrato : Bs. 10.967.953.35  
 Plazo original de construcción : 330 días calendario  
 Plazo final de construcción : 330 días calendario  
 % Avance físico de la obra : 74,57 (% acumulado)  
 % Avance financiero de la obra : 77,63 (% acumulado)  
 Tiempo transcurrido : 200 días calendario  
 A la fecha del presente informe, se tiene el siguiente progreso de avance: 3600 m.

#### **ENTREGA DE PROYECTOS LA UNIDAD DE CONCERTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS (UCEP) PARA SU FINANCIAMIENTO**

- Proyecto a diseño final Mejoramiento de Riego Distrito A Canal Colque Mayu
- Proyecto Construcción Canal de Riego Supay Calle Tramo II Distrito E
- **Proyecto Construcción Sistema de Riego por Aspersión (3 pozos profundos) Sindicato Siagro Sumumpaya y (3 pozos profundos) Sindicato Agrario Esquilan Colcapirhua.**

#### **ENTREGA DE ITCPs. (FIV) LA UNIDAD DE CONCERTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS (UCEP) PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN**

- Sistema de riego tecnificado Pozo de riego Esquilan
- Sistema de riego tecnificado Pozo de riego Chijllawiri
- Sistema de riego tecnificado Pozo de riego Don Bosco

- Sistema de riego tecnificado Pozo de riego Sumumpaya Kullcu
- Sistema de riego tecnificado Laguna Ceramil

### **SISTEMAS DE RIEGO**

- Se llevó a cabo la inspección de validación de estos proyectos para proceder a la elaboración de proyectos de preinversión.
- Elaboración de los Términos de Referencia, ITCPs para la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión de los proyectos de:

- 1.- Perforación de pozo profundo para riego Reducto
- 2.- Perforación de pozo profundo Capacachi Norte
- 3.- Perforación de pozo profundo Cielo Mokho

- Inspección de áreas agrícolas con una comisión de financiadores de aguas de Misicuni (Francia, JICA y la Gobernación de Cbba).

### **ENTREGA INFORME TÉCNICO CONDICIONES PREVIAS ITCPs AL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA:**

1. RECUPERACIÓN DE SUELOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PLANTA DE COMPOSTAJE SINDICATO AGRARIO ESQUILAN.
2. IMPLEMENTACIÓN DE ESTABLOS LECHEROS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN LECHERA DEL SINDICATO AGRARIO QUENAMARI KULLCU Y SINDICATO AGRARIO CIELO MOCKO.
3. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TINKU MAYU - PUNTE SUMUMPAYA KULLCU (ROCHA).

El cual fue elaborado de acuerdo a la Guía de Formato y Contenidos de Proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena.

### **ELABORACION PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA PANADERIA MUNICIPAL**


**ENCARGADO DE ATENCION AGROPECURIA**  
**Dra. Claudia Pereira**

### **OBJETIVO DEL ÁREA DE SANIDAD ANIMAL:**

Prevenir y controlar la sanidad animal, Mejorando y Fortaleciendo la Sanidad Animal a través de programas de prevención y control de enfermedades Zoonoticas, Infecciosas, Parasitarias y Carenciales que afectan la producción, reproducción y subsistencia de los animales económicamente productivos.

### 1.- PRIMERA CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN Y VITAMINIZACIÓN PARA TODAS LAS ESPECIES EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA:

Se realizó la primera campaña de vitaminización y desparasitación para todas las especies.



### 2.- PRIMERA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA BRUCELOSIS A TERNERAS HEMBRAS DE 3 A 7 MESES DE EDAD EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA:


Se realizó la primera campaña de vacunación contra Brucelosis a terneras hembras de 3 a 7 meses de edad según cronograma de actividades enviado por el SENASAG; donde se intervino en 11 OTBs, inmunizando a 161 bovinos (terneras) y beneficiando a 91 familias.



### 3.- PRIMERA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA NEWCASTLE A AVES DE TRASPATIO (CRIANZA FAMILIAR) EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA:


Se realizó la Primera Campaña de Vacunación contra Newcastle a aves de traspatio de acuerdo al cronograma de actividades enviado por el PRONESA (SENASAG); donde se intervino en 19 OTBs llegando a inmunizar 19.530 aves de traspatio (crianza familiar) en alimento (t'iki), beneficiando a 385 familias.







#### 4.- PRIMERA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AFTOSA A BOVINOS EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA:

Se realizó la primera campaña de vacunación contra Fiebre Aftosa para todos los bovinos de las diferentes edades en 19 comunidades, inmunizando a 3.050 bovinos, beneficiando a 177 familias del municipio.



#### 5.- CENSO DE PRODUCTORES LECHEROS DE LOS DISTRITOS “E” Y “A” EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA:

Se realizó un censo de todos los productores lecheros de todo el Distrito "E", beneficiando a 7 comunidades con 164 productores lecheros y parte del Distrito "A" beneficiando a 4 comunidades con 72 productores lecheros. **TOTAL GANADO BOVINO 5042**



#### CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN Y VITAMINIZACIÓN EN BOVINOS:

La Jefatura de Medio Ambiente, dependiente de la Dirección de Desarrollo Productivo del Municipio de Colcapirhua, ha ido organizándose de apoco, desde que habido cambios de personal a principios de la gestión, hasta hace un mes atrás, que se completó con el personal de un total de cinco (6) personas profesionales.

### III.3.1 JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE

**Ing. Ciro Bascope.**  
**JEFE DE MEDIO AMBIENTE**

#### 1. ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN NORMATIVA AMBIENTAL

La jefatura de Medio Ambiente, realiza sus actividades en marco de las ley 1333, de la misma manera las actividades de las unidades industriales que hayan presentado Registro Ambiental Industrial y hayan obtenido categoría 4 no necesitan presentar ningún otro documento ambiental de acuerdo al Artículo 23 del Reglamento Ambiental de Sector Industrial Manufacturero (RASIM). Sin embargo debe someterse al cumplimiento del TITULO IV del RASIM e inspecciones con el fin de la obtención de la licencia de Funcionamiento.

Para lograr el cumplimiento de la normativa Ambiental en actual vigencia, la jefatura de Medio Ambiente, realiza inspecciones a denuncias o de oficio a las empresas industriales, solicitud de poda de árboles, programación de quema a las ladrilleras.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE

##### **Informe Actividades Desarrolladas:**

- 1) Elaboración del Primer Acta de Entendimiento para la Adecuación Ambiental del sector ladrillero firmado entre las Asociaciones de Ladrilleros, Municipio de Colcapirhua y Gobernación de Cochabamba.
- 2) Firma del Acta de Compromiso entre las Asociaciones de Ladrilleros y la Jefatura de Medio Ambiente para no realizar la quema de ladrillo por el periodo de tiempo del 5 de Junio al 5 de Julio del 2017.  
Firma del Acta de Compromiso entre los Asociados Yeseros y la Jefatura de Medio Ambiente para no realizar la quema de yeso por el periodo de tiempo del 21 de Junio al 27 de Junio del 2017.
- 3) Reuniones de coordinación con Y.P.F.B. Redes de Gas Cochabamba para solicitar capacitaciones y cambio de matriz energética de leña a gas de los hornos productores artesanales.
- 4) Elaboración, pulido y formalización de la lista de asociados ladrilleros establecidos en el Municipio de Colcapirhua que contiene: nombre y apellido, cantidad de hornos y estado de los hornos y terrenos para construir hornos.
- 5) Levantamiento de coordenadas U.T.M. de cada uno de las unidades industriales construidas y de los terrenos para construcción de hornos. Transcripción de la información y elaboración de 3 mapas.
- 6) Realización de inspecciones de seguimiento, denuncia y por oficio a las AOP's e Industrias establecidas en el Municipio de Colcapirhua, posterior redacción del Acta de Inspección y elaboración del Informe Técnico.
- 7) Revisión de 14 IRAP's (Instrumentos de Regulación de Alcance Particulares) y elaboración del respectivo Informe Técnico o Carta con Observaciones: M. A. "Edificio Multifamiliar San José", R.A.I. "Engersteel S.R.L.", F.A. "INDABOL S.R.L.", R.A.I. Planta de Alimento Balanceado A.P.L., R.A.I. Planta de Envases de Plásticos PIL ANDINA S.A., R.A.I. "REFRAK", R.A.I. "Muebles Tupiza", R.A.I. "Elaboración de Hipoclorito de Sodio Rufino

- Rubén Magne Ticona”, M.A. “Restaurant y Peñas Folkloricas El Mariachi”, F.A. “Almacenes ASTRIX S.A.”, M.A. “Limpieza La Moderna”, I.A.A. “Cristembo”, I.A.A. “Soboce” e I.A.A. “Odin”.
- 8) Elaboración de 4 Resoluciones Administrativas para otorgación de Licencias Ambientales: “Muebles Tupiza”, “Elaboración de Hipoclorito de Sodio Rufino Rubén Magne Ticona”, “Planta de Alimento Balanceado A.P.L.” y “Planta de Envases de Plásticos PIL ANDINA S.A.”
  - 9) Convocatoria a reuniones de trabajo y concertación entre dependencias de la Alcaldía de Colcapirhua y grupos de interés como: Asociaciones de Ladrilleros, Socios Yeseros, entre otros.
  - 10) Realización de 3 capacitaciones en temáticas vinculantes con contaminación atmosférica como: Ley N° 535 de Minería y Metalurgia (26 de Enero del 2017), Cambio de Matriz Energética (7 de Marzo del 2017), Uso de maquinaria eficiente para producción de yeso (16 de Mayo del 2017)
  - 11) Participación en actividades complementarias a la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente como: Feria de la Leche, Reforestación del Río Rocha, Apoyo Logístico en fiesta de San Isidro.

**Arq. Santos Yugar Porco**  
**ENCARGADO DE CONTAMINACION SUELOS E HIDRICA**

El encargado de contaminación Suelos e Hídrica es un cargo dependiente de la Jefatura de Medio Ambiente que pertenece a la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente del Municipio de Colcapirhua y tiene la finalidad de responder a las 11 Recomendaciones de la Contraloría General del Estado, en respuesta a la Auditoría Ambiental del río Rocha K2/AP06/M11.

El trabajo encomendado está concentrado a AOP’s de las empresas industriales que tienen descargas líquidas directas o indirectas que tienen su incidencia al río Rocha, y otras que tienen incidencia sobre la contaminación de suelos de las diferentes actividades industriales.

**REVISIÓN DE DOCUMENTOS AMBIENTALES**

Manifiesto Ambiental MASIVOS R&A IMPORTACIONES S.r.l.  
 Renovación RAI Recicladora Vidrio Tunari S.r.l.  
 Manifiesto Ambiental QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DE BOLIVIA S.A.  
 Plan de Manejo Ambiental ELABORACION DE HIPOCLORITO DE SODIO RUFINO RUBEN NAGNE TICONA.  
 Almacenes ATRIX S.A.  
 ACEROS MAMANI FLORES S.R.L.  
 MANIFIESTO AMBIENTLA QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DE BOLIVIA S.A.  
 Informe Ambiental Anual-Yesería PAHUASI  
 Informe Ambiental Anual-Yesería JOSE MAMANI  
 Informe Ambiental Anual-Yesería SIXTO MAMANI  
 Informe Ambiental Anual-TECNOPOR S.A.  
 Informe Ambiental Anual-MOTEL NIGHT DAY  
 Informe Ambiental Anual-PIL ANDINA S.A.  
 Informe Ambiental Anual-REFRACTARIOS NACIONALES – REFRAK.  
 Informe Ambiental Anual-MERALCI S.A.  
 Informe Ambiental Anual-INVERSIONES SUCRE S.A.PLANTA COLCAPIRHUA.

Informe Ambiental Anual-PAPELES & CARTONES MODA LTDA.  
Informe Ambiental Anual-PROTEX S.R.L.  
Informe Ambiental Anual-INDUSTRIA FARMACEUTICA BOLIVIANA IFARBO LTDA.  
Informe Ambiental Anual-INDUSTRIAL INDUQUIN  
Informe Ambiental Anual-ASTRIX S.A.  
Informe Ambiental Anual-PHARMAVET

**INSPECCIONES MOTELES**

MOTEL MI ESTANCIA  
MOTEL TEXAS CLUB ACTUAL (DALLAS)  
MOTEL INFINITUM:  
MOTEL O.KEY  
MOTEL TANTRA  
MOTEL STOP TIME  
MOTEL ROMA  
MOTEL DREAMS  
MOTEL HAPPY  
MOTEL EROS  
MOTEL NIGHTDAY  
MOTEL TEXAS CLUB ACTUAL (DALLAS)

**RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS RAI-PMA**

ACEROS MAMNI FLORES S.R.L. RENOVACION RAI ELABORACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO RUFINO RUBÉN MAGNE TICONA APROBACIÓN (PMA).

Remisión Informe Solicitado de la Contraloría General del Estado Sobre el Cumplimiento de Las Recomendaciones **R12, R21, R22, R42, Y R44** de la Auditoria Ambiental K2/AP06/M11

ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA RIO ROCHA eje Metropolitano 2017 08/05/2017 En cumplimiento a la Recomendación 43 del Informe del rio Rocha K2/AP06/M11 Conmemorando el día Mundial del Medio Ambiente, programa de trabajo coordinado con la Gobernación Reuniones realizadas con las OTB's para coordinar en el Registro de las empresas industriales 30/05/2017

CAMPAÑA DE LIMPIEZA RIO ROCHA realizado el 05 de junio 2017 personal de la Dirección de Desarrollo Productivo – Medio Ambiente y la Gobernación.

**Ing. Cinda Veizaga Escobar.**

**ENCARGADA DE SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO E INSTRUMENTOS DE ALCANCE PARTICULAR**

**ENCARGADA SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO E INSTRUMENTOS DE ALCANCE PARTICULAR**

En cumplimiento al Art. 25 de la Ley 1333 de Medio Ambiente, Arts. 53, 97 del Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA), Arts. 21, 40 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) y Arts. 21, 23, 56 y 59 del Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero (RASIM), la presente área perteneciente a la Jefatura de Medio Ambiente elabora los documentos de los proyectos

municipales a ejecutarse en la jurisdicción del Municipio de Colcapirhua. Los logros son observables en la Tabla 1.

Nº	PROYECTO	TIPO DE DOCUMENTO
1	Construcción empedrado Calle Tawantinsuyo O.T.B. Villa Rosedal Dios es Amor	Ficha Ambiental
2	Construcción pavimento Calles Los Paraísos – Pulacayo O.T.B. California	
3	Construcción empedrado Calle Ricardo Mujica O.T.B. San Francisco	
4	Construcción empedrado de vías Kenamari Kullku	
5	Construcción empedrado Collpapampa	
6	Construcción pavimento flexible Av. Franz Tamayo (Conformación de plataforma)	
7	Construcción pavimento Calles Los Ceibos O.T.B. La Pradera Distrito B	
8	Construcción pavimento de vías O.T.B. San Silvestre Distrito D	
9	Construcción pavimento J. Bautista O.T.B.'s Santa Isabel – Morococala Distrito B	
10	Construcción canalización desagüe pluvial O.T.B. Distrito D	
11	Construcción pavimento rígido O.T.B. 23 de marzo Distrito A	
12	Construcción pavimento rígido Av. Ángulo O.T.B. Sumumpaya Chico Distrito E	
13	Construcción muro de contención Rummy Mayu lado oeste San Alfonso Distrito B	Solicitud de Certificado de Dispensación – SCD
14	Construcción empedrado vías laterales Av. Blanco Galindo Colcapirhua	Ficha Ambiental
15	Construcción prado y pasaje peatonal Colcapirhua	
16	Construcción v. Daniel Salamanca Distrito A, D	
17	Construcción revestimiento Río Pampa Mayu Distrito E Fase IV	
18	Construcción CIDEM – Centro Integral de la Mujer	
19	Construcción Casa de Concertación Social y Comunitaria Colcapirhua	
20	Construcción pavimento Av. de Vías O.T.B. Fabril Capacachi	
21	Construcción pavimento Av. Comercio Distrito B	
22	Construcción desagüe pluvial sector Aduana Distrito C	
23	Construcción pavimento Calle 27 de Julio O.T.B. Morococala Distrito B	
24	Construcción pavimento flexible Av. Tomás O'Connor Distrito B, C	
25	Construcción pavimento Calle 27 de Abril O.T.B. Elizabeth Seton Distrito B	

26	Construcción empedrado Calle Tawantinsuyo O.T.B. Villa Rosedal Dios es Amor	Informe Ambiental Anual Gestión 2016
27	Construcción pavimento Av. Bolivia	
28	Matadero Municipal de Colcapirhua	
29	Planta de Hormigón Municipal	

**Ing. Daniel Paniagua R.**  
**ENCARGADO DE PRODUCCION AGRÍCOLA**

Colcapirhua se encuentra en la Cordillera Oriental; el tipo de clima es de valle, con alturas entre 2.545 a 2.736 m.s.n.m. presenta un relieve uniformemente plano, con ligeras depresiones y serranías ubicadas al sur del Municipio, conformando llanuras de pie de monte en el sector Norte y las llanuras aluviales del Río Rocha en el sector Sur, y una unidad que corresponde a las colinas de Kenamari ubicadas en el extremo Sur del Municipio.

La temperatura media anual es de 16.9°C, la mínima en invierno es de 8°C y la máxima en verano es de 27 °C. La precipitación anual va desde los 200 mm, hasta arriba de los 800mm. La Zonificación Agro-Ecológica muestra sus potencialidades y limitantes de sus recursos naturales.

ZONIFICACIÓN	SUPERFICIE EN KM2	PORCENTAJE TOTAL
Área Urbana Consolidada	10,091	31,5
Área Urbana Extensiva o de expansión	7,902	24,6
Área de transición rural – urbano.	0,701	2,2
Agricultura Intensiva –Extensiva	9,555	29,8
Ganadería.	3,773	11,7
<b>Total, Superficie</b>	<b>32.022</b>	<b>100%</b>

El 29.8% del territorio de Colcapirhua está dedicada a la agricultura, con cultivos anuales como maíz, forrajes (alfalfa, pasto), haba, hortalizas, existe también algunas plantas frutales como, ciruelo, manzana, uva y otros.

**1.- Agricultura Urbana Periurbana.-**

- Se ha procedido con la firma de la carta de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación.
- Se ha firmado el convenio intergubernativo para el fortalecimiento de capacidades del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en la ejecución del Programa Nacional de Agricultura Urbana Periurbana.

**TRABAJOS REALIZADOS EN AGRICULTURA URBANA PERIURBANA (VIVERO MUNICIPAL)**

1 pila de compost de 2.5 x 6 mtrs. Con restos orgánicos del mercado	Cultivo de hortalizas en botellas pet (cebolla, lechuga, cebollín, pimentón)	Cultivo de hortalizas a campo abierto y bajo invernadero, (Tomate, repollo, pimentón)
---	--	---

- Reuniones, talleres y socialización del proyecto de AUP
- Inspecciones a Unidades Educativas Sausalito, Max Fernández, Simón Bolívar y Don Bosco, Adulto Mayor San José de Kami para la implementación de huertos familiares.
- Preparación del área de construcción del Centro Demostrativo de Capacitación Colcapirhua. Que será utilizado para la capacitación e inducción a la práctica de la agricultura urbana y periurbana. Con una superficie de: 140 m2 bajo invernadero, 300 m2 a campo abierto, 6 m2 material reciclado **TOTAL = 446 M2.** situado en el Vivero Municipal.

ACTIVIDAD	PREUPUESTO Bs	SOLICITADO
Agricultura Urbana Periurbana Colcapirhua	0,00	157.000,00

## 2.- Visitas de intercambio de conocimientos de productores agrícolas.

Con la finalidad de ampliar sus conocimientos e intercambiar experiencias, se ha coordinado con productores de diferentes sectores para la realización de visitas de intercambio con recursos de los beneficiarios.

### III.3.2 JEFATURA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS G.I.R.S

**Ing. Juan Carlos Fernández.**  
**JEFE DE G.I.R.S**

#### ACTIVIDADES EJECUTADAS

Una de las actividades que se viene ejecutando de manera permanente es la referida a la limpieza de vías, principalmente en aquellos puntos considerados como micro basurales, donde la gente se ha mal acostumbrado a disponer sus residuos sólidos, pese a tener el servicio en una frecuencia de recojo de dos veces por semana.

Limpieza de puntos de disposición de RRSS de vía pública (reducción de micro basurales).

#### DEL PAGO AL MINISTERIO DE DEFENSA POR EL USO DE SUELO


El Comando General de Ejército a través del Ministerio de Defensa nos permite el uso de suelo del lugar donde tenemos emplazado el Botadero Municipal, a través de un Convenio Interinstitucional, que gracias a las gestiones realizadas se ha logrado firmar el acuerdo por el lapso de 4 años, del 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del 2020. Cabe mencionar que por 4 hectáreas de terreno se paga según convenio 12.5000 Bs./mes.




## INFORME PRESUPUESTARIO

APERTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTADO	CERTIFICADO	EJECUTADO	% de Ejecución
14-0000-001	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA COLCAPIRHUA	550.000,00	454.463,03	133.457,88	24,27 %
14-0000-002	MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO COLCAPIRHUA	1.000.000,00	848.988,03	276.917,88	27,69 %
<b>TOTAL</b>		<b>1.550.000,00</b>			

## INGRESOS POR PAGO POR SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS



Fuente: Jefatura de Ingresos G.A.M. Colcapirhua



Fuente: Jefatura de Ingresos G.A.M. Colcapirhua

## ENCARGADO DE PARQUES Y JARDINES

Ing. Ruddy Valverde

### 1.- ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó el mantenimiento del 88% de las áreas de parques y jardines en el tema de mantenimiento de áreas verdes, aceras centrales de avenidas y parques y jardines (deshierbe y desbroce de malezas y corte de césped) Se consta con un cronograma de intervención de mantenimiento unidades educativas.

- Mantenimiento permanente de Hospitales y Postas del Municipio.
- Mantenimiento de Cementerio general de Colcapirhua.
- Se inició el mantenimiento progresivo de áreas sostenibles mejoradas, plaza 15 de abril, acera central Dorbinig, Víctor Ustariz, Plaza de Capacachi.
- Poda de árboles de áreas de competencia municipal para resguardo de transeúntes y Vehículos.
- Pintado de bancas de plaza 15 de Abril, Plaza de estadium de Kami, Plaza SENAC, Juegos Sumunpaya sud.
- Riego de plantación forestal del rio Rocha.
- Entrego Propuesta de perfil de proyecto de mejoramiento de rotonda de mercado Colcapirhua elaborada por Parques y Jardines 2017.
- Recojo y limpieza en menos de 48 horas de áreas intervenidas. Y Transporte a compostera.

### SERVICIOS MANUALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA

Los trabajos que se realizaron fueron los siguientes:

ACTIVIDADES REALIZADAS	COMUNIDADES
TRABAJO DE LIMPIEZA	Hospital Cuschieri
	Hospital Canadá
	Av. Blanco Galindo Sectores Reducto hasta el mercado Central.
	OTB Florida Norte
RECOLECCIÓN DE BASURA Y RESIDUOS	Mercado Central de Colcapirhua.
	U.E. Daniel Salamanca.
CORTE DE MALEZA, CORTE DE PASTO Y RECOJO DE BASURA	Cementerio General de Colcapirhua.
	Av. Cap. Víctor Ustaris.
	Sumumpaya Sud
	OTB Bartos (zona Central)
	OTB Jazmín
	OTB San Francisco y OTB Paraíso.
	OTB Libertador Bolívar
	OTB 21 de Enero.
OTB 23 de marzo.	

**SERVICIOS MANUALES DE LIMPIEZA DE CANALES Y DESBROCE DE TORRETERAS DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA**

Los trabajos que se realizaron fueron los siguientes:

ACTIVIDADES REALIZADAS	COMUNIDADES Otbs.
LIMPIEZA DE CANAL	Reducto
	Bartos coña coña
	Florida norte
	Villa San Alfonso
	Casco viejo
	Piñami Sur
	Coña Coña norte
	Challacaba
	Av. Sexta
	California
	Sumumpaya Norte
	Libertador Bolívar.
DESBROCE	San José Kamy
	Holanda
	Capacachi Central
	Comercio Cochabamba
	Villa Rosedal
	Moyapampa
	Kami

**SERVICIOS MANUALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA**

Los trabajos que realizaron en el mes de febrero fueron los siguientes:

ACTIVIDADES REALIZADAS	COMUNIDADES Otbs.
CORTE DE PASTO, DESYERBADO DE MALEZA Y RETIRO DE HOJAS CON RASTRILLO	Casco viejo,
	Mercado Central de Colcapirhua.
	Plaza Central de Kami.
	Hospital Canadá
	Cementerio General de Colcapirhua.
	plazuela Urbanización La Paz
	Santa Rosa de Huanuni

	Urbanización La Paz
	Barrio Magisterio (Mercado).
	Comercio Cochabamba
	Efec y Cucardas
	San Lorenzo
	Barrio Fabril

### SERVICIOS MANUALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA.

ACTIVIDADES REALIZADAS	COMUNIDADES
TRABAJO DE LIMPIEZA	Av. Blanco Galindo desde Mercado central hasta rotonda Reducto. Calle Aroma, OTB Colcapirhua Central, desde Colegio 27 de Mayo hasta
	Hospital Andres Cuschieri.
	Av. Reducto desde Av. D'orbigni hasta Av. Blanco Galindo.
	Canchas de Loronkocha .
	OTB Sausalito con apoyo de pala y volqueta.
	Av. Blanco Galindo desde surtidor Las Islas hasta mercado Central. Av. Ustariz y Blanco Galindo desde rotonda Reducto hasta Supay Calle.
	Unidad Educativa Ferroviario y 6 de Agosto.
	Recojo de residuos orgánicos del Matadero, OTB Canada y OTB Capacachi Central.
	U.E. Daniel Salamanca.
RECOLECCIÓN DE BASURA Y RESIDUOS	Recojo de residuos orgánicos del Matadero, OTB Canada y OTB Capacachi Central. Mercado Central de Colcapirhua. Cementerio General de Colcapirhua.
	Av. Cap. Víctor Ustariz. Sumumpaya Sud
CORTE DE MALEZA, CORTE DE PASTO Y RECOJO DE BASURA	OTB Bartos (zona Central)
	OTB Jazmín
	OTB San Francisco y OTB Paraíso.
	OTB Libertador Bolívar
	OTB 21 de Enero.
	OTB 23 de Marzo.
	OTB Colcapirhua Central
	OTB Ferroviario

ACTIVIDADES REALIZADAS	COMUNIDADES OTBs.
LIMPIEZA DE CANAL	Reducto
	Bartos coña coña
	Florida norte
	Casco viejo, OTB Central
	Piñami Sud
	Coña Coña, canal Rumi Mayu
	Challacaba
	California
	Sumumpaya Norte
	Libertador Bolívar.
	San José Kami
	Sausalito
	Holanda
	Capacachi Central
DESBROCE	Comercio Cochabamba
	Villa Rosedal
	Moyapampa
	San Jose Kami
	Canal J
	Canal Valverde

**SERVICIOS MANUALES DE LIMPIEZA DE CANALES Y DESBROCE DE TORRENTERAS DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA**

**SERVICIOS MANUALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA**

ACTIVIDADES REALIZADAS	COMUNIDADES OTBs.
CORTE DE PASTO, DESHIERBADO DE MALEZA Y RETIRO DE HOJAS CON RASTRILLO	OTB Jardín I, II y III
	Mercado Central de Colcapirhua.
	Plaza Central de Colcapirhua.
	Hospital de Hemodiálisis.
	Cementerio General de Colcapirhua.
	OTB Comercio Cochabamba.
	Santa Rosa de Huanuni
	Urbanización La Paz
	Barrio Magisterio (Mercado).
	Morococala
	OTB Capacachi
	San José Kami
	Barrio Fabril

## EJECUCION FINANCIERA

Ejecución física financiera según SIGEP a la fecha.

Categoría programática	Presupuesto total	Preventivo	Pagado	Saldo Devengado	Ejecución en %
13 0000 001 MANTENIMIENTO ORNAMENTO EQUIPAMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES	380.000	269.648,99	173.680,92	206.319.08	45,71 %
13 0000 004 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES Y AREAS VERDES	150.000	134.500	56.700,65	93.299.35	37,80%

### EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE COSTURA MUNICIPAL

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	UNITARIO	TOTAL
1	4	pieza	Maquina recta marca juki	2.800.00	11.200.00
2	3	pieza	Maquina overlok intermedia marca	6.000.00	18.000.00
3	1	pieza	Maquina doble aguja	7.318.00	7.318.00
4	1	pieza	Maquina elastiquera de 12 agujas	9.500.00	9.500.00
5	1	pieza	Máquina de cortar	3.100.00	3.100.00
6	1	pieza	Tapa costura	5.500,00	5.500,00
			<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>BS</b>	<b>54.618.00</b>

### PRODUCCIÓN: Confección de buzos deportivos para los juegos plurinacionales "EVO MORALES"

Nº	DETALLE DE BUZOS Y CHAMARRAS	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
1	TALLA= 12	90.-	90.-
2	TALLA=S	191.-	191.-
3	TALLA = M	115.-	115.-
4	TALLA= L	112.-	112.-
5	TALLA= XL	38.-	38.-
		<b>TOTAL</b>	<b>546.-</b>

Nº	DETALLE SHORES Y POLERAS	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL
1	TALLA =12	104.-	104.-
2	TALLA = 14	36.-	36.-

3	TALLA = S	44.-	44.-
4	TALLA = M	138.-	138.-
5	TALLA = L	86.-	86.-
		<b>TOTAL</b>	<b>408.-</b>

**ENCARGADO DE TALLER METAL MECANICA**  
**Ing. Paulo Ledezma**

**RESUMEN ACTIVIDADES**

- ✓ Colocado de seguros, agarradores y escalera para chata de parques y jardines, Soldadura chata reparación y reconstrucción de acople.
- ✓ Construcción y pintado base para letreros de señalización de calle Dist. D OTB Piñami Sud, arreglo de soporte de arcos U.E. Simón Bolívar.
- ✓ Armado y ensamblado de piezas Resbalin grande para OTB California
- ✓ Modificación y arreglo puertas de corrales con refuerzos en el matadero municipal y arreglo y reconstrucción de rieles de puerta grande de faineo y reubicación de ganchos de colgado de carne.
- ✓ Construcción de estructura para mesa molde de tinglados, Soldadura de puerta de vagoneta roja Toyota
- ✓ Arreglo y soldado de puerta lado sud de complejo, Colocado de pizarra en desarrollo productivo, y de aje y cambio de llanta carrito basurero manual
- ✓ Arreglo y soldado de puerta en Desarrollo Humano OTB Morococala y Construcción y colocado de reja de protección sector norte de graderías del complejo y Colocado de Reja de protección ambientes de taller de costura.
- ✓ Empotrado y pintado de Resbalin OTB California y Arreglo de sube baja y engrasado de juegos OTB California
- ✓ Arreglo de piso y cambio a plancha de carrusel Grande Parque OTB Ferroviario Norte y Medición para provisión de protectores de ventana y puertas doble sala de computación UE Max Fernández, Construcción de Tranca Vehicular de 10 Mts, para Distrito E para control ingreso de basura al botadero.

Concepto	DETALLE	MONTO
COMPRA	Compra de herramientas de mano y herramientas fijas e insumos de trabajo	12.000,00
COMPRA	Compra de equipos y herramientas de trabajo	9.959,76
COMPRA	Compra de equipos herramientas e insumos	5.976,31
COMPRA	Compra de equipo de soldar MIG-MAG	26.970,00

**ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL**  
**Ing. Pedro Hinojosa**

**PLANTAS PRODUCIDAS EN EL VIVERO MUNICIPAL**

ESPECIES	CANTIDAD	TIEMPO EN SEMISOMBRA	CARACTERISTICAS	TIEMPO DE DISPOSICION
PACAY	1500	1 año	Criollo	6 semanas
LIMON	700	1 año	Limón rugoso	6 semanas
ACACIA	1700	1 año	De 1,2 mts de altura	Inmediata
TAJIBO	900	10 años	De 20 cm	8 semanas
FRESNO	500	1 año	1 mts.	Inmediata
CARNAVALITO	7000	1 año	50 cm	Inmediata
MOLLE	550	1 año	1,5mts. Y de 50cm.	Inmediata
TARA	450	1 año	20 cm	Inmediata
JARKA	450	1 año	20 cm	Inmediata
JACARANDA	350	1 año	50 cm	Inmediata
EUCALIPTO CHINO	300	8 meses	1 m de altura	inmediata
EUCALIPTO CEDRON	140	8 meses	1 m de altura	inmediata
PINO RADIATA	100	8 meses	1 m de altura	inmediata
PINO CIPRES	150	8 meses	1 m de altura	inmediata
TIPA	200	8 meses	1 m de altura	inmediata
CEIBO	305	8 meses	1 m de altura	inmediata
ALAMO VELA	50	8 meses	1 m de altura	inmediata
SAUCE	100	8 meses	1 m de altura	inmediata
RETAMA	100	8 meses	1 m de altura	inmediata
LIGUSTRO	8500	6 meses	60 cm	Inmediata
OREJA DE MONO	3500	6 meses	Se enraizó en las bolsas	Por multiplicar
LECHUGUIN	2600	1 mes	Salidos de invernadero	4 semanas
PINGO DE ORO LIMON	870	1 meses	Salido de invernadero	4 semanas



BINGO DE ORO RASTRERO	3200	1 meses	Salido de invernadero	4 semanas
DURANTA	1600		Salidas del invernadero	
ABUJA ROSADA	1700	6 meses	Se enraizó en las bolsas	Por multiplicar
ABUJA NEGRA	3500	6 meses	Salido de invernadero	inmediata
CARAMELO NEGRO	1700	8 semanas	salidas del invernadero	Inmediata
CARAMELO GUINDO	1900	2 semanas	Salido de invernadero	4 semanas
CARAMELO ROSADO	1100	2 semanas	salidas del invernadero	inmediata
OREJA DE MONO	1600	9 semanas	salidas del invernadero	inmediata
PASTO AZUL	500	6 semanas	salidas del invernadero	Por reproducir
GAZANIA	500	8 semanas	Se enraizó en las bolsas	inmediata
BOTON DE ORO	950	Una semana en semi sombra	Color amarillo y naranja	3 semanas
MARIGOL	850	1 semana	Salidas de invernadero	3 semanas
ROSA ENANA MULTICOLOR	260	8 semanas	Con la primera floración	Inmediata
MARGARITA BLANCA	1500	1 semanas	Recién trasplantadas	3 semanas
AZULINES	1150	8 semanas	Con botón floral	Inmediata
11 HORAS	80	4 semanas	Recién trasplantadas	inmediata

#### SALIDA DE PLANTAS SOLICITADAS

OTB	ESPECIES	CANTIDAD DE PLANTAS
AV. DORMINIG	Ornamentales de flor	5600
OTB HOLANDA	Ornamentales de flor	900
CEMENTERIO	Ornamentales de flor y hoja	800
OTB SAUSALITO	Ornamentales de flor	1150
OTB CAPACACHI	Forestales y ornamentales	500
ORILLAS DEL RIO ROCHA	Forestales (campañas de reforestación)	3500
OTB ESQUILAN GRANDE	Forestales, ornamentales de flor y hoja	2500
PLAZA PRINCIPAL	Ornamentales de flor y hoja	360

ROTONDA DEL REDUCTO	Ornamentales de flor y hoja	450
MERCADO CENTRAL DE COLCAPIRHUA	Ornamentales de hoja y flor	300
AV. COLCAPIRHUA	Ornamentales de flor	4500
HOSPITAL CAPACACHI	Ornamentales de flor	190
HOSPITAL CUCHIERI	Ornamentales de flor	900
	<b>TOTAL</b>	<b>21.350,00 Pts.</b>

### **REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS Y OTBS DEL MUNICIPIO SOBRE MANEJO DE VIVEROS**

Con la finalidad de lograr el éxito de las acciones planificadas para contemplar los recursos económicos y logísticos suficientes para el buen funcionamiento y fortalecimiento del vivero Municipal se recomienda ampliar o construir un nuevo vivero porque actualmente la superficie total del vivero es de 950 m<sup>2</sup> que es insuficiente para producir las plantas requeridas por diferentes otbs.

### **ATENCIÓN DE HOJAS DE RUTA ENERO A JUNIO GESTIÓN 2017**

<b>Nº HOJA DE RUTA</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROCEDENCIA</b>	<b>DETALLE</b>
10	03/01/2017	Ministerio de desarrollo productivo y economía plural	solicitud de aprobación concesión de terreno
555	31/01/2017	Ministerio de desarrollo productivo y economía plural	invitación a séptimo comité regional programa propyme/jiwasa
1456	14/03/2017	Ministerio de desarrollo productivo y economía plural	invitación a reunión de intercambio de experiencias de agricultura urbana y periurbana
1604	20/03/2017	Federación sindical única de trabajadores campesinos	convocatoria a taller de socialización de formatos y contenidos del fondo indígena
1940	03/04/2017	Ministerio de desarrollo productivo y economía plural	invitación a participar de jornadas de transparencia tecnológico productivas (Bolivia/Perú)
2155	13/04/2017	FPS	solicitud de información referida a proyectos mi riego - mi agua
2826	11/05/2017	Ministerio de Desarrollo productivo y economía plural	invitación a acto de promulgación de la ley micro y pequeña industria
3313	31/05/2017	Pro Bolivia	invitación día mundial de la leche
3412	05/06/2017	ministerio de desarrollo rural y tierras	invitación a demostración de resultados del cultivo de maíz híbrido
